


INFORME TÉCNICO DE ALERTA TEMPRANA

Riesgo de atraso formal en la ejecución de la obra

Contratación para la ejecución de la obra: Mejoramiento e instalación de los servicios turísticos públicos de la ruta turística descubriendo barranco, en el distrito de barranco, provincia de lima, con CUI 2167295 componente restauración de la iglesia la ermita de barranco

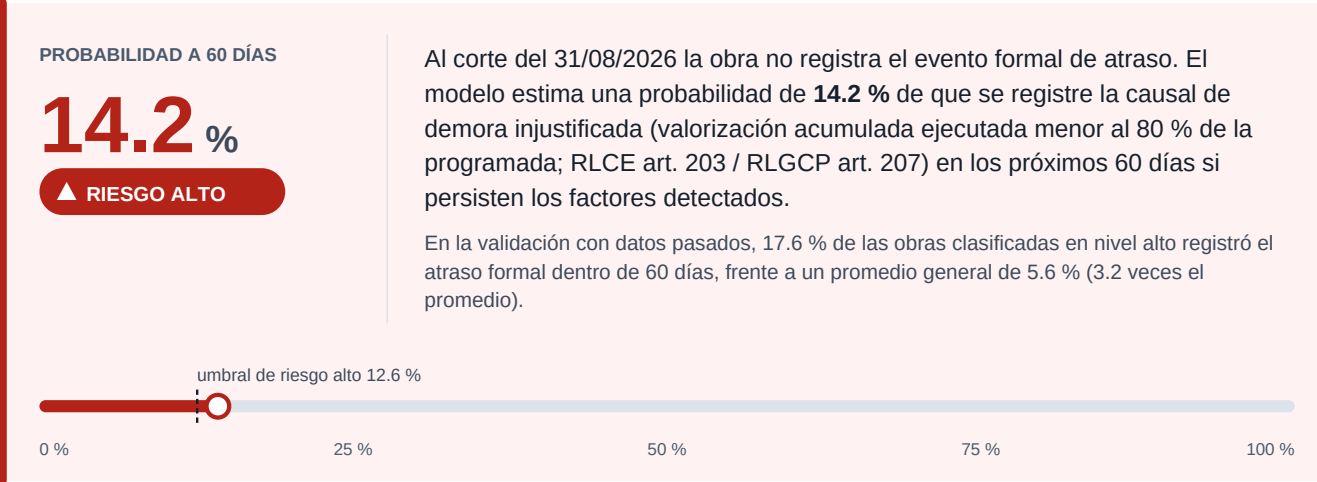


MONTO DEL CONTRATO	PLAZO ORIGINAL	ASIENTOS DEL CUADERNO	ÚLTIMO ASIENTO
No publicado	No publicado	112 desde 05/06/2026	28/08/2026

01 Identificación de la obra y del contrato

Denominación oficial	CONTRATACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO E INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS DE LA RUTA TURÍSTICA DESCUBRIENDO BARRANCO, EN EL DISTRITO DE BARRANCO, PROVINCIA DE LIMA, CON CUI 2167295 COMPONENTE RESTAURACIÓN DE LA IGLESIA LA ERMITA DE BARRANCO
Entidad contratante	PLAN COPESCO NACIONAL - MINCETUR
Contratista	CONSORCIO CIRCUITO BARRANCO
Ubicación (distrito / provincia / departamento)	BARRANCO / LIMA / LIMA
Código Único de Inversión (CUI)	2167295
Inversión asociada	MEJORAMIENTO E INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS DE LA RUTA TURÍSTICA DESCUBRIENDO BARRANCO, EN EL DISTRITO DE BARRANCO PROVINCIA DE LIMA
Función	TURISMO
Identificador del contrato (SEACE)	2397034
Monto del contrato	-
Monto aprobado de la inversión	S/ 8,891,570.00
Cuaderno de obra digital	112 asientos entre 05/06/2026 y 28/08/2026

02 Evolución del riesgo estimado a 60 días

Probabilidad estimada de atraso formal a 60 días

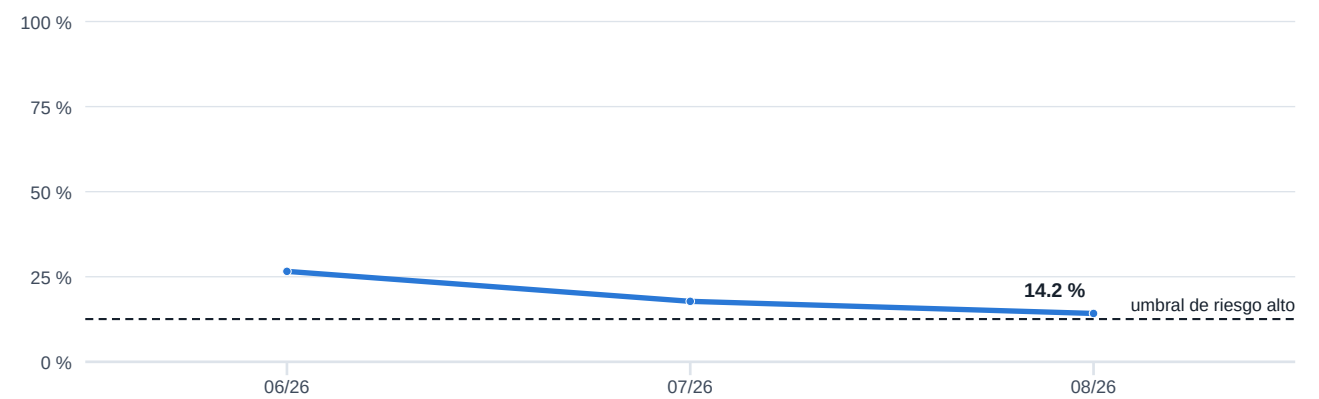

Estimaciones mensuales calculadas solo con la información disponible en cada fecha de corte (3 cortes, del 30/06/2026 al 31/08/2026), con reentrenamiento trimestral del modelo.

03 Factores que explican la estimación

Contribución de cada dato a la probabilidad (valores TreeSHAP en log-odds). Las barras hacia la derecha elevan el riesgo y las barras hacia la izquierda lo reducen, respecto del promedio de las obras.

Dato de la obra	Grupo	Reduce Eleva	Efecto
Índice de alerta por las palabras usadas en los asientos recientes: 0.66 (escala de 0 a 1)	Contenido de los asientos		+0.643
El 18 % de los asientos de los últimos 60 días menciona atraso, retraso o demora	Contenido de los asientos		+0.227
Departamento: Lima	Características de la obra		+0.187
Entidad contratante: otra entidad pública	Características de la obra		+0.135
Ningún asiento de los últimos 60 días menciona penalidades, incumplimientos o cartas notariales	Contenido de los asientos		-0.099
Índice de alerta por el contenido de los asientos recientes: 0.72 (escala de 0 a 1)	Contenido de los asientos		+0.099
El último asiento se registró hace 3 días	Actividad del cuaderno de obra		+0.087
Extensión media de los asientos recientes: 1,437 caracteres	Contenido de los asientos		-0.085

04 Qué cambiaría la estimación (sensibilidad del modelo)

Recálculo de la probabilidad modificando una señal a la vez. Indica cuánto depende la estimación de cada señal; no es una estimación causal del efecto de una intervención real.

Escenario	Actual	Escenario	Cambio
Sin nuevas ampliaciones de plazo en los últimos 90 días	14.2 %	13.9 %	-0.3 pp
Registro activo del cuaderno (asiento reciente)	14.2 %	14.2 %	+0.0 pp
Absolver todas las consultas pendientes	14.2 %	14.8 %	+0.5 pp

05 Evidencia documental

Asientos del cuaderno de obra digital y otros registros oficiales asociados a los factores que elevan el riesgo, del más reciente al más antiguo (hasta 12).

Asiento N.º 111 · Consultas · SOEC_SPV · 27/08/2026

TRÁMITE DE CONSULTA N.º 19 – DESMONTAJE DE MURO DE ADOBE, EJE 4 ENTRE B–C: En atención a los Asientos N.º 105 y N.º 106 del Residente de Obra, mediante los cuales se formula y complementa la Consulta de Obra N.º 19, referida al desmontaje del muro de adobe existente ubicado en el eje 4, entre los ejes B–C, sector Presbiterio, esta Supervisión deja constancia de haber efectuado la revisión y evaluación técnica corresp...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 98 · Otras ocurrencias · SOEC_RESI · 24/08/2026

... inicio de estos trabajos.de otro lado, se comunica a la supervision que la mencionada partida forma parte de la ruta critica del calendario de avance de obra (cao) vigente. en tal sentido, cualquier retraso o postergacion en la liberacion o ejecucion de estos trabajos generara un impacto adverso en el plazo de ejecucion, configurando una causal de ampliacion de plazo por causales no imputables al contr...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 90 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 14/08/2026

...procedimiento previsto en el articulo 190 del reglamento de la ley n. 32069.la presente actuacion tiene como finalidad viabilizar tecnicamente la ejecucion de la partida, sin generar controversias ni retrasos innecesarios, preservando prioritariamente la seguridad de los trabajadores y la estabilidad e integridad del inmueble patrimonial.se deja constancia para conocimiento y acciones correspondientes.

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 82 · Consultas · SOEC_RESI · 12/08/2026

...te a la presentacion previa de un informe de compatibilizacion integral.2) se deja constancia de que, de conformidad con lo establecido en el numeral 190.4 del citado articulo 190 del reglamento, las demoras derivadas del procedimiento de absolucion de consultas facultan al contratista a solicitar la respectiva ampliacion de plazo contractual. 3) no obstante lo senalado en el precedente, y con la finali...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 76 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 10/08/2026

...n contractual sean canalizadas observando los procedimientos y requisitos establecidos en la normativa vigente, con la finalidad de contar con informacion tecnica suficiente para su atencion y evitar demoras derivadas de documentacion incompleta.en consecuencia, se ratifica lo senalado mediante el asiento n. 61 en cuanto a la necesidad de complementar tecnicamente la consulta formulada, solicitandose al...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 62 · Consultas · SOEC_SPV · 02/08/2026

DERIVACIÓN DE CONSULTA DE OBRA A LA ENTIDAD: En atención al Asiento N.º 53, mediante el cual el Residente de Obra solicita considerar la incorporación de la partida de desmontaje de seis (6) torres de madera provisionales de apuntalamiento, esta Supervisión deja constancia de que la consulta cuenta con el Informe Técnico N.º 010-2026-ADAM RO/CC.BARRANCO.De la evaluación realizada se advierte que lo solicitado podría ...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 61 · Consultas · SOEC_SPV · 02/08/2026

REFERENTE A CONSULTA DE ESTRUCTURAS EN ASIENTO N°54: En atención al Asiento N.º 54, de fecha 29 de julio de 2026, denominado “Consultas de estructuras”, esta Supervisión deja constancia de que el contratista ha formulado consultas relacionadas con supuestas omisiones e inconsistencias advertidas en el plano de estructuras E-05 – Planta de Cimentación, referidas al recubrimiento de los elementos estructurales, detalle...

Fuente: cod-asientos202608.csv

06 Marco normativo, validez del modelo y lectura del informe

Evento que se anticipa: primer asiento del cuaderno de obra digital de tipo «Valorización acumulada ejecutada menor al 80 % del monto acumulado programado» o «Calendario acelerado de obra» (Reglamento de la Ley N.º 30225, D.S. N.º 344-2018-EF, art. 203; Reglamento de la Ley N.º 32069, D.S. N.º 009-2025-EF, art. 207).

Indicador (prueba temporal ciega)	Nacional	Arequipa
ROC-AUC	0.774	0.719
PR-AUC	0.158	0.216
Prevalencia del evento	0.050	0.091

Modelo atraso-H60-B_full-2026-08-31, entrenado con información hasta el 30/06/2026. Una PR-AUC mayor que la prevalencia indica que el modelo ordena las obras mejor que el azar.

CÓMO USAR ESTE INFORME

La probabilidad es una estimación para priorizar la supervisión, no una certeza ni una determinación de responsabilidades. Contraste siempre los factores y la evidencia con el expediente de la obra y con la información del supervisor o inspector antes de adoptar decisiones.
