


INFORME TÉCNICO DE ALERTA TEMPRANA

Riesgo de atraso formal en la ejecución de la obra

Contratacion de ejecucion de obra CUI N° 2482109 "mejoramiento y ampliacion del servicio de transitableidad vehicular y peatonal del circuito bicentenario de la independencia en 5 distritos de la provincia de huaura - departamento de lima"

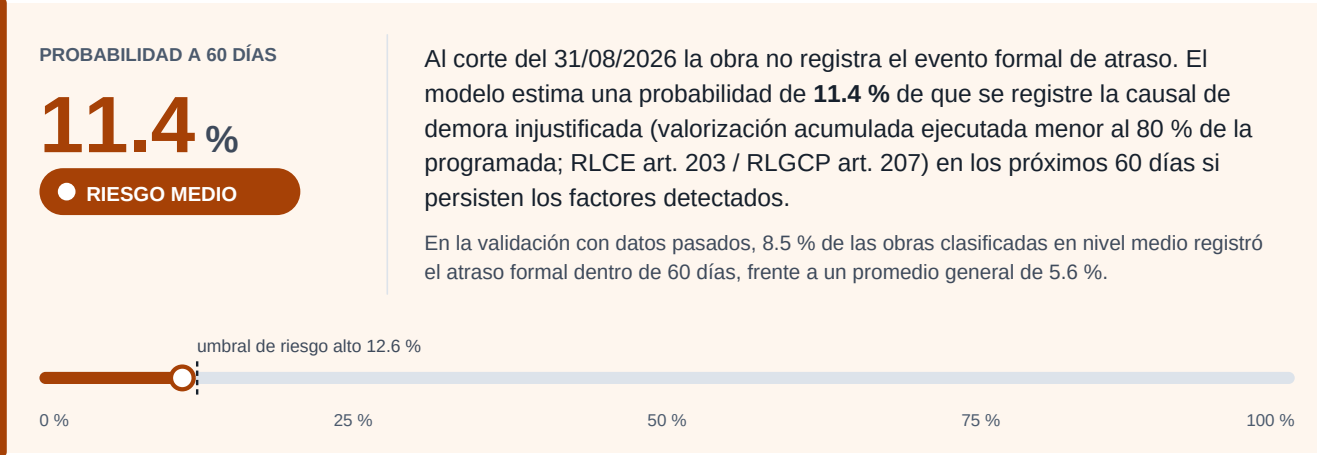


MONTO DEL CONTRATO	PLAZO ORIGINAL	ASIENTOS DEL CUADERNO	ÚLTIMO ASIENTO
S/ 110,582,521.31	420 días	776 desde 08/07/2025	31/08/2026

01 Identificación de la obra y del contrato

Denominación oficial	CONTRATACION DE EJECUCION DE OBRA CUI N° 2482109 "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL CIRCUITO BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA EN 5 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE HUAURA - DEPARTAMENTO DE LIMA"
Entidad contratante	GOBIERNO REGIONAL DE LIMA SEDE CENTRAL
Contratista	CONSORCIO HIDRAULICO LOROS
Ubicación (distrito / provincia / departamento)	HUALMAY / HUAURA / LIMA
Código Único de Inversión (CUI)	2482109
Inversión asociada	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL CIRCUITO BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA EN 5 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE HUAURA - DEPARTAMENTO DE LIMA
Función	TRANSPORTE
Identificador del contrato (SEACE)	2331463
Monto del contrato	S/ 110,582,521.31
Monto aprobado de la inversión	S/ 71,153,270.70
Cuaderno de obra digital	776 asientos entre 08/07/2025 y 31/08/2026

02 Evolución del riesgo estimado a 60 días

Probabilidad estimada de atraso formal a 60 días

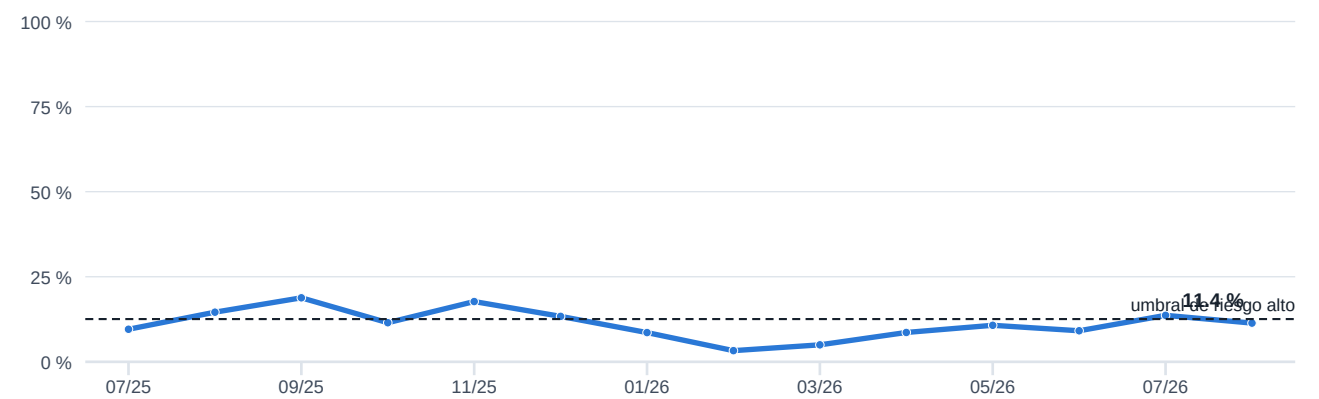

Estimaciones mensuales calculadas solo con la información disponible en cada fecha de corte (14 cortes, del 31/07/2025 al 31/08/2026), con reentrenamiento trimestral del modelo.

03 Factores que explican la estimación

Contribución de cada dato a la probabilidad (valores TreeSHAP en log-odds). Las barras hacia la derecha elevan el riesgo y las barras hacia la izquierda lo reducen, respecto del promedio de las obras.

Dato de la obra	Grupo	Reduce Eleva	Efecto
Índice de alerta por las palabras usadas en los asientos recientes: 0.52 (escala de 0 a 1)	Contenido de los asientos		+0.438
Departamento: Lima	Características de la obra		+0.165
Gasto devengado en los últimos 3 meses: S/ 20,560,873	Ejecución del gasto (SIAF)		-0.140
Hubo registros en el cuaderno 27 días del último mes	Actividad del cuaderno de obra		+0.111
El 1 % de los asientos de los últimos 60 días menciona penalidades, incumplimientos o cartas notariales	Contenido de los asientos		+0.095
Hubo un asiento el mismo día del corte	Actividad del cuaderno de obra		+0.086
El 3 % de los asientos de los últimos 60 días menciona atraso, retraso o demora	Contenido de los asientos		+0.082
99 asientos registrados en los últimos 30 días	Actividad del cuaderno de obra		+0.076

04 Qué cambiaría la estimación (sensibilidad del modelo)

Recálculo de la probabilidad modificando una señal a la vez. Indica cuánto depende la estimación de cada señal; no es una estimación causal del efecto de una intervención real.

Escenario	Actual	Escenario	Cambio
Sin suspensiones del plazo en los últimos 90 días	11.4 %	11.3 %	-0.1 pp
Absolver todas las consultas pendientes	11.4 %	11.4 %	+0.0 pp
Sin nuevas ampliaciones de plazo en los últimos 90 días	11.4 %	11.4 %	+0.0 pp

05 Evidencia documental

Asientos del cuaderno de obra digital y otros registros oficiales asociados a los factores que elevan el riesgo, del más reciente al más antiguo (hasta 12).

- Asiento N.º 703 · Consultas · SOEC_SPV · 12/08/2026**

PRONUNCIAMIENTO RESPECTO A LA CONSULTA N°74 - AUSENCIA DE PLANOS DE DETALLE DE COBERTURA DE FLEXIOLONA: Se deja constancia que, mediante Asiento N.º 700, de fecha 11/08/2026, el Residente de Obra ha formulado la Consulta N.º 74, referida a la ausencia de planos de detalle, especificaciones gráficas y documentación técnica necesaria para la correcta ejecución de la partida correspondiente a la cobertura de flexilona c...

Fuente: cod-asientos202608.csv
- Asiento N.º 689 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 06/08/2026**

observaciones por incumplimiento de las obligaciones del residente de obra respecto a las anotaciones al cuaderno de obra . se deja constancia que, durante las labores de supervision e inspecciones de campo efectuadas en los ...

Fuente: cod-asientos202608.csv
- Asiento N.º 653 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 21/07/2026**

...nes tecnicas, planos aprobados, procedimientos constructivos y demas disposiciones del expediente tecnico, reservandose el derecho de formular las observaciones que correspondan en caso de detectarse incumplimientos durante el proceso de ejecucion.

Fuente: cod-asientos202607.csv
- Asiento N.º 656 · Respuestas a consultas · SOEC_RESI · 21/07/2026**

A LA RESPUESTA DE CONSULTA POR LA SUPERVISION DEL ASIENTO N° 650 LOSA DEPORTIVA HUALMAY BAJO: A LA RESPUESTA DE LA CONSULTA N° 69, ASIENTO N° 646, DEL CONTRATISTA LA SUPERVISION INDICA EN SU CONTESTO PARRAFO DOS DEL ASIENTO N° 650, LO SIGUIENTE: " Como resultado de la evaluación, se advierte que la propuesta planteada modifica la solución de ingeniería prevista en el expediente técnico, al variar la cota de llegada ...

Fuente: cod-asientos202607.csv
- Asiento N.º 650 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 20/07/2026**

RESPUESTA DE LA CONSULTA N°69 ACCESO PEATONAL A LA LOSA DEPORTIVA - TRAMO II HUALMAY: En atención al Asiento N.º 646, mediante el cual el Residente de Obra formula la Consulta N.º 69 respecto a la modificación del acceso peatonal entre la escalera proyectada y la losa deportiva del Tramo II – Hualmay, esta Supervisión ha efectuado la revisión técnica de la propuesta presentada y de los documentos que conforman el exp...

Fuente: cod-asientos202607.csv

06 Marco normativo, validez del modelo y lectura del informe

Evento que se anticipa: primer asiento del cuaderno de obra digital de tipo «Valorización acumulada ejecutada menor al 80 % del monto acumulado programado» o «Calendario acelerado de obra» (Reglamento de la Ley N.º 30225, D.S. N.º 344-2018-EF, art. 203; Reglamento de la Ley N.º 32069, D.S. N.º 009-2025-EF, art. 207).

Indicador (prueba temporal ciega)	Nacional	Arequipa
ROC-AUC	0.774	0.719
PR-AUC	0.158	0.216
Prevalencia del evento	0.050	0.091

Modelo atraso-H60-B_full-2026-08-31, entrenado con información hasta el 30/06/2026. Una PR-AUC mayor que la prevalencia indica que el modelo ordena las obras mejor que el azar.

CÓMO USAR ESTE INFORME

La probabilidad es una estimación para priorizar la supervisión, no una certeza ni una determinación de responsabilidades. Contraste siempre los factores y la evidencia con el expediente de la obra y con la información del supervisor o inspector antes de adoptar decisiones.
