


INFORME TÉCNICO DE ALERTA TEMPRANA

Riesgo de atraso formal en la ejecución de la obra

001-2026-GM-MDLYLP

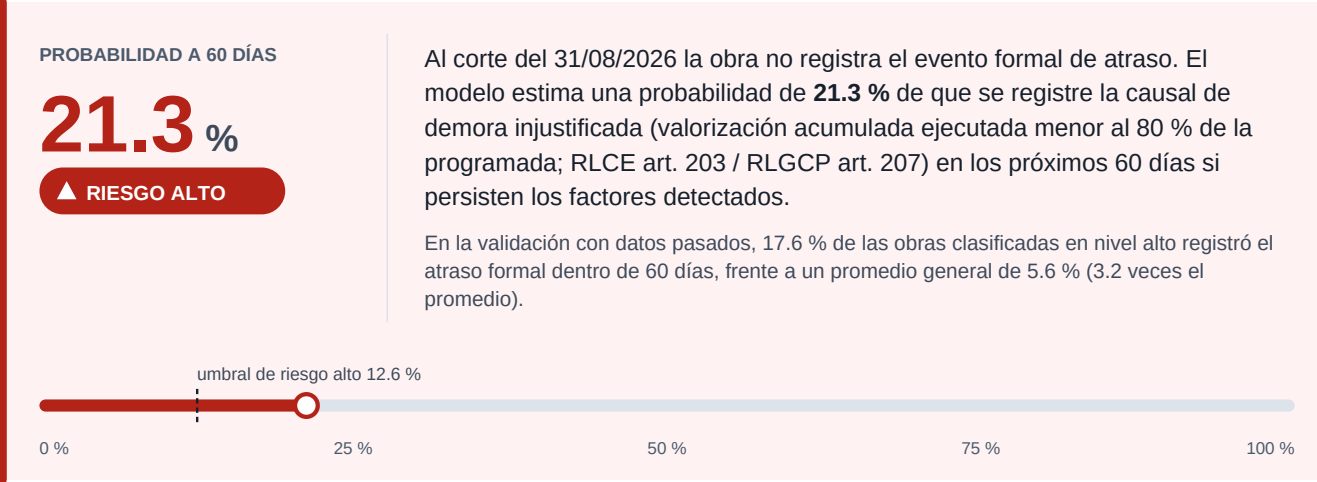


MONTO DEL CONTRATO	PLAZO ORIGINAL	ASIENTOS DEL CUADERNO	ÚLTIMO ASIENTO
No publicado	No publicado	137 desde 13/02/2026	31/08/2026

01 Identificación de la obra y del contrato

Denominación oficial	001-2026-GM-MDLYLP
Entidad contratante	MUNICIPALIDAD DISTRITAL LA YARADA LOS PALOS
Contratista	CONSORCIO TACNA
Ubicación (distrito / provincia / departamento)	LA YARADA LOS PALOS / TACNA / TACNA
Código Único de Inversión (CUI)	no enlazado
Inversión asociada	-
Función	-
Identificador del contrato (SEACE)	2374511
Monto del contrato	-
Monto aprobado de la inversión	-
Cuaderno de obra digital	137 asientos entre 13/02/2026 y 31/08/2026

02 Evolución del riesgo estimado a 60 días

Probabilidad estimada de atraso formal a 60 días

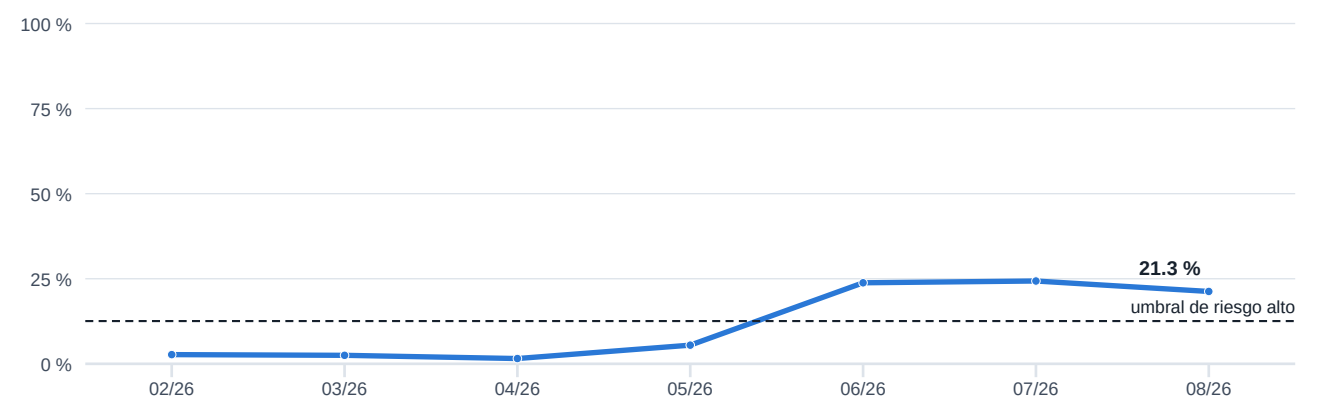

Estimaciones mensuales calculadas solo con la información disponible en cada fecha de corte (7 cortes, del 28/02/2026 al 31/08/2026), con reentrenamiento trimestral del modelo.

03 Factores que explican la estimación

Contribución de cada dato a la probabilidad (valores TreeSHAP en log-odds). Las barras hacia la derecha elevan el riesgo y las barras hacia la izquierda lo reducen, respecto del promedio de las obras.

Dato de la obra	Grupo	Reduce Eleva	Efecto
Índice de alerta por las palabras usadas en los asientos recientes: 0.51 (escala de 0 a 1)	Contenido de los asientos		+0.580
Departamento: Tacna	Características de la obra		+0.260
14 asientos de calendario de avance valorizado desde el inicio del cuaderno	Actividad del cuaderno de obra		+0.243
El 7 % de los asientos de los últimos 60 días menciona penalidades, incumplimientos o cartas notariales	Contenido de los asientos		+0.201
14 asientos de calendario de avance valorizado en los últimos 90 días	Actividad del cuaderno de obra		+0.170
El 4 % de los asientos de los últimos 60 días menciona falta o cambio de personal	Contenido de los asientos		+0.113
Hubo un asiento el mismo día del corte	Actividad del cuaderno de obra		+0.104
Hubo registros en el cuaderno 15 días del último mes	Actividad del cuaderno de obra		+0.088

04 Qué cambiaría la estimación (sensibilidad del modelo)

Recálculo de la probabilidad modificando una señal a la vez. Indica cuánto depende la estimación de cada señal; no es una estimación causal del efecto de una intervención real.

Escenario	Actual	Escenario	Cambio
Sin nuevas ampliaciones de plazo en los últimos 90 días	21.3 %	21.0 %	-0.3 pp
Absolver todas las consultas pendientes	21.3 %	21.3 %	+0.0 pp

05 Evidencia documental

Asientos del cuaderno de obra digital y otros registros oficiales asociados a los factores que elevan el riesgo, del más reciente al más antiguo (hasta 12).

Asiento N.º 97 · Calendario de avance de obra valorizado · SOEC_INSP · 20/07/2026

...trol de calidad y medio ambiente y otros solo seran validos para la presentacion de la valorizacion de obra correespondiente si cuentan con la firma del inspector de obra y personal calve de obra, su incumplimeinto no seran reconocidos como documento autorizado y carecera de validez respectiva recnocado para tramite de pago respectivo.

Fuente: cod-asientos202607.csv

Asiento N.º 96 · Calendario de avance de obra valorizado · SOEC_INSP · 20/07/2026

...umplido con justificar su inasistencia los dias 06, 07, 08, 14, 15 y 16 de julio del 2026 y el especialista de calidad no ha justificado el dia 16/07/2026, por lo cual se procedera a la aplicacion de penalidades correspondientes.asimismo, se informa que el especialista de seguridad no ha cumplido con asistir a obra los dias 17, 18 y 20 de julio del 2026, por lo cual a la fecha no ha justificado la inasiste...

Fuente: cod-asientos202607.csv

Asiento N.º 96 · Calendario de avance de obra valorizado · SOEC_INSP · 20/07/2026

ASIENTO DEL INSPECTOR DE OBRA: SE PROCEDE A INFORMAR QUE A LA FECHA EL ESPECIALISTA DE SEGURIDAD NO HA CUMPLIDO CON JUSTIFICAR SU INASISTENCIA LOS DIAS 06, 07, 08, 14, 15 Y 16 DE JULIO DEL 2026 Y EL ESPECIALISTA DE CALIDAD NO HA JUSTIFICADO EL DIA 16/07/2026, POR LO CUAL SE PROCEDERA A LA APLICACIÓN DE PENALIDADES CORRESPONDIENTES.ASIMISMO, SE INFORMA QUE EL ESPECIALISTA DE SEGURIDAD NO HA CUMPLIDO CON ASISTIR A OBR...

Fuente: cod-asientos202607.csv

Asiento N.º 97 · Calendario de avance de obra valorizado · SOEC_INSP · 20/07/2026

ASIENTO DEL INSPECTOR DE OBRA: ASIMISMO LA INSPECCION DE OBRA REITERA QUE QUEDA TERMINANTEMENTE PROHIBIDO EJECUTAR PARTIDAS DE ADICIONALES Y/O MAYORES METRADOS SIN LA DEBIDA AUTORIZACION DEL INSPECTOR DE OBRA, POR LO CUAL SERA BAJO RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA SU EJECUCION Y CORRERAN EL RIESGO DE NO SER RECONOCIDAS Y VALORIZADAS RESPECTIVAMENTE, POR CONSIGUIENTE, LAS PARTIDAS EJECUTADAS A LA FECHA DEBERAN SER VERI...

Fuente: cod-asientos202607.csv

Asiento N.º 94 · Calendario de avance de obra valorizado · SOEC_INSP · 20/07/2026

ASIENTO DEL INSPECTOR: LA PRRESENTE INSPECCION DE OBRA A LA FECHA SOLICITA EL ESTADO SITUACIONAL DE LA OBRA AL DIA DE HOY, ASIMISMO S ESOLICITA AL RESIDENTE DE OBRA EMITIR OPINION SOBRE EL CAMBIO DE PERSONAL CLAVE *INGENIERO DE SEGURIDAD., SE INDICA ADEMAS QUE LA VALORIZACION N-03 AH SIDO OBSERVADA PROCEDIENDO CON SU DEVOLUCION RESPECTIVA CON FECHA 17/07/2026.. SE SOLICITA IFNORMAR A LA BREVEDAD BAJO RESPONSABILIDAD ...

Fuente: cod-asientos202607.csv

Asiento N.º 92 · Respuestas a consultas · SOEC_INSP · 16/07/2026

...nte certificado de incapacidad temporal para el trabajo (citt) y/o documentacion administrativa que justifique su ausencia, por lo cual, se superpone el supuesto inscrito en la clausula decimoquinta: penalidad, la cual precisa lo siguiente en caso el contratista incumpla con su obligacion de ejecutar la prestacion con el personal acreditado del plantel tecnico o debidamente sustituido. se constituye una sa...

Fuente: cod-asientos202607.csv

Asiento N.º 92 · Respuestas a consultas · SOEC_INSP · 16/07/2026

ASIENTO DEL INSPECTOR DE OBRA: ASIENTO DEL INSPECTOR DE OBRA:SE PONE DE CONOCIMIENTO AL RESIDENTE DE OBRA LAS OBSERVACIONES REALIZADAS A LA FECHA 16/07/2026:- SE INFORMA QUE MEDIANTE INFORME N°014-2026-AAQ-IO-CPLCHAV26OACH3O-OSI-GM-MDLYLP/TACNA SE HA PROCEDIDO CON REALIZAR LA EVALUACION DEL EXPEDIENTE DE MAYORES METRADOS N°01 – 2026, REMITIDA A TRAVES DE LA CARTA – CS-035-2026, ENCONTRÁNDOLO CONFORME SEGÚN EL SUSTENT...

Fuente: cod-asientos202607.csv

- Asiento N.º 91 · Respuestas a consultas · SOEC_INSP · 16/07/2026**

ASIENTO DEL INSPECTOR DE OBRA: ASIENTO DEL INSPECTOR DE OBRA:SE PONE DE CONOCIMIENTO AL RESIDENTE DE OBRA LAS OBSERVACIONES REALIZADAS A LA FECHA 16/07/2026:- SE SOLICITA AL ESPECIALISTA DE CALIDAD, ING. PAUL OMAR CARDENAS NUÑEZ, EVALUAR LA SEÑALIZACIÓN ACTUAL DISTRIBUIDA EN CAMPO, LA MISMA QUE A LA FECHA SE ENCUENTRA EN CALIDAD DE DETERIORO, POR LO CUAL SE SOLICITA:o RENOVACIÓN DE MALLAS DE SEGURIDAD.o RENOVACIÓN DE...

Fuente: cod-asientos202607.csv
- Asiento N.º 88 · Calendario de avance de obra valorizado · SOEC_INSP · 09/07/2026**

ASIENTO DEL INSPECTOR DE OBRA: ASIENTO DEL INSPECTOR DE OBRAA continuación, se procede a detallar las observaciones realizadas por la inspección de obra correspondientes a las visitas técnicas realizadas durante el día 06, 07 y 08 de julio del 2026.- Según la Visita Técnica realizada los días 06, 07 y 08 de Julio 2026, se ha observado la inasistencia injustificada de parte del Personal Clave Especialista en Seguridad...

Fuente: cod-asientos202607.csv

06 Marco normativo, validez del modelo y lectura del informe

Evento que se anticipa: primer asiento del cuaderno de obra digital de tipo «Valorización acumulada ejecutada menor al 80 % del monto acumulado programado» o «Calendario acelerado de obra» (Reglamento de la Ley N.º 30225, D.S. N.º 344-2018-EF, art. 203; Reglamento de la Ley N.º 32069, D.S. N.º 009-2025-EF, art. 207).

Indicador (prueba temporal ciega)	Nacional	Arequipa
ROC-AUC	0.774	0.719
PR-AUC	0.158	0.216
Prevalencia del evento	0.050	0.091

Modelo atraso-H60-B_full-2026-08-31, entrenado con información hasta el 30/06/2026. Una PR-AUC mayor que la prevalencia indica que el modelo ordena las obras mejor que el azar.

CÓMO USAR ESTE INFORME

La probabilidad es una estimación para priorizar la supervisión, no una certeza ni una determinación de responsabilidades. Contraste siempre los factores y la evidencia con el expediente de la obra y con la información del supervisor o inspector antes de adoptar decisiones.
