


INFORME TÉCNICO DE ALERTA TEMPRANA

Riesgo de atraso formal en la ejecución de la obra

Ejecución de la obra: Mejoraramiento y ampliacion del sistema de disposicion sanitaria de excretas y alcantarillado en la comunidad de pararani y sus sectores pumasuca, consajata y jatahuasi del distrito de challhuahuacho.

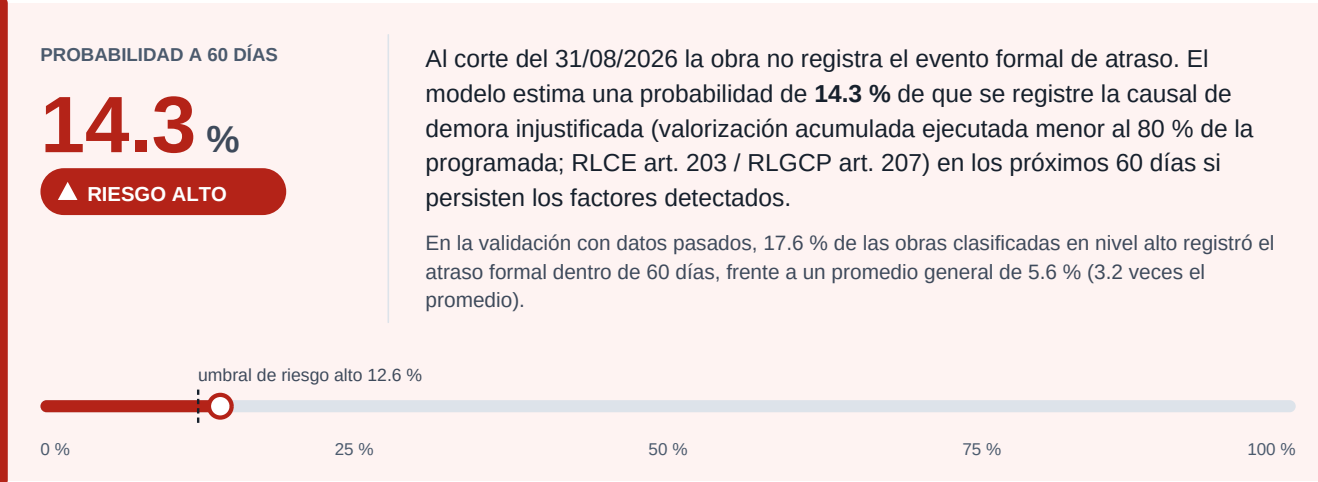


MONTO DEL CONTRATO	PLAZO ORIGINAL	ASIENTOS DEL CUADERNO	ÚLTIMO ASIENTO
S/ 7,048,128.65	180 días	168 desde 24/11/2025	28/08/2026

01 Identificación de la obra y del contrato

Denominación oficial	EJECUCIÓN DE LA OBRA: MEJORARAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS Y ALCANTARILLADO EN LA COMUNIDAD DE PARARANI Y SUS SECTORES PUMASUCA, CONSAJATA Y JATAHUASI DEL DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO.
Entidad contratante	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHO
Contratista	CONSORCIO DEL SUR
Ubicación (distrito / provincia / departamento)	CHALLHUAHUACHO / COTABAMBAS / APURIMAC
Código Único de Inversión (CUI)	2497369
Inversión asociada	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS Y ALCANTARILLADO EN LA COMUNIDAD DE PARARANI Y SUS SECTORES PUMASUCA, CONSAJATA Y JATAHUASI DEL DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO - PROVINCIA DE COTABAMBAS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC
Función	SANEAMIENTO
Identificador del contrato (SEACE)	2356804
Monto del contrato	S/ 7,048,128.65
Monto aprobado de la inversión	S/ 8,958,801.80
Cuaderno de obra digital	168 asientos entre 24/11/2025 y 28/08/2026

02 Evolución del riesgo estimado a 60 días

Probabilidad estimada de atraso formal a 60 días

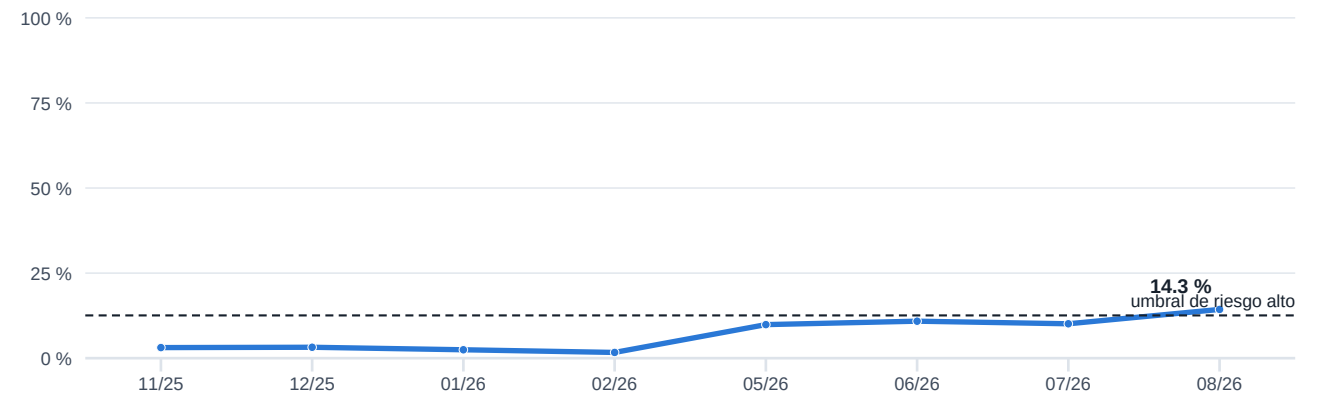

Estimaciones mensuales calculadas solo con la información disponible en cada fecha de corte (8 cortes, del 30/11/2025 al 31/08/2026), con reentrenamiento trimestral del modelo.

03 Factores que explican la estimación

Contribución de cada dato a la probabilidad (valores TreeSHAP en log-odds). Las barras hacia la derecha elevan el riesgo y las barras hacia la izquierda lo reducen, respecto del promedio de las obras.

Dato de la obra	Grupo	Reduce Eleva	Efecto
Índice de alerta por las palabras usadas en los asientos recientes: 0.54 (escala de 0 a 1)	Contenido de los asientos		+0.515
El 9 % de los asientos de los últimos 60 días menciona atraso, retraso o demora	Contenido de los asientos		+0.176
El 3 % de los asientos de los últimos 60 días menciona penalidades, incumplimientos o cartas notariales	Contenido de los asientos		+0.132
Índice de alerta por el contenido de los asientos recientes: 0.68 (escala de 0 a 1)	Contenido de los asientos		+0.115
El último asiento se registró hace 3 días	Actividad del cuaderno de obra		+0.115
1 asiento de órdenes en los últimos 90 días	Actividad del cuaderno de obra		+0.110
Departamento: Apurímac	Características de la obra		-0.080
Extensión media de los asientos recientes: 1,404 caracteres	Contenido de los asientos		-0.076

04 Qué cambiaría la estimación (sensibilidad del modelo)

Recálculo de la probabilidad modificando una señal a la vez. Indica cuánto depende la estimación de cada señal; no es una estimación causal del efecto de una intervención real.

Escenario	Actual	Escenario	Cambio
Absolver todas las consultas pendientes	14.3 %	14.3 %	+0.0 pp
Sin nuevas ampliaciones de plazo en los últimos 90 días	14.3 %	14.3 %	+0.0 pp
Registro activo del cuaderno (asiento reciente)	14.3 %	14.3 %	+0.0 pp
Sin suspensiones del plazo en los últimos 90 días	14.3 %	14.7 %	+0.4 pp

05 Evidencia documental

Asientos del cuaderno de obra digital y otros registros oficiales asociados a los factores que elevan el riesgo, del más reciente al más antiguo (hasta 12).

Asiento N.º 163 · Ampliaciones de plazo · SOEC_RESI · 24/08/2026

...ar el respectivo registro tecnico del evento. el presente reporte se invoca formalmente como el hito de inicio para sustentar una futura ampliacion de plazo contractual y/o la debida justificacion de retrasos no imputables al contratista, de acuerdo con la normativa vigente

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 128 · Suspensión del plazo de ejecución · SOEC_RESI · 21/07/2026

... entrega de propuestas para una mesa de dialogo fijada para el jueves 30 de julio de 2026.al encontrarse la partida de la pta y sus actividades predecesoras en la ruta critica, este evento genera un atraso no imputable al contratista que rompe la secuencia constructiva del calendario. por lo tanto, bajo el marco normativo contractual aplicable, se solicita formalmente a la supervision la suspension de...

Fuente: cod-asientos202607.csv

Asiento N.º 125 · Respuestas a consultas · SOEC_SPV · 20/07/2026

...as observaciones tecnicas emitidas, a fin de contar con la informacion suficiente que permita la evaluacion y el pronunciamiento tecnico correspondiente.en consecuencia, la supervision precisa que la demora en la emision de una respuesta definitiva obedece al hecho de que el expediente tecnico sustentatorio presentado por el contratista aun no cumple con las observaciones del informe tecnico, razon por ...

Fuente: cod-asientos202607.csv

Asiento N.º 123 · Consultas · SOEC_RESI · 17/07/2026

...ontractuales, configurando un vicio oculto y riesgo geotecnico no previsto imputable exclusivamente a la deficiencia del proyecto basico.por lo expuesto, se deja constancia expresa en este c.o que el retraso y la paralizacion de las partidas afectadas son producto directo de la desnaturalizacion del procedimiento de absolucion de consultas por parte de la entidad. al pretender exigir calculos de ingenie...

Fuente: cod-asientos202607.csv

Asiento N.º 120 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 16/07/2026

OBSERVACIONES FORMULADAS POR LA ENTIDAD A LAS CONSULTAS TÉCNICAS PRESENTADAS POR EL CONTRATISTA: La Supervisión de Obra deja constancia que ha tomado conocimiento de la Carta N.º 285-2026-GM-MDCH/A, mediante la cual la Entidad remite la absolución de las consultas técnicas formuladas por el Contratista, sustentada en el Informe N 12/2026/MDCH/OED/ECR, Informe 14-2026-OED-MDCH/CLT, emitido por el Formulador/Evaluador ...

Fuente: cod-asientos202607.csv

Asiento N.º 121 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 16/07/2026

CONTINUA ASIENTO N° 120:En ese sentido, esta Supervisión requiere al Contratista proceder con el levantamiento integral de las observaciones formuladas por la Entidad, debiendo reformular y complementar el informe técnico con toda la información, estudios, análisis, ensayos y sustento especializado exigidos, conforme a lo señalado en la Carta N.º 285-2026-GM-MDCH/A y el Informe N.º 12/2026/MDCH/OED/ECR, par...

Fuente: cod-asientos202607.csv

Asiento N.º 112 · Órdenes · SOEC_SPV · 10/07/2026

...afectando el normal desarrollo de la obra y el cumplimiento de la programacion vigente.la falta de recursos materiales y la escasa habilitacion de frentes de trabajo evidencian un riesgo inminente de incumplimiento de las metas fisicas programadas para el presente periodo de valorizacion, pudiendo generar un atraso en la ruta critica y comprometer el cumplimiento del plazo contractual.en ese sentido, est...

Fuente: cod-asientos202607.csv

Asiento N.º 112 · Órdenes · SOEC_SPV · 10/07/2026

RIESGO DE ATRASO EN EL CRONOGRAMA DE OBRA: En la fecha, esta Supervisión realizó la verificación de la ejecución de la obra, constatando que el Contratista mantiene una cantidad insuficiente de frentes de trabajo activos y que no cuenta con el abastecimiento oportuno de materiales para la ejecución de diversas partidas programadas, situación que viene afectando el normal desarrollo de la obra y el cumplimiento de la...

Fuente: cod-asientos202607.csv

06

Marco normativo, validez del modelo y lectura del informe

Evento que se anticipa: primer asiento del cuaderno de obra digital de tipo «Valorización acumulada ejecutada menor al 80 % del monto acumulado programado» o «Calendario acelerado de obra» (Reglamento de la Ley N.º 30225, D.S. N.º 344-2018-EF, art. 203; Reglamento de la Ley N.º 32069, D.S. N.º 009-2025-EF, art. 207).

Indicador (prueba temporal ciega)	Nacional	Arequipa
ROC-AUC	0.774	0.719
PR-AUC	0.158	0.216
Prevalencia del evento	0.050	0.091

Modelo atraso-H60-B_full-2026-08-31, entrenado con información hasta el 30/06/2026. Una PR-AUC mayor que la prevalencia indica que el modelo ordena las obras mejor que el azar.

CÓMO USAR ESTE INFORME

La probabilidad es una estimación para priorizar la supervisión, no una certeza ni una determinación de responsabilidades. Contraste siempre los factores y la evidencia con el expediente de la obra y con la información del supervisor o inspector antes de adoptar decisiones.
