


INFORME TÉCNICO DE ALERTA TEMPRANA

Riesgo de atraso formal en la ejecución de la obra

Contratacion para la ejecucion de la obra: ¿renovación del suministro de energía eléctrica, en las zonas urbanas de la avenida grau y prolongación de la AV. Grau, tramo comprendido desde la AV. Sullana hasta la AV. Raul matta del distrito de piura y distrito de veintiseis de octubre, provincia de pi

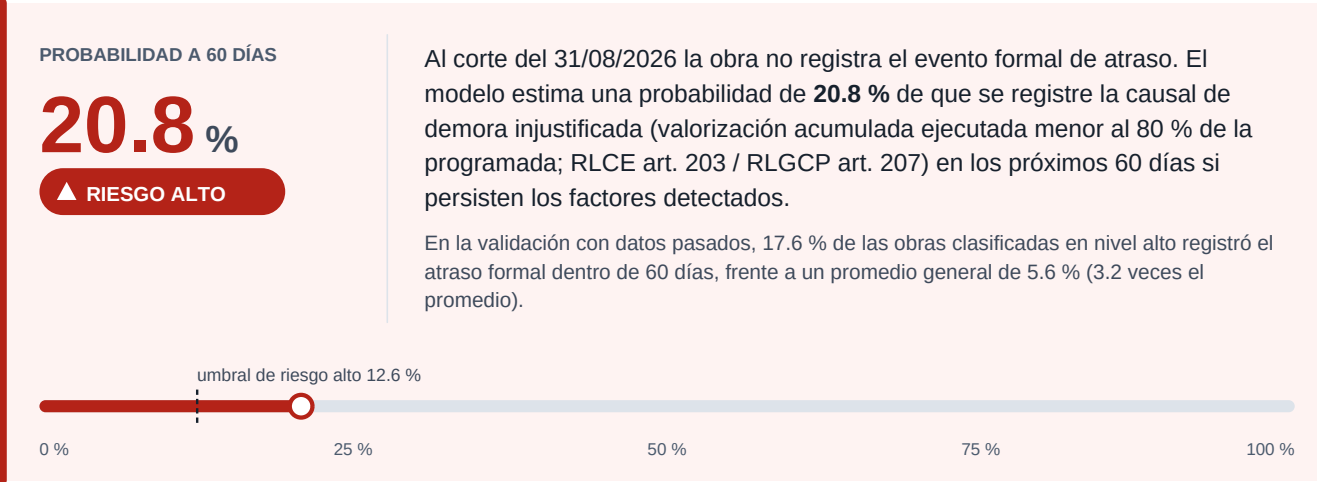

MONTO DEL CONTRATO	PLAZO ORIGINAL	ASIENTOS DEL CUADERNO	ÚLTIMO ASIENTO
No publicado	No publicado	75 desde 08/04/2026	27/08/2026

01 Identificación de la obra y del contrato


Denominación oficial	CONTRATACION PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: ¿RENOVACIÓN DEL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, EN LAS ZONAS URBANAS DE LA AVENIDA GRAU Y PROLONGACIÓN DE LA AV. GRAU, TRAMO COMPRENDIDO DESDE LA AV. SULLANA HASTA LA AV. RAUL MATTA DEL DISTRITO DE PIURA Y DISTRITO DE VEINTISEIS DE OCTUBRE, PROVINCIA DE PI
Entidad contratante	GOBIERNO REGIONAL DE PIURA SEDE CENTRAL
Contratista	'ASESORIA Y DISEÑO ELECTROMECHANICO DEL NORTE', EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
Ubicación (distrito / provincia / departamento)	PIURA / PIURA / PIURA
Código Único de Inversión (CUI)	2627627
Inversión asociada	RENOVACION DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL(LA) ZONA URBANA DE LA AVENIDA GRAU Y PROLONGACION AV. GRAU TRAMO COMPRENDIDO DESDE LA AV. SULLANA HASTA LA AV RAUL MATTA DEL DISTRITO DE PIURA Y DISTRITO DE VEINTISEIS DE OCTUBRE, PROVINCIA PIURA, DEPARTAMENTO PIURA
Función	ENERGÍA
Identificador del contrato (SEACE)	2373511
Monto del contrato	-
Monto aprobado de la inversión	S/ 5,273,519.47

Cuaderno de obra digital

75 asientos entre 08/04/2026 y 27/08/2026

02 Evolución del riesgo estimado a 60 días

Probabilidad estimada de atraso formal a 60 días

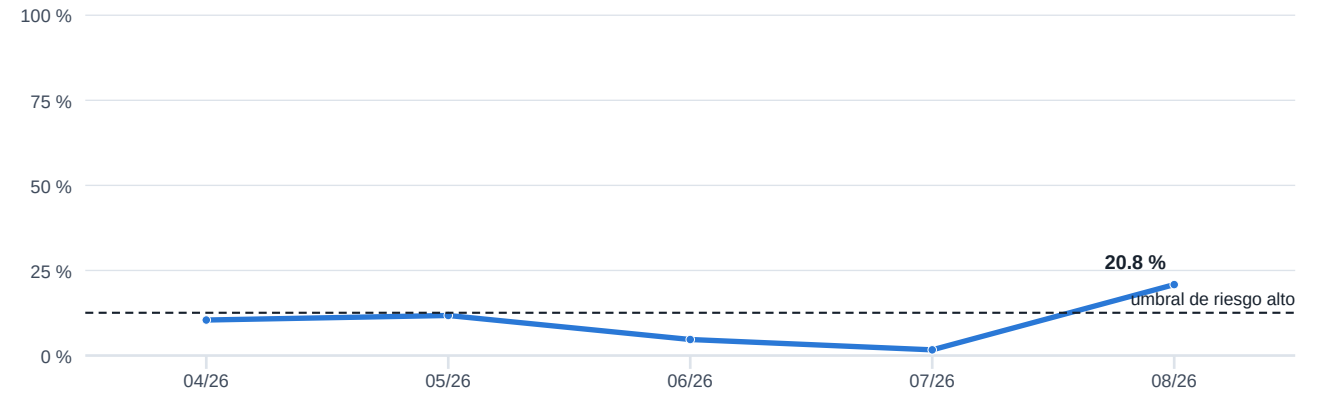

Estimaciones mensuales calculadas solo con la información disponible en cada fecha de corte (5 cortes, del 30/04/2026 al 31/08/2026), con reentrenamiento trimestral del modelo.

03 Factores que explican la estimación

Contribución de cada dato a la probabilidad (valores TreeSHAP en log-odds). Las barras hacia la derecha elevan el riesgo y las barras hacia la izquierda lo reducen, respecto del promedio de las obras.

Dato de la obra	Grupo	Reduce Eleva	Efecto
Índice de alerta por las palabras usadas en los asientos recientes: 0.60 (escala de 0 a 1)	Contenido de los asientos		+0.664
El 10 % de los asientos de los últimos 60 días menciona penalidades, incumplimientos o cartas notariales	Contenido de los asientos		+0.221
El 10 % de los asientos de los últimos 60 días menciona atraso, retraso o demora	Contenido de los asientos		+0.204
El 5 % de los asientos de los últimos 60 días menciona falta o cambio de personal	Contenido de los asientos		+0.189
El 56 % de los asientos de los últimos 90 días fue registrado por la supervisión o inspección	Actividad del cuaderno de obra		+0.181
El último asiento se registró hace 4 días	Actividad del cuaderno de obra		+0.124
Índice de alerta por el contenido de los asientos recientes: 0.58 (escala de 0 a 1)	Contenido de los asientos		+0.097
Monto aprobado de la inversión: S/ 5,273,519	Características de la obra		+0.057

04 Qué cambiaría la estimación (sensibilidad del modelo)

Recálculo de la probabilidad modificando una señal a la vez. Indica cuánto depende la estimación de cada señal; no es una estimación causal del efecto de una intervención real.

Escenario	Actual	Escenario	Cambio
Absolver todas las consultas pendientes	20.8 %	20.8 %	-0.0 pp
Registro activo del cuaderno (asiento reciente)	20.8 %	20.8 %	+0.0 pp
Sin suspensiones del plazo en los últimos 90 días	20.8 %	21.5 %	+0.6 pp

05 Evidencia documental

Asientos del cuaderno de obra digital y otros registros oficiales asociados a los factores que elevan el riesgo, del más reciente al más antiguo (hasta 12).

Asiento N.º 73 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 25/08/2026

...cado en sus asiento 70 y 71 del cuaderno de incidencia, le manifiesto que: lo indicado en asiento 69, no es un juicio de valor anticipado, por el contrario, se pretende advertir que su representada no incumpla en tal o cual responsabilidad manifiesta, y evitar responsabilidades negativas que podemos minimizar y/o eliminar .se agradece por comunicar las gestiones documentarias que ha remitido a enosa , just...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 73 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 25/08/2026

...izar y/o eliminar .se agradece por comunicar las gestiones documentarias que ha remitido a enosa , justamente con ello, esta supervision de obra del gore piura, tomara conocimiento, y en caso que los retrasos sean por parte de enosa, nos comuniquemos de inmediato para que la entidad antes mencionada, refuerce el petitorio que su representada haya solicitado y no lo esten atendiendo en su debido plazo. final...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 72 · Otras ocurrencias · SOEC_RESI · 22/08/2026

TDT DE LUMINARIAS LED 90W: Se hace de conocimiento que, mediante Carta N°424-2026/ADEN, de fecha 14.08.26, la contratista solicitó la validación de las TDT correspondientes a luminarias LED de 90 W, en atención al requerimiento efectuado por la Entidad, considerando que la obra será recepcionada por ENOSA. Al respecto, ENOSA, mediante Carta ENOSA-RP-2021-2026, de fecha 18.08.26, dio respuesta a lo solicitado, adjuntan...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 70 · Otras ocurrencias · SOEC_RESI · 22/08/2026

RESPUESTA ASIENTO N°69 DE SUPERVISIÓN: Respecto de la anotación N°69 de la Supervisión, donde indica corresponde al contratista realizar el seguimiento oportuno de los trámites documentarios sujetos a respuestas por parte de ENOSA, y que una eventual "desatención o parsimonia" recaería en nuestra representada, debemos precisar lo siguiente: La contratista viene realizando de manera oportuna las gestiones que se encue...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 71 · Otras ocurrencias · SOEC_RESI · 22/08/2026

RESPUESTA ASIENTO N°69 DE SUPERVISIÓN:VIENE Por lo tanto, no resulta procedente imputar de manera anticipada a la contratista cualquier afectación de la ejecución de la obra que se origine exclusivamente por la demora de ENOSA, cuando se evidencia que el contratista cumplió oportunamente con efectuar las gestiones que le correspondían. Además, la contratista continuará efectuando el seguimiento, reitera...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 71 · Otras ocurrencias · SOEC_RESI · 22/08/2026

...upervisionviene por lo tanto, no resulta procedente imputar de manera anticipada a la contratista cualquier afectación de la ejecución de la obra que se origine exclusivamente por la demora de enosa, cuando se evidencia que el contratista cumplió oportunamente con efectuar las gestiones que le correspondían. Además, la contratista continuará efectuando el seguimiento, reiterando las soli...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 61 · Otras ocurrencias · SOEC_RESI · 11/08/2026

comunicacion cambio de residente - enosa . mediante carta n410-2026/aden, de fecha 11.08.2026, la contratista comunica a enosa que el gobierno regional de piura ha autorizado el cambio del residente de obra del contrato n004-2026-gr...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 59 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 07/08/2026

... "considerando que es la segunda vez que sustituye al residente de obra, se tendrá en cuenta lo establecido en la cláusula décima quinta del contrato..." (sic), es decir, se aplicaría el supuesto de penalidad indicado en el ítem 1 de la tabla de otras penalidades del contrato de ejecución n 004-2026-grp entre la empresa aden eirl y la entidad gore piura. finalmente, se solicita al ing. carlos vilca (en ade...

Fuente: cod-asientos202608.csv

06 Marco normativo, validez del modelo y lectura del informe

Evento que se anticipa: primer asiento del cuaderno de obra digital de tipo «Valorización acumulada ejecutada menor al 80 % del monto acumulado programado» o «Calendario acelerado de obra» (Reglamento de la Ley N.º 30225, D.S. N.º 344-2018-EF, art. 203; Reglamento de la Ley N.º 32069, D.S. N.º 009-2025-EF, art. 207).

Indicador (prueba temporal ciega)	Nacional	Arequipa
ROC-AUC	0.774	0.719
PR-AUC	0.158	0.216
Prevalencia del evento	0.050	0.091

Modelo atraso-H60-B_full-2026-08-31, entrenado con información hasta el 30/06/2026. Una PR-AUC mayor que la prevalencia indica que el modelo ordena las obras mejor que el azar.

CÓMO USAR ESTE INFORME

La probabilidad es una estimación para priorizar la supervisión, no una certeza ni una determinación de responsabilidades. Contraste siempre los factores y la evidencia con el expediente de la obra y con la información del supervisor o inspector antes de adoptar decisiones.
