


INFORME TÉCNICO DE ALERTA TEMPRANA

Riesgo de atraso formal en la ejecución de la obra

Contratacion de ejecucion de obra: Creacion de los servicios operativos o misionales institucionales en el local comunal multiusos en el sector de ruyrucancha del centro poblado de san luis de pujun distrito de san marcos de la provincia de huari del departamento de ancash, con CUI N° 2611032

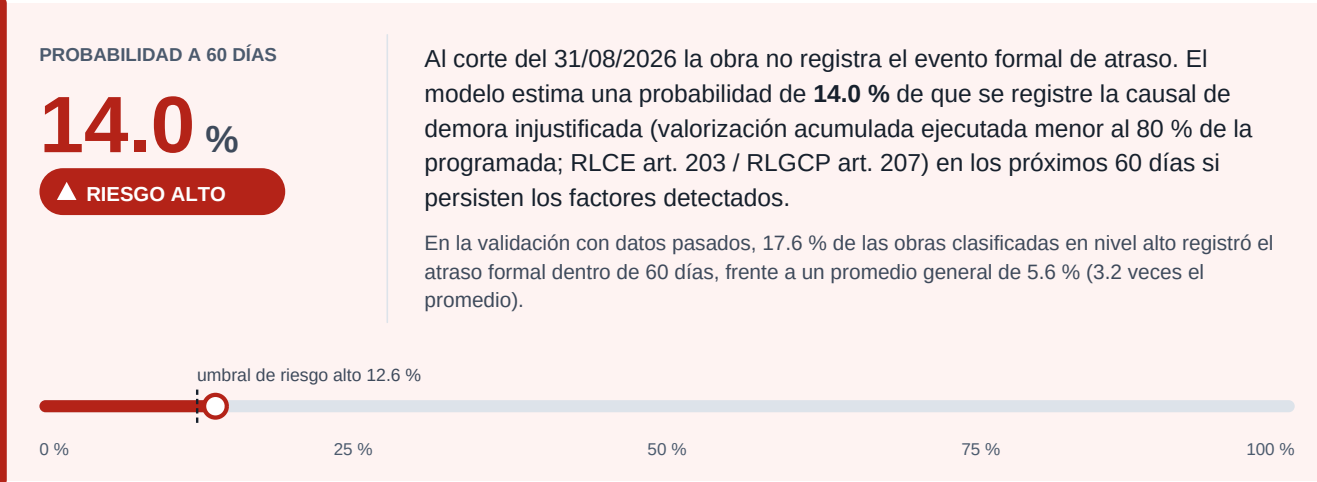


MONTO DEL CONTRATO	PLAZO ORIGINAL	ASIENTOS DEL CUADERNO	ÚLTIMO ASIENTO
No publicado	No publicado	73 desde 22/07/2026	31/08/2026

01 Identificación de la obra y del contrato

Denominación oficial	CONTRATACION DE EJECUCION DE OBRA: CREACION DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN EL LOCAL COMUNAL MULTIUSOS EN EL SECTOR DE RUYRUCANCHA DEL CENTRO POBLADO DE SAN LUIS DE PUJUN DISTRITO DE SAN MARCOS DE LA PROVINCIA DE HUARI DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH, CON CUI N° 2611032
Entidad contratante	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS
Contratista	CONSORCIO EJECUTOR RUYRUCANCHA
Ubicación (distrito / provincia / departamento)	SAN MARCOS / HUARI / ANCASH
Código Único de Inversión (CUI)	2611032
Inversión asociada	CREACION DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN EL LOCAL COMUNAL MULTIUSOS EN EL SECTOR DE RUYRUCANCHA DEL CENTRO POBLADO DE SAN LUIS DE PUJUN DISTRITO DE SAN MARCOS DE LA PROVINCIA DE HUARI DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH
Función	PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA
Identificador del contrato (SEACE)	2406823
Monto del contrato	-
Monto aprobado de la inversión	S/ 1,205,143.61
Cuaderno de obra digital	73 asientos entre 22/07/2026 y 31/08/2026

02 Evolución del riesgo estimado a 60 días

Probabilidad estimada de atraso formal a 60 días

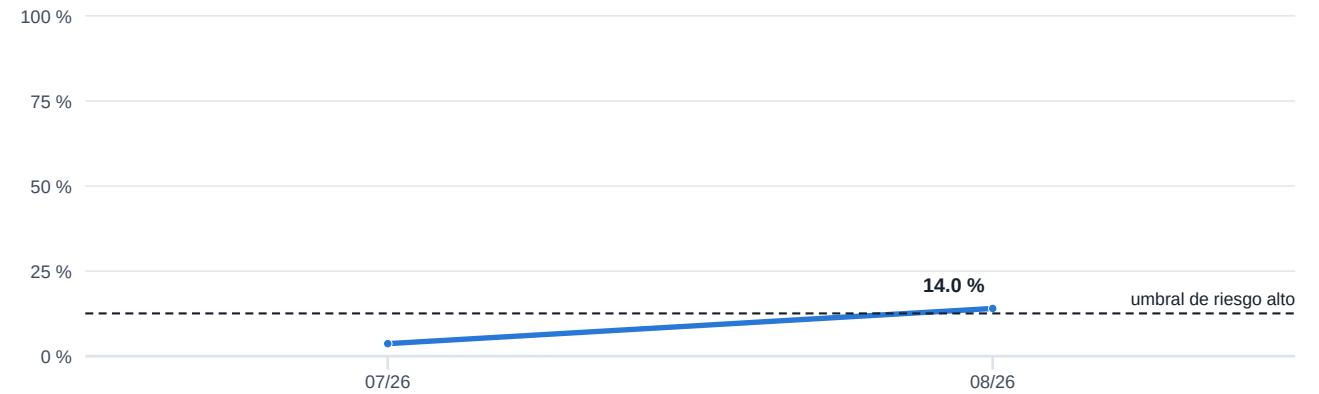

Estimaciones mensuales calculadas solo con la información disponible en cada fecha de corte (2 cortes, del 31/07/2026 al 31/08/2026), con reentrenamiento trimestral del modelo.

03 Factores que explican la estimación

Contribución de cada dato a la probabilidad (valores TreeSHAP en log-odds). Las barras hacia la derecha elevan el riesgo y las barras hacia la izquierda lo reducen, respecto del promedio de las obras.

Dato de la obra	Grupo	Reduce Eleva	Efecto
Índice de alerta por las palabras usadas en los asientos recientes: 0.55 (escala de 0 a 1)	Contenido de los asientos		+0.511
El 12 % de los asientos de los últimos 60 días menciona atraso, retraso o demora	Contenido de los asientos		+0.233
El 1 % de los asientos de los últimos 60 días menciona falta o cambio de personal	Contenido de los asientos		+0.223
El 1 % de los asientos de los últimos 60 días menciona penalidades, incumplimientos o cartas notariales	Contenido de los asientos		+0.154
Hubo registros en el cuaderno 25 días del último mes	Actividad del cuaderno de obra		+0.116
Índice de alerta por el contenido de los asientos recientes: 0.62 (escala de 0 a 1)	Contenido de los asientos		+0.114
Hubo un asiento el mismo día del corte	Actividad del cuaderno de obra		+0.102
Extensión media de los asientos recientes: 1,262 caracteres	Contenido de los asientos		-0.073

04 Qué cambiaría la estimación (sensibilidad del modelo)

Recálculo de la probabilidad modificando una señal a la vez. Indica cuánto depende la estimación de cada señal; no es una estimación causal del efecto de una intervención real.

Escenario	Actual	Escenario	Cambio
Absolver todas las consultas pendientes	14.0 %	14.0 %	+0.0 pp

05 Evidencia documental

Asientos del cuaderno de obra digital y otros registros oficiales asociados a los factores que elevan el riesgo, del más reciente al más antiguo (hasta 12).

Asiento N.º 60 · Otras modificaciones contractuales · SOEC_SPV · 24/08/2026

inicio de labores . posterior a la aprobacion de la adenda n 01 al contrato n 223-2026-mdsm/gm, donde se realiza cambio de personal clave, supervisor de obra, esta supervision se apersono a obra donde se verificaron trabajos de encofrado, vaceado de concreto en la pantalla del muro iii. sin embargo, el dia 25/08/2026, verificara ...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 56 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 21/08/2026

...ento de los requisitos.5. ante la proximidad de la temporada de lluvias y del fenomeno de el nino, se recomienda al contratista adoptar alternativas constructivas y acelerar los trabajos, a fin de no retrasar la obra y de mitigar el riesgo de desprendimiento del talud.6. lo consignado se sujeta a la verificacion del avance en la valorizacion, conforme a la modalidad a suma alzada.

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 51 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 19/08/2026

...i el vaciado de concreto del muro.4. se reitera al contratista programar cuadrillas adicionales conforme a los frentes de trabajo, a fin de mantener el ritmo del calendario de avance de obra y evitar atrasos.5. lo consignado se sujeta a la verificacion del avance en la valorizacion, conforme a la modalidad a suma alzada.

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 49 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 18/08/2026

... ni el vaciado.3. se recomienda al contratista programar cuadrillas adicionales de acuerdo con los frentes de trabajo disponibles, a fin de mantener el ritmo del calendario de avance de obra y evitar atrasos.4. lo consignado se sujeta a la verificacion del avance en la valorizacion, conforme a la modalidad a suma alzada.

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 43 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 14/08/2026

...ida anticipacion. la sola revision del expediente no aprueba adicionales ni consultas: cada uno se tramita por su procedimiento propio, con los plazos previstos en el reglamento de la ley n 32069. la demora del contratista en iniciar o tramitar correctamente dichos procedimientos no constituye causal de ampliacion de plazo.5. lo consignado se sujeta a la verificacion del avance en la valorizacion, confo...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 33 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 08/08/2026

ATRASO NO IMPUTABLE A LA SUPERVISIÓN POR ENTREGA INCOMPLETA DE ENSAYOS: La Supervisión, en atención al Asiento N° 32 del Residente de Obra, de fecha 08/08/2026, deja constancia de:1. La exigencia de ensayos e informes de control de calidad para garantizar la calidad de la obra es función propia de esta Supervisión y no constituye causal imputable a ella. El propio contratista, en sus Asientos N° 20, 26 y 30, reconoci...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 33 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 08/08/2026

...re un procedimiento que justifique dilacion.2. la entrega extemporanea e incompleta de los ensayos de control de calidad necesarios para la ejecucion configura el supuesto del numeral 24 de las otras penalidades del contrato de obra n 202-2026-mdsm/gm (0.20 uit por cada ensayo no realizado o extemporaneo), lo que se pondra en conocimiento de la entidad.3. respecto de lo alegado sobre deficiencias del exped...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 27 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 05/08/2026

ESTRUCTURAS – MURO DE CONTENCIÓN: CONTROL DE FONDO DE ZAPATAS Y PRONUNCIAMIENTO DE ESPECIALISTAS: La Supervisión, en atención al Asiento N° 26 del Residente de Obra, de fecha 05/08/2026, deja constancia de:1. Se toma conocimiento de la charla de seguridad (con registro de asistencia) y de la continuación del trazo, replanteo y compactación de fondo de zapatas (Muro Tipo III y IV), quedando su conformidad sujeta a la ...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 16 · Otras ocurrencias · SOEC_RESI · 30/07/2026

PRESENTACION DE CALENDARIO VALORIZADO Y PLANES: Se deja constancia a la supervisión la presentación del Calendario Valorizado de obra actualizado y Planes según expediente técnico:- CARTA N° 010 - 2026 - CER/JACP/RC. (PROGRAMA DE EJECUCION DE OBRA)- CARTA N° 011 - 2026 - CER/JACP/RC. (PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO)- CARTA N° 012 - 2026 - CER/JACP/RC. (PLAN DE MANEJO AMBIENTAL)- CARTA N° 013 - 2026 - CER/JAC...

Fuente: cod-asientos202607.csv

06

Marco normativo, validez del modelo y lectura del informe

Evento que se anticipa: primer asiento del cuaderno de obra digital de tipo «Valorización acumulada ejecutada menor al 80 % del monto acumulado programado» o «Calendario acelerado de obra» (Reglamento de la Ley N.º 30225, D.S. N.º 344-2018-EF, art. 203; Reglamento de la Ley N.º 32069, D.S. N.º 009-2025-EF, art. 207).

Indicador (prueba temporal ciega)	Nacional	Arequipa
ROC-AUC	0.774	0.719
PR-AUC	0.158	0.216
Prevalencia del evento	0.050	0.091

Modelo atraso-H60-B_full-2026-08-31, entrenado con información hasta el 30/06/2026. Una PR-AUC mayor que la prevalencia indica que el modelo ordena las obras mejor que el azar.

CÓMO USAR ESTE INFORME

La probabilidad es una estimación para priorizar la supervisión, no una certeza ni una determinación de responsabilidades. Contraste siempre los factores y la evidencia con el expediente de la obra y con la información del supervisor o inspector antes de adoptar decisiones.
