


INFORME TÉCNICO DE ALERTA TEMPRANA

Riesgo de atraso formal en la ejecución de la obra

Contratación de elaboración del expediente técnico y ejecución de obra del proyecto: ¿creación del servicio de movilidad urbana en cinco (5) pasos a desnivel elevado (puentes vehiculares) en el eje vial de la AV. Próceres ¿ AV. Wiesse, tramo AV. Perú ¿ AV. Del cruce este distrito de san juan de lurigancho de la provincia de lima del departamento de lima¿, con CUI 2673653

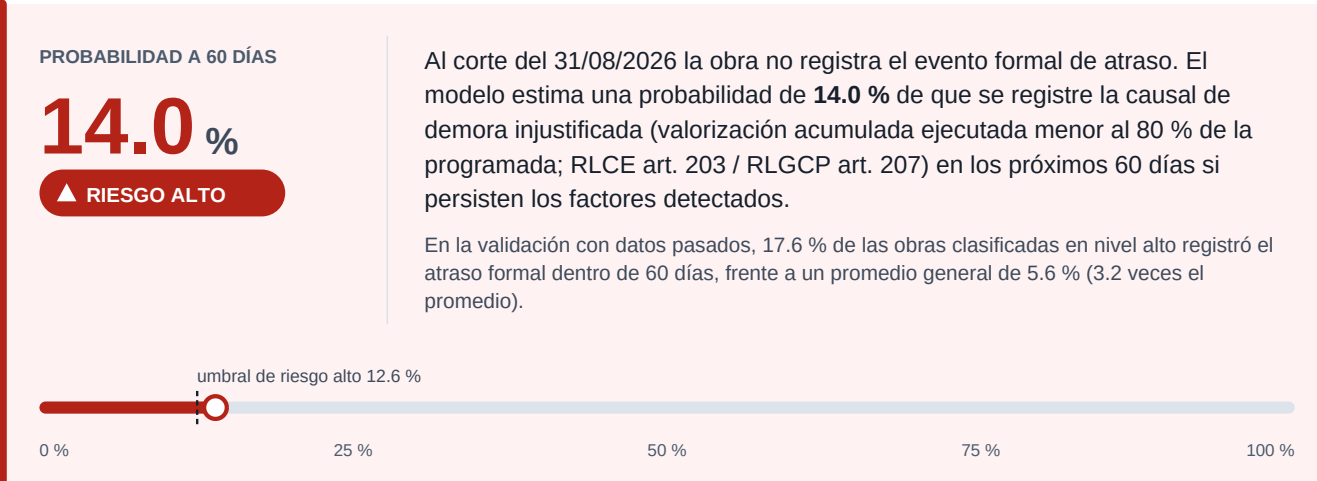

MONTO DEL CONTRATO	PLAZO ORIGINAL	ASIENTOS DEL CUADERNO	ÚLTIMO ASIENTO
S/ 489,455,268.86	420 días	281 desde 01/10/2025	30/08/2026


01 Identificación de la obra y del contrato

Denominación oficial	CONTRATACIÓN DE ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA DEL PROYECTO: ¿CREACIÓN DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN CINCO (5) PASOS A DESNIVEL ELEVADO (PUENTES VEHICULARES) EN EL EJE VIAL DE LA AV. PRÓCERES ¿ AV. WIESSE, TRAMO AV. PERÚ ¿ AV. DEL CRUCE ESTE DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA¿, CON CUI 2673653
Entidad contratante	FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES
Contratista	CONSORCIO PROCERES
Ubicación (distrito / provincia / departamento)	SAN JUAN DE LURIGANCHO / LIMA / LIMA
Código Único de Inversión (CUI)	2673653
Inversión asociada	CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN CINCO (5) PASOS A DESNIVEL ELEVADO (PUENTES VEHICULARES) EN EL EJE VIAL DE LA AV. PRÓCERES ¿ AV. WIESSE, TRAMO AV. PERÚ ¿ AV. DEL CRUCE ESTE. DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA
Función	TRANSPORTE
Identificador del contrato (SEACE)	2321277
Monto del contrato	S/ 489,455,268.86

Monto aprobado de la inversión	S/ 553,628,926.58
Cuaderno de obra digital	281 asientos entre 01/10/2025 y 30/08/2026

02 Evolución del riesgo estimado a 60 días

Probabilidad estimada de atraso formal a 60 días

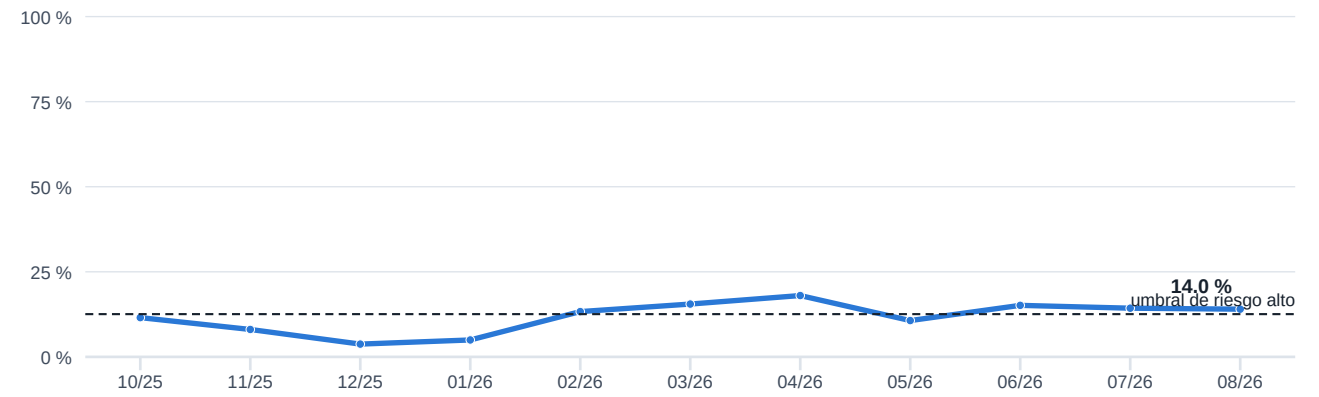

Estimaciones mensuales calculadas solo con la información disponible en cada fecha de corte (11 cortes, del 31/10/2025 al 31/08/2026), con reentrenamiento trimestral del modelo.

03 Factores que explican la estimación

Contribución de cada dato a la probabilidad (valores TreeSHAP en log-odds). Las barras hacia la derecha elevan el riesgo y las barras hacia la izquierda lo reducen, respecto del promedio de las obras.

Dato de la obra	Grupo	Reduce Eleva	Efecto
Índice de alerta por las palabras usadas en los asientos recientes: 0.68 (escala de 0 a 1)	Contenido de los asientos		+0.619
El 20 % de los asientos de los últimos 60 días menciona atraso, retraso o demora	Contenido de los asientos		+0.254
Faltan 86 días para el fin del plazo original	Datos del contrato		+0.205
El 2 % de los asientos de los últimos 60 días menciona penalidades, incumplimientos o cartas notariales	Contenido de los asientos		+0.151
Departamento: Lima	Características de la obra		+0.120
El último asiento se registró hace 1 día	Actividad del cuaderno de obra		+0.100
Índice de alerta por el contenido de los asientos recientes: 0.69 (escala de 0 a 1)	Contenido de los asientos		+0.094
Monto aprobado de la inversión: S/ 553,628,927	Características de la obra		-0.083

04 Qué cambiaría la estimación (sensibilidad del modelo)

Recálculo de la probabilidad modificando una señal a la vez. Indica cuánto depende la estimación de cada señal; no es una estimación causal del efecto de una intervención real.

Escenario	Actual	Escenario	Cambio
Sin nuevas ampliaciones de plazo en los últimos 90 días	14.0 %	14.0 %	+0.0 pp
Registro activo del cuaderno (asiento reciente)	14.0 %	14.0 %	+0.0 pp
Absolver todas las consultas pendientes	14.0 %	15.1 %	+1.1 pp

05 Evidencia documental

Asientos del cuaderno de obra digital y otros registros oficiales asociados a los factores que elevan el riesgo, del más reciente al más antiguo (hasta 12).

Asiento N.º 275 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 28/08/2026

RESPUESTA AL ASIENTO N.º 212 Y N.º 256 – PRESENTACION A LA ENTIDAD DEL PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRA N.º 03 (PEO-03): En atención al Asiento N.º 212 y N.º 256 del Cuaderno de Obra Digital (COD), mediante el cual el Contratista solicita a la Supervisión remitir copia del pronunciamiento elevado a la Entidad respecto del Programa de Ejecución de Obra N.º 03 (PEO-03) y sus calendarios respectivos, corresponde señalar lo sigui...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 257 · Consultas · SOEC_RESI · 27/08/2026

...ervision ha considerado para la atencion correspondiente, por cuanto solicitamos se nos indique de manera expresa las acciones adoptadas al respecto.por lo antes indicado dejamos constancia que, toda demora en la atencion correspondiente que exceda los plazos previstos por el art. 193 del rlce, que impida el normal cumplimiento de las prestaciones contratadas no sera atribuible al contratista.

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 255 · Ampliaciones de plazo · SOEC_RESI · 25/08/2026

...crito al amparo del art. 198 del rlce, dentro de los quince (15) dias siguientes el contratista solicitara, cuanti?cara y sustentara la correspondiente solicitud de ampliacion de plazo, puesto que el atraso en el que se ha incurrido afecta la ruta critica del programa de ejecucion de obra vigente.

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 254 · Ampliaciones de plazo · SOEC_RESI · 25/08/2026

...el n05 av. el muro, previa la conformidad de sedapal, el día de hoy 25.08.2026 al amparo del art. 198 del rlce, anotamos un segundo cese parcial de la ampliacion de plazo por la causal del literal a) atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista, del art. 197 del rlce, circunstancia generada por la falta de permisos que debe otorgar sedapal, que impiden la ejecucion de la partida ...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 253 · Ampliaciones de plazo · SOEC_RESI · 25/08/2026

...por el area usuaria, al amparo del articulo 215 del reglamento, el contratista podria solicitar ampliacion de plazo de acuerdo a los articulos 197 y 198 del reglamento cuando existan paralizaciones o atrasos durante la ejecucion de los trabajos contenidos en los expedientes tecnicos parciales? de esta manera, la normativa de contrataciones del estado permite que el contratista solicite la amplia...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 244 · Otras ocurrencias · SOEC_RESI · 15/08/2026

IDENTIFICACION DE NUEVOS ALCANCES PRODUCTO DE LA COMPATIBILIZACIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE LA LÍNEA 1 CON LOS VIADUCTOS AV. EL MURO Y AV. HÉROES DEL CENEPa: ()... Viene del asiento anterior Consulta N.º02: Indistintamente a la respuesta de la consulta anterior, el requerimiento de la Entidad para garantizar una adecuada conexión entre la rampa del Tramo N.º5 y la rampa del Tramo N.º04 requiere la intervención de la vía exis...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 246 · Otras ocurrencias · SOEC_RESI · 15/08/2026

...ismo, de considerar la presentacion de la informacion requerida se tendria que asumir tentativamente un plazo para el dimensionamiento de recursos y actividades, asumiendo el riesgo de incurrir en un incumplimiento si la parte, distinta al contratista, a la cual le corresponda atender la liberacion de estas interferencia y restricciones no cumple oportunamente en conseguir la libre disponibilidad de las ...

Fuente: cod-asientos202608.csv

- Asiento N.º 230 · Otras ocurrencias · SOEC_RESI · 10/08/2026**

IMPOSIBILIDAD DE EJECUTAR LA PARTIDA CRITICA 07.01 PLAN Y LIBERACION DE INTERFERENCIAS (ALCANTARILLADO Y AGUA) - TRAMO AV. EL MURO: ()... Viene del asiento anterior.INVERMET al no haber conseguido el permiso y/o autorización que debe emitir SEDAPAL, al amparo del Convenio Específico para la Liberación de Interferencias suscrito el 26.09.2025, solicita al Consorcio Proceres mediante Carta N°000286-2025-INVERMET-GP-UFG...

Fuente: cod-asientos202608.csv
- Asiento N.º 205 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 13/07/2026**

incumplimiento de seguridad de obra y senalización . en atencion a la carta n463-2026-consorcio proceres-ro del contratista se comunica que, como resultado de las inspecciones efectuadas por la supervision d...

Fuente: cod-asientos202607.csv
- INFOBRAS · -**

Días para el fin programado original: 86

06 Marco normativo, validez del modelo y lectura del informe

Evento que se anticipa: primer asiento del cuaderno de obra digital de tipo «Valorización acumulada ejecutada menor al 80 % del monto acumulado programado» o «Calendario acelerado de obra» (Reglamento de la Ley N.º 30225, D.S. N.º 344-2018-EF, art. 203; Reglamento de la Ley N.º 32069, D.S. N.º 009-2025-EF, art. 207).

Indicador (prueba temporal ciega)	Nacional	Arequipa
ROC-AUC	0.774	0.719
PR-AUC	0.158	0.216
Prevalencia del evento	0.050	0.091

Modelo atraso-H60-B_full-2026-08-31, entrenado con información hasta el 30/06/2026. Una PR-AUC mayor que la prevalencia indica que el modelo ordena las obras mejor que el azar.

CÓMO USAR ESTE INFORME

La probabilidad es una estimación para priorizar la supervisión, no una certeza ni una determinación de responsabilidades. Contraste siempre los factores y la evidencia con el expediente de la obra y con la información del supervisor o inspector antes de adoptar decisiones.
