


INFORME TÉCNICO DE ALERTA TEMPRANA

Riesgo de atraso formal en la ejecución de la obra

Contratacion para la ejecucion de la obra: ¿reparacion de vereda, adquisicion de mobiliario urbano y luminaria, construccion de cobertura, ademas de otros activos en el (la) espacio urbano alameda porras barrenechea (sector 1-A) distrito de san borja, provincia de lima, departamento de lima¿ con CUI N°2667343

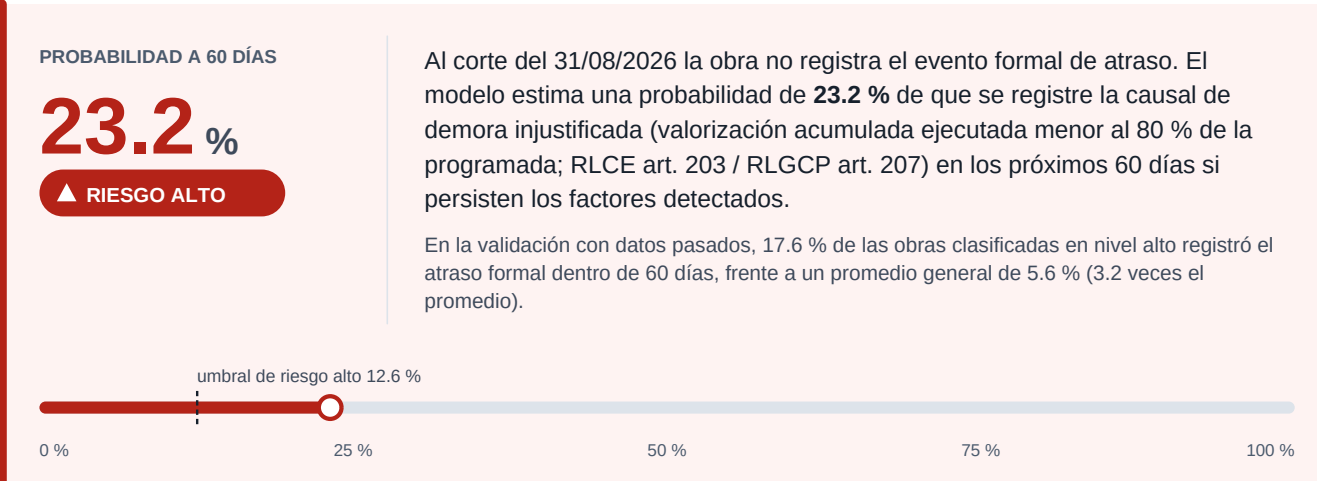

MONTO DEL CONTRATO	PLAZO ORIGINAL	ASIENTOS DEL CUADERNO	ÚLTIMO ASIENTO
No publicado	No publicado	148 desde 01/06/2026	31/08/2026

01 Identificación de la obra y del contrato


Denominación oficial	CONTRATACION PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: ¿REPARACION DE VEREDA, ADQUISICION DE MOBILIARIO URBANO Y LUMINARIA, CONSTRUCCION DE COBERTURA, ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) ESPACIO URBANO ALAMEDA PORRAS BARRENECHEA (SECTOR 1-A) DISTRITO DE SAN BORJA, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA¿ CON CUI N°2667343
Entidad contratante	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN BORJA
Contratista	N & N S.A.C.
Ubicación (distrito / provincia / departamento)	SAN BORJA / LIMA / LIMA
Código Único de Inversión (CUI)	2667343
Inversión asociada	REPARACION DE VEREDA ADQUISICION DE MOBILIARIO URBANO Y LUMINARIA CONSTRUCCION DE COBERTURA ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) ESPACIO URBANO ALAMEDA PORRAS BARRENECHEA (SECTOR 1-A) DISTRITO DE SAN BORJA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA
Función	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
Identificador del contrato (SEACE)	2390307
Monto del contrato	-
Monto aprobado de la inversión	S/ 277,721.73

Cuaderno de obra digital

148 asientos entre 01/06/2026 y 31/08/2026

02 Evolución del riesgo estimado a 60 días

Probabilidad estimada de atraso formal a 60 días

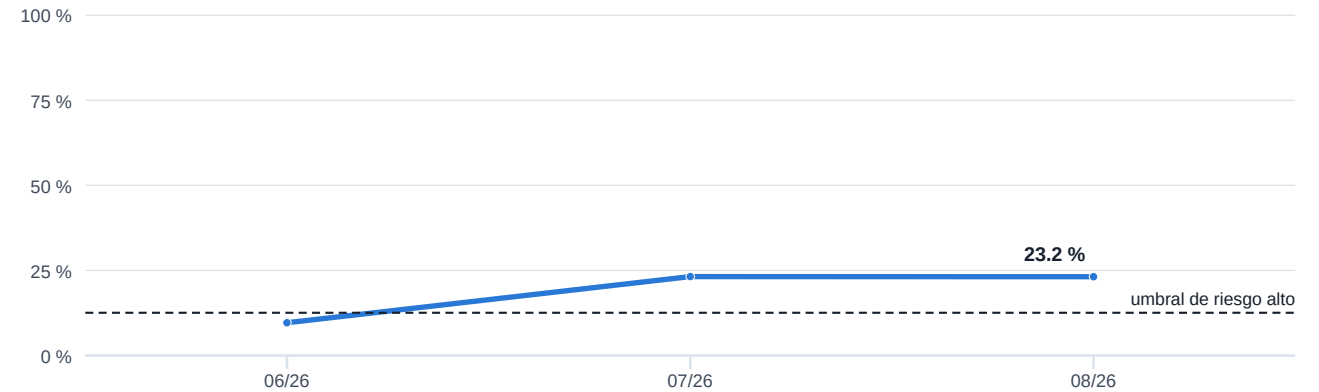

Estimaciones mensuales calculadas solo con la información disponible en cada fecha de corte (3 cortes, del 30/06/2026 al 31/08/2026), con reentrenamiento trimestral del modelo.

03 Factores que explican la estimación

Contribución de cada dato a la probabilidad (valores TreeSHAP en log-odds). Las barras hacia la derecha elevan el riesgo y las barras hacia la izquierda lo reducen, respecto del promedio de las obras.

Dato de la obra	Grupo	Reduce Eleva	Efecto
Índice de alerta por las palabras usadas en los asientos recientes: 0.55 (escala de 0 a 1)	Contenido de los asientos		+0.610
El 5 % de los asientos de los últimos 60 días menciona penalidades, incumplimientos o cartas notariales	Contenido de los asientos		+0.253
El 6 % de los asientos de los últimos 60 días menciona atraso, retraso o demora	Contenido de los asientos		+0.234
Departamento: Lima	Características de la obra		+0.160
Hubo registros en el cuaderno 26 días del último mes	Actividad del cuaderno de obra		+0.123
Monto aprobado de la inversión: S/ 277,722	Características de la obra		-0.122
2 asientos de aplicación de penalidades desde el inicio del cuaderno	Actividad del cuaderno de obra		+0.115
2 asientos de aplicación de penalidades en los últimos 90 días	Actividad del cuaderno de obra		+0.114

04 Qué cambiaría la estimación (sensibilidad del modelo)

Recálculo de la probabilidad modificando una señal a la vez. Indica cuánto depende la estimación de cada señal; no es una estimación causal del efecto de una intervención real.

Escenario	Actual	Escenario	Cambio
Sin aplicación de penalidades en los últimos 90 días	23.2 %	19.7 %	-3.5 pp
Absolver todas las consultas pendientes	23.2 %	23.1 %	-0.0 pp
Sin nuevas ampliaciones de plazo en los últimos 90 días	23.2 %	23.2 %	+0.0 pp

05 Evidencia documental

Asientos del cuaderno de obra digital y otros registros oficiales asociados a los factores que elevan el riesgo, del más reciente al más antiguo (hasta 12).

Asiento N.º 127 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 24/08/2026

... correspondiente, fichas técnicas, certificados de calidad y registro fotográfico, según corresponda. se requiere al contratista adoptar las previsiones necesarias para que esta verificación no genere retrasos en la ejecución de las partidas eléctricas ni afecte el cumplimiento del plazo contractual.

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 116 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 18/08/2026

...ntes por parte de todo el personal que permanezca o desarrolle actividades dentro del área de obra. la residencia deberá efectuar el control respectivo y disponer la corrección inmediata de cualquier incumplimiento.

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 113 · Ampliaciones de plazo · SOEC_RESI · 17/08/2026

...ación sobre la ruta crítica del programa de ejecución vigente. al respecto, el literal a) del numeral 198.1 del artículo 198 del Rlce 2026 establece como causal de ampliación del plazo contractual los atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista, siempre que modifiquen la ruta crítica, asimismo, el literal b) contempla el plazo adicional necesario para ejecutar una prestación adic...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 106 · Administración de riesgos · SOEC_SPV · 13/08/2026

REQUERIMIENTO DE ACELERACIÓN DE TRABAJOS Y PRESENTACIÓN DEL EXPEDIENTE DE PRESTACIÓN ADICIONAL DE OBRA: La Supervisión deja constancia que, considerando el plazo contractual vigente y la necesidad de garantizar el cumplimiento integral de las metas de la obra, se requiere al Contratista adoptar de manera inmediata las acciones necesarias para acelerar la ejecución de las partidas contractuales pendientes, incrementan...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 106 · Administración de riesgos · SOEC_SPV · 13/08/2026

...quiere acelerar y culminar la presentación del expediente técnico de la prestación adicional de obra, cuya necesidad ha sido materia de pronunciamientos y registros previos en el cuaderno de obra. la demora en su presentación constituye un riesgo para la gestión oportuna de dicha prestación y para el cumplimiento de las metas dentro del plazo contractual. el contratista deberá organizar y ejecutar sus ac...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 102 · Administración de riesgos · SOEC_SPV · 11/08/2026

demora en la presentación del expediente de prestación adicional y cumplimiento del plazo contractual . la supervisión deja constancia que, a la fecha, el contratista no ha cumplido con presentar el expedie...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 70 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 20/07/2026

VERIFICACIÓN DE ACTIVIDADES Y RECOMENDACIONES: Durante la jornada, la Supervisión verificó que el contratista ejecutó trabajos de desencofrado, encofrado y curado de veredas, perfilado y excavación manual, excavación de uñas, conformación, nivelación, extendido, humedecimiento y compactación de la capa de afirmado y base granular. Se recomienda y requiere al contratista, por intermedio de la Residencia de Obra, increm...

Fuente: cod-asientos202607.csv

Asiento N.º 67 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 18/07/2026

... presentar de inmediato el expediente técnico completo, incluyendo sustento, planos, especificaciones, metrados, presupuesto, análisis de costos, deductivo vinculante y demás documentos necesarios. el incumplimiento será comunicado a la entidad para las acciones contractuales correspondientes. se deja constancia de que ninguna partida adicional podrá ejecutarse sin la aprobación formal previa de la entidad...

Fuente: cod-asientos202607.csv

- Asiento N.º 62 · Aplicación de penalidades · SOEC_SPV · 15/07/2026**

conformidad al levantamiento de observaciones y aplicacion de penalidad valorizacion de obra n. 01 . se deja constancia de que la entidad, mediante la carta n. 000137-2026-gm-gga y el informe tecnico n. d000052-2026-msb-gm-gga-lmqe, notifico las observaciones formuladas ...

Fuente: cod-asientos202607.csv
- Asiento N.º 60 · Aplicación de penalidades · SOEC_SPV · 14/07/2026**

incumplimiento en la presentacion del reporte semanal y documentacion incompleta en la valorizacion del mes de junio 2026 . se deja constancia de que el contratista ha incumplido con presentar el reporte sem...

Fuente: cod-asientos202607.csv

06 Marco normativo, validez del modelo y lectura del informe

Evento que se anticipa: primer asiento del cuaderno de obra digital de tipo «Valorización acumulada ejecutada menor al 80 % del monto acumulado programado» o «Calendario acelerado de obra» (Reglamento de la Ley N.º 30225, D.S. N.º 344-2018-EF, art. 203; Reglamento de la Ley N.º 32069, D.S. N.º 009-2025-EF, art. 207).

Indicador (prueba temporal ciega)	Nacional	Arequipa
ROC-AUC	0.774	0.719
PR-AUC	0.158	0.216
Prevalencia del evento	0.050	0.091

Modelo atraso-H60-B_full-2026-08-31, entrenado con información hasta el 30/06/2026. Una PR-AUC mayor que la prevalencia indica que el modelo ordena las obras mejor que el azar.

CÓMO USAR ESTE INFORME

La probabilidad es una estimación para priorizar la supervisión, no una certeza ni una determinación de responsabilidades. Contraste siempre los factores y la evidencia con el expediente de la obra y con la información del supervisor o inspector antes de adoptar decisiones.
