


INFORME TÉCNICO DE ALERTA TEMPRANA

Riesgo de atraso formal en la ejecución de la obra

contratación para la ejecución de la obra: Mejoramiento del servicios de espacios públicos urbanos en la plaza cívica de la asociación de vivienda vista alegre distrito de coronel gregorio albarracin lanchipa de la provincia de tacna del departamento de tacna

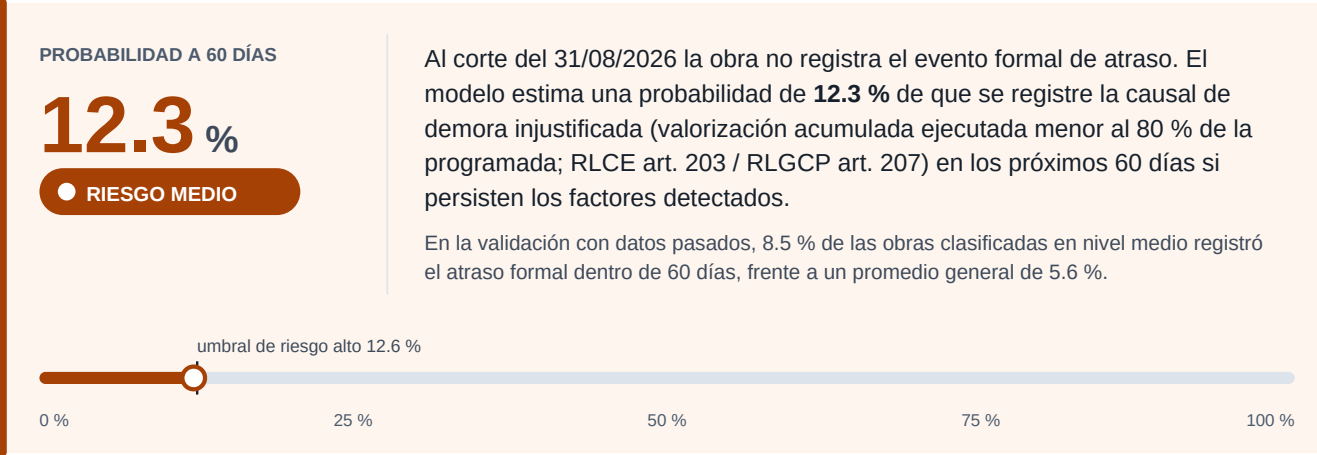


MONTO DEL CONTRATO	PLAZO ORIGINAL	ASIENTOS DEL CUADERNO	ÚLTIMO ASIENTO
No publicado	No publicado	65 desde 02/07/2026	31/08/2026

01 Identificación de la obra y del contrato

Denominación oficial	CONTRATACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIOS DE ESPACIOS PÚBLICOS URBANOS EN LA PLAZA CÍVICA DE LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA VISTA ALEGRE DISTRITO DE CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA DE LA PROVINCIA DE TACNA DEL DEPARTAMENTO DE TACNA
Entidad contratante	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA
Contratista	CONSORCIO CLEMESI
Ubicación (distrito / provincia / departamento)	CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA / TACNA / TACNA
Código Único de Inversión (CUI)	2616284
Inversión asociada	MEJORAMIENTO DEL SERVICIOS DE ESPACIOS PÚBLICOS URBANOS EN LA PLAZA CÍVICA DE LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA VISTA ALEGRE DISTRITO DE CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA DE LA PROVINCIA DE TACNA DEL DEPARTAMENTO DE TACNA
Función	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
Identificador del contrato (SEACE)	2398069
Monto del contrato	-
Monto aprobado de la inversión	S/ 8,638,019.19
Cuaderno de obra digital	65 asientos entre 02/07/2026 y 31/08/2026

02 Evolución del riesgo estimado a 60 días

Probabilidad estimada de atraso formal a 60 días

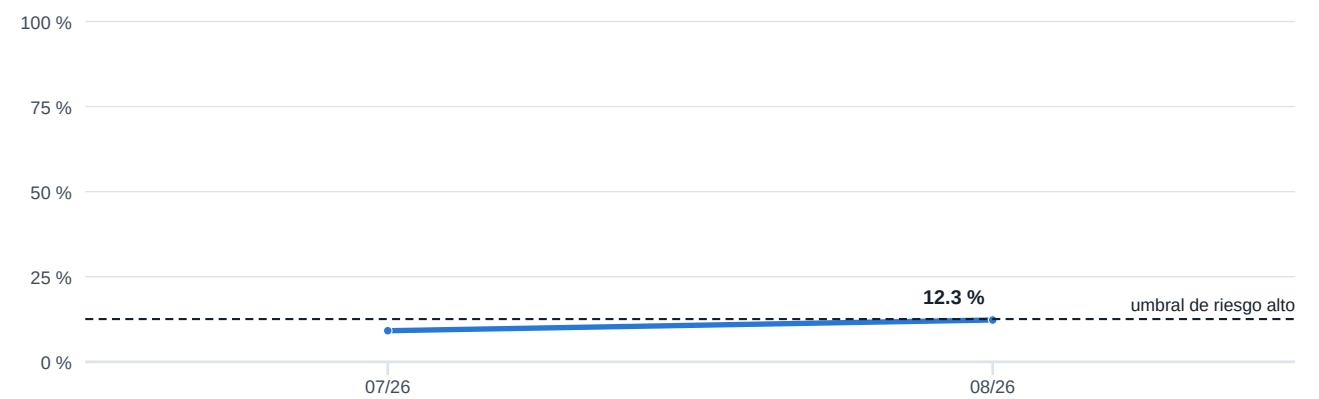

Estimaciones mensuales calculadas solo con la información disponible en cada fecha de corte (2 cortes, del 31/07/2026 al 31/08/2026), con reentrenamiento trimestral del modelo.

03 Factores que explican la estimación

Contribución de cada dato a la probabilidad (valores TreeSHAP en log-odds). Las barras hacia la derecha elevan el riesgo y las barras hacia la izquierda lo reducen, respecto del promedio de las obras.

Dato de la obra	Grupo	Reduce Eleva	Efecto
Índice de alerta por las palabras usadas en los asientos recientes: 0.59 (escala de 0 a 1)	Contenido de los asientos		+0.540
Departamento: Tacna	Características de la obra		+0.225
El 5 % de los asientos de los últimos 60 días menciona atraso, retraso o demora	Contenido de los asientos		+0.152
Índice de alerta por el contenido de los asientos recientes: 0.65 (escala de 0 a 1)	Contenido de los asientos		+0.102
Hubo un asiento el mismo día del corte	Actividad del cuaderno de obra		+0.098
Ningún asiento de los últimos 60 días menciona penalidades, incumplimientos o cartas notariales	Contenido de los asientos		-0.093
Gasto devengado en los últimos 3 meses: S/ 14,167	Ejecución del gasto (SIAF)		+0.081
El 5 % de los asientos de los últimos 60 días menciona observaciones de calidad	Contenido de los asientos		+0.077

04 Qué cambiaría la estimación (sensibilidad del modelo)

Recálculo de la probabilidad modificando una señal a la vez. Indica cuánto depende la estimación de cada señal; no es una estimación causal del efecto de una intervención real.

Escenario	Actual	Escenario	Cambio
Absolver todas las consultas pendientes	12.3 %	12.3 %	+0.0 pp

05 Evidencia documental

Asientos del cuaderno de obra digital y otros registros oficiales asociados a los factores que elevan el riesgo, del más reciente al más antiguo (hasta 12).

Asiento N.º 47 · Constatación física de la obra · SOEC_SPV · 17/08/2026

AVANCE EN OBRA: Se verifica los siguientes trabajos en campo: -Desmontaje de columnas ornamentales con el personal obrero, así mismo se exige el resguardo de los bienes de acuerdo a las especificaciones técnicas. -Vaciado de concreto de solado de zapatas de acuerdo a los niveles indicados en el expediente técnico. -Excavación de zanjas para los sardineles de acuerdo a los planos A-07 y DE-01. Así mismo se toma conocimi...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 48 · Otras ocurrencias · SOEC_RESI · 17/08/2026

...man parte de la ruta critica inicial pueden volverse criticas. clima : durante todo el dia se registra llovizna, por lo que el avance de obra no se ha desarrollado de acuerdo a lo programado, causando retrasando en el avance de obra, segun senamhi de tacna, en los reportes indica el evento climatico se registrara hasta el 19 de agosto. a la supervision se cursa la carta n 54-2026/c-frontera/rc, reporte se...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 36 · Consultas · SOEC_RESI · 05/08/2026

...ediente tecnico lamina in-02 folio 36, se presentara el informe tecnico sobre dicho arbol, que interfiere la construccion de las redes de agua, se evidencia que al no ejecutar dicho tramo se caera en retraso de ejecucion de dicha partida, afectando el cronograma de ejecucion de obra programado para el mes de agosto del 2026.

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 14 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 15/07/2026

PRESENTACION DE INFORMACION TECNICA A LA ENTIDAD Y OTRAS OCURRENCIAS: A través de la revisión de los especialistas en seguridad en obra y salud ocupacional, especialista en calidad, especialista en costos y presupuesto y mi persona, se presentó el día de hoy, el levantamiento de observaciones del CONSORCIO FRONTERA: CARTA N°010-2026-JEBM-CSVA REMITO OPINION FAVORABLE AL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL, con CARTA N°013-2026-...

Fuente: cod-asientos202607.csv

Asiento N.º 13 · Otras ocurrencias · SOEC_RESI · 14/07/2026

...ra 01:09 pm, a la fecha no se tiene respuesta por parte de dicha entidad, se nos informo que el supervisor se encuentra de comision por dos dias es decir hasta el dia de manana, consideramos que este retraso de dicho documento que es requisito indispensable para iniciar con la demolicion de las estructuras de concreto y movimientos de tierras que deben de ser monitoreados por un supervisor arqueologo de...

Fuente: cod-asientos202607.csv

Asiento N.º 7 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 09/07/2026

PARA CONOCIMIENTO Y LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES.: Respecto al asiento N° 04 del residente de obra se indica lo siguiente: Mediante Acta N°01-2026-CO-DGSLP-MDCGAL de fecha 08 de julio del 2026, la coordinadora de obra hace entrega de documentación y pone en conocimiento respecto al trámite presentado por la residencia de obra. Así mismo se indica lo siguiente: Con CARTA N°2131-2026-GEI/MDCGAL se comunica observacion...

Fuente: cod-asientos202607.csv

06 Marco normativo, validez del modelo y lectura del informe

Evento que se anticipa: primer asiento del cuaderno de obra digital de tipo «Valorización acumulada ejecutada menor al 80 % del monto acumulado programado» o «Calendario acelerado de obra» (Reglamento de la Ley N.º 30225, D.S. N.º 344-2018-EF, art. 203; Reglamento de la Ley N.º 32069, D.S. N.º 009-2025-EF, art. 207).

Indicador (prueba temporal ciega)	Nacional	Arequipa
ROC-AUC	0.774	0.719
PR-AUC	0.158	0.216
Prevalencia del evento	0.050	0.091

Modelo atraso-H60-B_full-2026-08-31, entrenado con información hasta el 30/06/2026. Una PR-AUC mayor que la prevalencia indica que el modelo ordena las obras mejor que el azar.

CÓMO USAR ESTE INFORME

La probabilidad es una estimación para priorizar la supervisión, no una certeza ni una determinación de responsabilidades. Contraste siempre los factores y la evidencia con el expediente de la obra y con la información del supervisor o inspector antes de adoptar decisiones.
