

INFORME TÉCNICO DE ALERTA TEMPRANA

Riesgo de atraso formal en la ejecución de la obra

Mejoramiento del camino vecinal desde el caserio filoque grande hasta el anexo las lomas del caserio de racali, distrito de olmos provincia de lambayeque - departamento de lambayeque

PROBABILIDAD A 60 DÍAS

14.4 %

▲ RIESGO ALTO

Al corte del 31/08/2026 la obra no registra el evento formal de atraso. El modelo estima una probabilidad de **14.4 %** de que se registre la causal de demora injustificada (valorización acumulada ejecutada menor al 80 % de la programada; RLCE art. 203 / RLGCP art. 207) en los próximos 60 días si persisten los factores detectados.

En la validación con datos pasados, 17.6 % de las obras clasificadas en nivel alto registró el atraso formal dentro de 60 días, frente a un promedio general de 5.6 % (3.2 veces el promedio).

umbral de riesgo alto 12.6 %

0 % 25 % 50 % 75 % 100 %


MONTO DEL CONTRATO	PLAZO ORIGINAL	ASIENTOS DEL CUADERNO	ÚLTIMO ASIENTO
S/ 13,090,388.02	210 días	306 desde 20/02/2025	31/08/2026

01 Identificación de la obra y del contrato

Denominación oficial	MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL DESDE EL CASERIO FILOQUE GRANDE HASTA EL ANEXO LAS LOMAS DEL CASERIO DE RACALI, DISTRITO DE OLMOS PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE
Entidad contratante	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OLMOS
Contratista	CONSORCIO FILOQUE
Ubicación (distrito / provincia / departamento)	OLMOS / LAMBAYEQUE / LAMBAYEQUE
Código Único de Inversión (CUI)	2302174
Inversión asociada	MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL DESDE EL CASERIO FILOQUE GRANDE HASTA EL ANEXO LAS LOMAS DEL CASERIO DE RACALI, DISTRITO DE OLMOS - LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE
Función	TRANSPORTE
Identificador del contrato (SEACE)	2307583
Monto del contrato	S/ 13,090,388.02
Monto aprobado de la inversión	S/ 6,654,049.00
Cuaderno de obra digital	306 asientos entre 20/02/2025 y 31/08/2026

02 Evolución del riesgo estimado a 60 días

Probabilidad estimada de atraso formal a 60 días

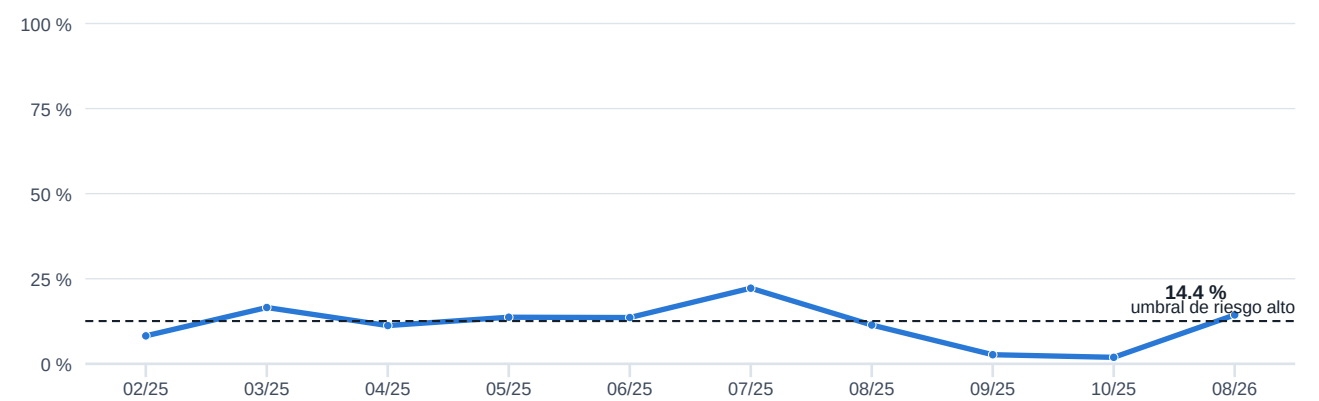

Estimaciones mensuales calculadas solo con la información disponible en cada fecha de corte (10 cortes, del 28/02/2025 al 31/08/2026), con reentrenamiento trimestral del modelo.

03 Factores que explican la estimación

Contribución de cada dato a la probabilidad (valores TreeSHAP en log-odds). Las barras hacia la derecha elevan el riesgo y las barras hacia la izquierda lo reducen, respecto del promedio de las obras.

Dato de la obra	Grupo	Reduce Eleva	Efecto
Índice de alerta por las palabras usadas en los asientos recientes: 0.54 (escala de 0 a 1)	Contenido de los asientos		+0.575
El 79 % de los asientos de los últimos 90 días fue registrado por la supervisión o inspección	Actividad del cuaderno de obra		+0.357
Departamento: Lambayeque	Características de la obra		+0.196
El 14 % de los asientos de los últimos 60 días menciona atraso, retraso o demora	Contenido de los asientos		+0.178
Hubo registros en el cuaderno 7 días del último mes	Actividad del cuaderno de obra		-0.149
Hubo un asiento el mismo día del corte	Actividad del cuaderno de obra		+0.101
Gasto devengado en los últimos 3 meses: S/ 0	Ejecución del gasto (SIAF)		+0.055
Registros del último mes: 3.00 veces el promedio mensual del trimestre	Actividad del cuaderno de obra		+0.054

04 Qué cambiaría la estimación (sensibilidad del modelo)

Recálculo de la probabilidad modificando una señal a la vez. Indica cuánto depende la estimación de cada señal; no es una estimación causal del efecto de una intervención real.

Escenario	Actual	Escenario	Cambio
Absolver todas las consultas pendientes	14.4 %	14.4 %	-0.0 pp
Ejecución financiera al día (devengado en el último mes)	14.4 %	14.4 %	+0.0 pp
Sin nuevas ampliaciones de plazo en los últimos 90 días	14.4 %	14.4 %	+0.0 pp

05 Evidencia documental

Asientos del cuaderno de obra digital y otros registros oficiales asociados a los factores que elevan el riesgo, del más reciente al más antiguo (hasta 12).

Asiento N.º 304 · Ampliaciones de plazo · SOEC_RESI · 31/08/2026

... vinculada a la ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente. en consecuencia, con fecha 21/08/2026 se deja constancia del inicio de la circunstancia que determina la ampliación de plazo por atraso o paralización no imputable al contratista, conforme al literal a) del artículo 197 del reglamento de la ley de contrataciones del estado. la causal permanecerá abierta hasta que se autorice y ejecute...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 300 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 28/08/2026

SE RECOMIENDA AL CONTRATISTA IMPLEMENTAR UNA MAYOR CANTIDAD DE FRENTE DE TRABAJO Y PRIORIZAR LA EJECUCIÓN DE LAS PARTIDAS CONTRACTUALES PENDIENTES: Se recomienda al Contratista implementar una mayor cantidad de frentes de trabajo y priorizar la ejecución de las partidas contractuales pendientes, a fin de mejorar el ritmo de avance y evitar afectaciones al plazo de ejecución. Entre las actividades pendientes se consi...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 295 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 27/08/2026

VERIFICACIÓN DE TRABAJOS DE EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL AFIRMADO: En la fecha, durante la inspección realizada en campo, esta Supervisión verificó la ejecución de los trabajos correspondientes al extendido, nivelación y compactación de material afirmado con espesor de 20 cm, en los siguientes puntos de intervención: • Baden N.º 02: km 2+369.592 • Baden N.º 03: km 2+964.119 • Baden N.º 04: km 3+727.7...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 291 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 25/08/2026

...la presentación oportuna de los protocolos y documentación de control resulta necesaria para garantizar la continuidad del proceso de verificación y liberación de las actividades ejecutadas, evitando retrasos en el desarrollo de los trabajos y en las actividades posteriores que dependan de su aprobación. * se adjuntan imágenes referenciales

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 287 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 24/08/2026

SOLICITUD DE CERTIFICADOS DE CALIBRACIÓN DE EQUIPOS PARA ENSAYOS DE DENSIDAD Y CONTROL DE COMPACTACIÓN EN OBRA: Se solicita al CONTRATISTA presentar los certificados de calibración vigentes de los equipos, instrumentos y herramientas utilizados para la ejecución de las pruebas de densidad de la subrasante y del material granular compactado, debiendo acreditar que dichos equipos se encuentran debidamente calibrados y ...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 285 · Ampliaciones de plazo · SOEC_RESI · 24/08/2026

...bles para ejecutar los trabajos. conforme a los artículos 197 y 198 del reglamento de la ley de contrataciones del estado, se anota el inicio de una circunstancia que determina ampliación de plazo por atraso y/o paralización no atribuible al contratista. su conclusión será anotada cuando cese efectivamente el impedimento, cuantificándose la ampliación según el periodo de afectación de la ruta crítica. se...

Fuente: cod-asientos202608.csv

06 Marco normativo, validez del modelo y lectura del informe

Evento que se anticipa: primer asiento del cuaderno de obra digital de tipo «Valorización acumulada ejecutada menor al 80 % del monto acumulado programado» o «Calendario acelerado de obra» (Reglamento de la Ley N.º 30225, D.S. N.º 344-2018-EF, art. 203; Reglamento de la Ley N.º 32069, D.S. N.º 009-2025-EF, art. 207).

Indicador (prueba temporal ciega)	Nacional	Arequipa
ROC-AUC	0.774	0.719
PR-AUC	0.158	0.216
Prevalencia del evento	0.050	0.091

Modelo atraso-H60-B_full-2026-08-31, entrenado con información hasta el 30/06/2026. Una PR-AUC mayor que la prevalencia indica que el modelo ordena las obras mejor que el azar.

CÓMO USAR ESTE INFORME

La probabilidad es una estimación para priorizar la supervisión, no una certeza ni una determinación de responsabilidades. Contraste siempre los factores y la evidencia con el expediente de la obra y con la información del supervisor o inspector antes de adoptar decisiones.
