


INFORME TÉCNICO DE ALERTA TEMPRANA

Riesgo de atraso formal en la ejecución de la obra

Contratación para la ejecución de la obra: "creacion del servicio de movilidad urbana en la transitabilidad vehicular y peatonal de las calles internas de la asociacion de propietarios, san juan de jicamarca cerro camote del distrito de lurigancho de la provincia de lima del departamento de lima" con CUI N° 2685518

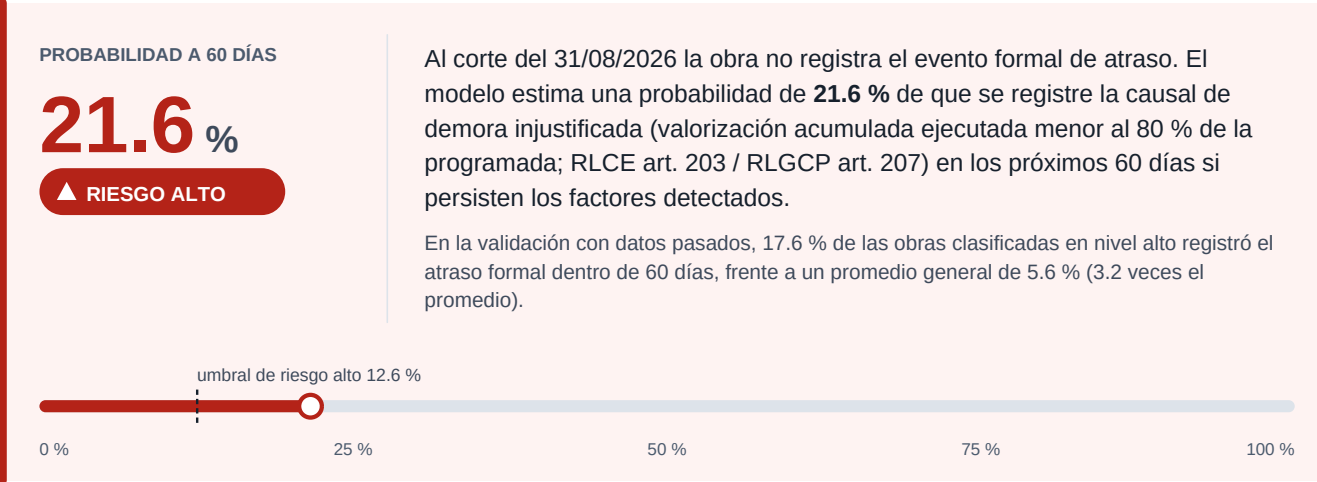


MONTO DEL CONTRATO	PLAZO ORIGINAL	ASIENTOS DEL CUADERNO	ÚLTIMO ASIENTO
No publicado	No publicado	101 desde 07/07/2026	31/08/2026

01 Identificación de la obra y del contrato

Denominación oficial	CONTRATACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES INTERNAS DE LA ASOCIACION DE PROPIETARIOS, SAN JUAN DE JICAMARCA CERRO CAMOTE DEL DISTRITO DE LURIGANCHO DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA" CON CUI N° 2685518
Entidad contratante	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LURIGANCHO (CHOSICA)
Contratista	CONSORCIO HUACAYBAMBA
Ubicación (distrito / provincia / departamento)	LURIGANCHO / LIMA / LIMA
Código Único de Inversión (CUI)	2685518
Inversión asociada	CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES INTERNAS DE LA ASOCIACION DE PROPIETARIOS, SAN JUAN DE JICAMARCA CERRO CAMOTE DEL DISTRITO DE LURIGANCHO DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA
Función	TRANSPORTE
Identificador del contrato (SEACE)	2403281
Monto del contrato	-
Monto aprobado de la inversión	S/ 726,938.21
Cuaderno de obra digital	101 asientos entre 07/07/2026 y 31/08/2026

02 Evolución del riesgo estimado a 60 días

Probabilidad estimada de atraso formal a 60 días

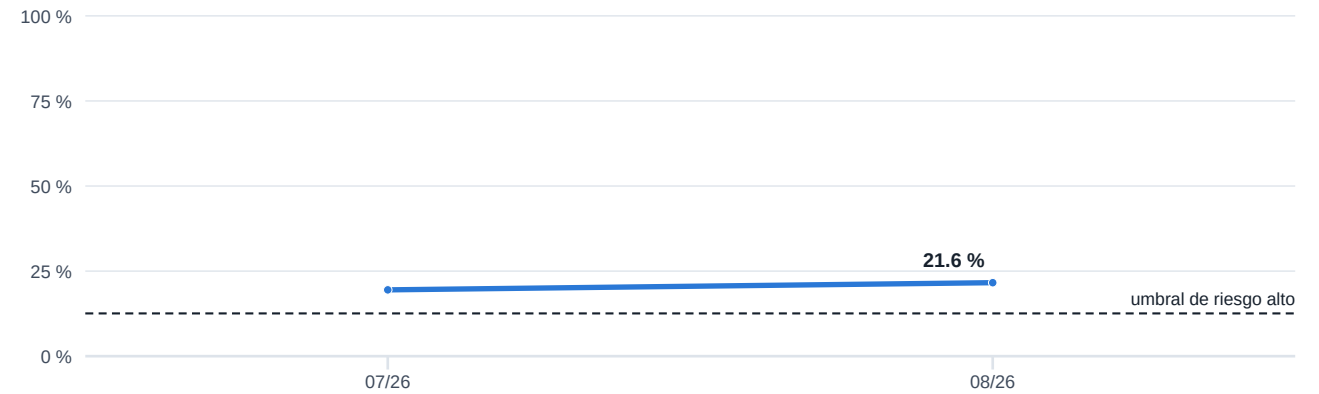

Estimaciones mensuales calculadas solo con la información disponible en cada fecha de corte (2 cortes, del 31/07/2026 al 31/08/2026), con reentrenamiento trimestral del modelo.

03 Factores que explican la estimación

Contribución de cada dato a la probabilidad (valores TreeSHAP en log-odds). Las barras hacia la derecha elevan el riesgo y las barras hacia la izquierda lo reducen, respecto del promedio de las obras.

Dato de la obra	Grupo	Reduce Eleva	Efecto
Índice de alerta por las palabras usadas en los asientos recientes: 0.63 (escala de 0 a 1)	Contenido de los asientos		+0.631
El 11 % de los asientos de los últimos 60 días menciona penalidades, incumplimientos o cartas notariales	Contenido de los asientos		+0.267
El 4 % de los asientos de los últimos 60 días menciona atraso, retraso o demora	Contenido de los asientos		+0.177
Departamento: Lima	Características de la obra		+0.161
El 53 % de los asientos de los últimos 90 días fue registrado por la supervisión o inspección	Actividad del cuaderno de obra		+0.142
Hubo un asiento el mismo día del corte	Actividad del cuaderno de obra		+0.107
Hubo registros en el cuaderno 25 días del último mes	Actividad del cuaderno de obra		+0.102
5 asientos de órdenes en los últimos 90 días	Actividad del cuaderno de obra		+0.092

04 Evidencia documental

Asientos del cuaderno de obra digital y otros registros oficiales asociados a los factores que elevan el riesgo, del más reciente al más antiguo (hasta 12).

Asiento N.º 51 · Otras ocurrencias · SOEC_RESI · 04/08/2026

...zo el corte a nivel subrasante de los corte y eliminacion. en las aguilas progresiva 0+000 al 0+030. se realizo la eliminacion de material excedente.lluvias constantes durante el dia domingo 02/08/26 retrasando los trabajos programados para el dia siguiente. presencia de lluvias paulatinas durante el dia retrasando y perjudicando el terreno para realizar los trabajos programados.el dia lunes 03/08/26 se...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 53 · Otras ocurrencias · SOEC_RESI · 04/08/2026

...e a nivel subrasante de los corte y eliminacion. calle los nandu tramo 1 de la progresiva 0+000 al 0+070 se realizo la eliminacion de material excedente.presencia de lluvias paulatinas durante el dia retrasando y perjudicando el terreno para realizar los trabajos programados.se evidencia la existencia de veredas de concreto existentes.se deja constancia al supervisor de obra sobre los trabajos realizado...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 50 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 03/08/2026

CONTROL DE ACTIVIDADES EJECUTADAS, MEDIDAS DE SEGURIDAD Y PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN CONTRACTUAL: La Supervisión verificó el inicio de la jornada con la charla diaria de seguridad de cinco minutos y la ejecución de las siguientes actividades:Corte y eliminación de material en la calle Las Águilas, progresivas 0+000 al 0+030.Perfilado de veredas en la calle Los Ñandú, progresivas 0+070 al 0+130, lado izquierdo.Se r...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 50 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 03/08/2026

...cos y demas documentacion contractual.se ordena al residente de obra mantener actualizados los registros de produccion, metrados, personal, equipos, seguridad, calidad y evidencias fotograficas. todo incumplimiento sera comunicado a la entidad para las acciones contractuales que correspondan.

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 39 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 24/07/2026

REITERACIÓN FINAL DE PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA: Mediante el Asiento N.º 14, de fecha 14/07/2026, y el Asiento N.º 29, de fecha 21/07/2026, esta Supervisión requirió al Contratista la presentación y regularización de documentación necesaria para el control técnico, contractual, ambiental, de seguridad y de programación de la obra. No obstante, a la fecha, el Contratista no ha cumplido con presentar de ...

Fuente: cod-asientos202607.csv

Asiento N.º 39 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 24/07/2026

...a por ultima vez al contratista que cumpla con presentar la totalidad de la documentacion indicada dentro del plazo maximo de un (01) dia calendario, contado desde el registro del presente asiento.el incumplimiento sera comunicado a la entidad para la evaluacion de las acciones contractuales que correspondan, sin perjuicio de la responsabilidad exclusiva del contratista por las consecuencias tecnicas, co...

Fuente: cod-asientos202607.csv

Asiento N.º 37 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 23/07/2026

...para la entidad.el contratista debera subsanar las observaciones y presentar la documentacion requerida en el plazo maximo de un (1) dia calendario, contado desde el registro del presente asiento. el incumplimiento sera comunicado a la entidad para la evaluacion de las acciones contractuales que correspondan, previa revision del contrato n. 16-2026/mdl-ogaf, las bases integradas y la normativa aplicable.

Fuente: cod-asientos202607.csv

Asiento N.º 29 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 21/07/2026

COORDINACIÓN PARA LA REGULARIZACIÓN DE DOCUMENTACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS EN OBRA (1): En el marco de una adecuada coordinación entre la Supervisión y el Contratista, se deja constancia de que, con fecha 14/07/2026, se formularon observaciones a la Carta N.º 004-2026-CONSORCIO LAHG, referida a la presentación del Plan de Seguridad y Salud Ocupacional. A la fecha se encuentra pendiente acreditar su levantamient...

Fuente: cod-asientos202607.csv

Asiento N.º 28 · Otras ocurrencias · SOEC_RESI · 20/07/2026

...tuado en campo.2. emitir pronunciamiento respecto a las diferencias encontradas entre el expediente tecnico y las condiciones reales del terreno.3. autorizar las acciones que correspondan para evitar retrasos en la ejecucion de la obra.se deja constancia de que la presente consulta se formula con la finalidad de garantizar la correcta ejecucion de la obra, evitando observaciones posteriores y asegurando...

Fuente: cod-asientos202607.csv

05 Marco normativo, validez del modelo y lectura del informe

Evento que se anticipa: primer asiento del cuaderno de obra digital de tipo «Valorización acumulada ejecutada menor al 80 % del monto acumulado programado» o «Calendario acelerado de obra» (Reglamento de la Ley N.º 30225, D.S. N.º 344-2018-EF, art. 203; Reglamento de la Ley N.º 32069, D.S. N.º 009-2025-EF, art. 207).

Indicador (prueba temporal ciega)	Nacional	Arequipa
ROC-AUC	0.774	0.719
PR-AUC	0.158	0.216
Prevalencia del evento	0.050	0.091

Modelo atraso-H60-B_full-2026-08-31, entrenado con información hasta el 30/06/2026. Una PR-AUC mayor que la prevalencia indica que el modelo ordena las obras mejor que el azar.

CÓMO USAR ESTE INFORME

La probabilidad es una estimación para priorizar la supervisión, no una certeza ni una determinación de responsabilidades. Contraste siempre los factores y la evidencia con el expediente de la obra y con la información del supervisor o inspector antes de adoptar decisiones.
