


INFORME TÉCNICO DE ALERTA TEMPRANA

Riesgo de atraso formal en la ejecución de la obra

Ejecucion de obra

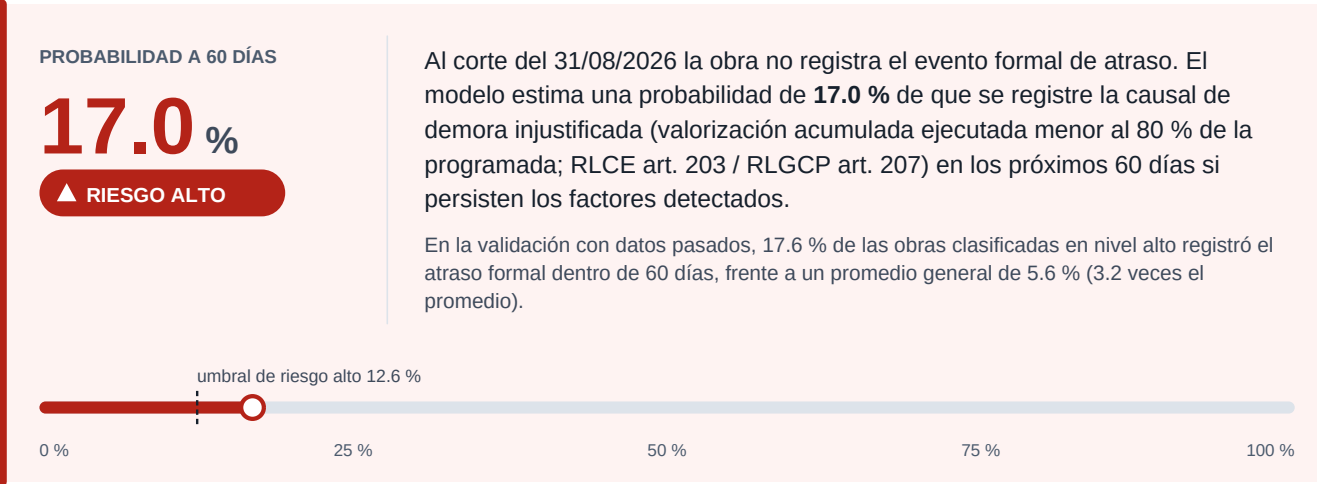


MONTO DEL CONTRATO	PLAZO ORIGINAL	ASIENTOS DEL CUADERNO	ÚLTIMO ASIENTO
No publicado	No publicado	169 desde 12/06/2026	31/08/2026

01 Identificación de la obra y del contrato

Denominación oficial	EJECUCION DE OBRA
Entidad contratante	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVA CAJAMARCA
Contratista	CONSORCIO CASTILLA
Ubicación (distrito / provincia / departamento)	NUEVA CAJAMARCA / RIOJA / SAN MARTIN
Código Único de Inversión (CUI)	no enlazado
Inversión asociada	-
Función	-
Identificador del contrato (SEACE)	2396651
Monto del contrato	-
Monto aprobado de la inversión	-
Cuaderno de obra digital	169 asientos entre 12/06/2026 y 31/08/2026

02 Evolución del riesgo estimado a 60 días

Probabilidad estimada de atraso formal a 60 días

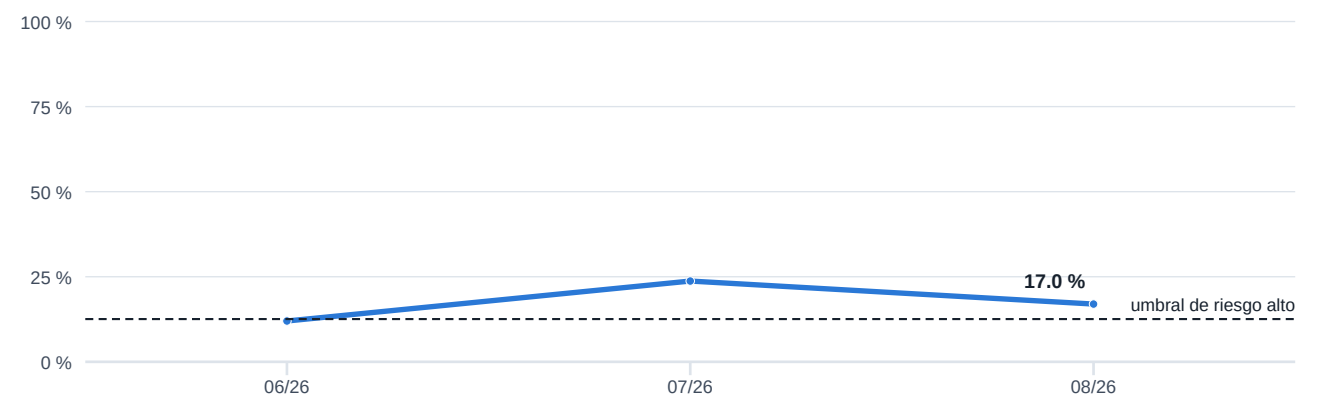

Estimaciones mensuales calculadas solo con la información disponible en cada fecha de corte (3 cortes, del 30/06/2026 al 31/08/2026), con reentrenamiento trimestral del modelo.

03 Factores que explican la estimación

Contribución de cada dato a la probabilidad (valores TreeSHAP en log-odds). Las barras hacia la derecha elevan el riesgo y las barras hacia la izquierda lo reducen, respecto del promedio de las obras.

Dato de la obra	Grupo	Reduce Eleva	Efecto
Índice de alerta por las palabras usadas en los asientos recientes: 0.53 (escala de 0 a 1)	Contenido de los asientos		+0.492
El 6 % de los asientos de los últimos 60 días menciona atraso, retraso o demora	Contenido de los asientos		+0.213
El 2 % de los asientos de los últimos 60 días menciona penalidades, incumplimientos o cartas notariales	Contenido de los asientos		+0.161
7 asientos de órdenes en los últimos 90 días	Actividad del cuaderno de obra		+0.130
Hubo un asiento el mismo día del corte	Actividad del cuaderno de obra		+0.124
Departamento: San Martín	Características de la obra		+0.110
19 asientos de adicionales de obra en los últimos 90 días	Actividad del cuaderno de obra		+0.079
Extensión media de los asientos recientes: 1,006 caracteres	Contenido de los asientos		-0.063

04 Qué cambiaría la estimación (sensibilidad del modelo)

Recálculo de la probabilidad modificando una señal a la vez. Indica cuánto depende la estimación de cada señal; no es una estimación causal del efecto de una intervención real.

Escenario	Actual	Escenario	Cambio
Sin nuevas ampliaciones de plazo en los últimos 90 días	17.0 %	16.8 %	-0.1 pp
Absolver todas las consultas pendientes	17.0 %	17.0 %	+0.0 pp

05 Evidencia documental

Asientos del cuaderno de obra digital y otros registros oficiales asociados a los factores que elevan el riesgo, del más reciente al más antiguo (hasta 12).

Asiento N.º 165 · Respuestas a consultas · SOEC_SPV · 31/08/2026

ESPUESTA DE CONSULTA RESPECTO A REDUCCION METRADOS EN PARTIDAS CONTRACTUALES: Visto la consulta formulada por el Ingeniero Residente mediante Asiento N.º 157, de fecha 27/08/2026, y la documentación presentada por el Contratista CONSORCIO VIAL D&E mediante CARTA N.º 037-2026-CVD&E/RC-DRP, de fecha 27/08/2026, con recepción por parte de la Supervisión el 28/08/2026, respecto a la consulta sobre la no necesidad de ejec...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 159 · Ampliaciones de plazo · SOEC_RESI · 27/08/2026

...ario de paralización (24 y 25 de agosto de 2026), causal comprendida en el literal a) del numeral 198.1 del artículo 198 del reglamento de la ley n 32069, aprobado por decreto supremo n 009-2025-ef ('atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista'). conforme al numeral 200.1 del artículo 200 del reglamento, el contratista presentara, de corresponder, la solicitud de ampliación de pl...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 156 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 26/08/2026

circunstancias de atrasos y/o paralizaciones por precipitaciones pluviales . esta supervisión deja constancia de que, durante los días 24 y 25 de agosto de 2026, las condiciones climatológicas en la jurisdicción del distrit...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 155 · Ampliaciones de plazo · SOEC_RESI · 25/08/2026

...os ya adquiridos. la presente causal se mantiene dentro de los alcances del literal a) del numeral 198.1 del artículo 198 del reglamento de la ley n 32069, aprobado por decreto supremo n 009-2025-ef ('atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista'), acumulándose a la fecha dos (02) días de paralización. se solicita a la supervisión de obra tomar conocimiento del presente asiento y e...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 153 · Ampliaciones de plazo · SOEC_RESI · 24/08/2026

...7:30 am del 24/08/2026, causal que se encuentra dentro de los alcances del literal a) del numeral 198.1 del artículo 198 del reglamento de la ley n 32069, aprobado por decreto supremo n 009 2025 ef ('atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista'). se solicita a la supervisión de obra tomar conocimiento del presente asiento y emitir su pronunciamiento conforme a sus atribuciones.

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 114 · Órdenes · SOEC_SPV · 31/07/2026

PRONUNCIAMIENTO DE LA SUPERVISIÓN RESPECTO AL ASIENTO N°108 DEL RESIDENTE DE OBRA: Respecto al Asiento N° 108 del Cuaderno de Obra, de fecha 29/07/2026, mediante el cual el ingeniero residente solicita pronunciamiento y autorización para ejecutar la losa superior de la cuneta en forma de rampa, en el sector correspondiente al ingreso y salida de vehículos al grifo, esta Supervisión deja constancia de haber revisado e...

Fuente: cod-asientos202607.csv

Asiento N.º 96 · Órdenes · SOEC_SPV · 23/07/2026

PRONUNCIAMIENTO DE LA SUPERVISIÓN RESPECTO AL ASIENTO N°93 DEL RESIDENTE DE OBRA: Respecto al Asiento N.º 93 del Cuaderno de Obra, de fecha 22/07/2026, mediante el cual el Ingeniero Residente comunica que durante los trabajos de excavación realizados en el ancho del pavimento flexible existente se verificó la presencia de un mejoramiento conformado por roca o piedra base, indicando que dicha condición permitiría pres...

Fuente: cod-asientos202607.csv

Asiento N.º 97 · Órdenes · SOEC_SPV · 23/07/2026

PRONUNCIAMIENTO DE LA SUPERVISIÓN RESPECTO A LA SOLICITUD DEL GRIFO UNIVERSAL SOBRE ACCESOS VEHICULARES: Esta Supervisión deja constancia que, mediante CARTA MÚLTIPLE N.º 051-2026-GDTI/MDNC, de fecha 14/07/2026, la Municipalidad Distrital de Nueva Cajamarca remitió la solicitud presentada por el establecimiento privado Grifo Universal, ubicado en la Manzana 23, mediante la cual el propietario solicita que se respeten...

Fuente: cod-asientos202607.csv

- Asiento N.º 77 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 10/07/2026**

VERIFICACION DE TRABAJOS EJECUTADOS: El supervisor deja constancia que el día de hoy 10/07/2026, verificó el inicio de las actividades con la correspondiente realización de las charlas de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) dirigidas al personal de obra. Continúan los trabajos correspondientes a la partida 01.05.01 Señalización de Desvío de Tránsito en Período de Construcción. Así mismo se deja constancia que el con...

Fuente: cod-asientos202607.csv
- Asiento N.º 73 · Adelantos · SOEC_SPV · 09/07/2026**

comunicacion sobre incumplimiento en la entrega del adelanto para materiales e insumos y posible afectacion al plazo contractual . respecto al asiento n 70 del cuaderno de obra, de fecha 08/07/2026, suscrito por el residente d...

Fuente: cod-asientos202607.csv

06

Marco normativo, validez del modelo y lectura del informe

Evento que se anticipa: primer asiento del cuaderno de obra digital de tipo «Valorización acumulada ejecutada menor al 80 % del monto acumulado programado» o «Calendario acelerado de obra» (Reglamento de la Ley N.º 30225, D.S. N.º 344-2018-EF, art. 203; Reglamento de la Ley N.º 32069, D.S. N.º 009-2025-EF, art. 207).

Indicador (prueba temporal ciega)	Nacional	Arequipa
ROC-AUC	0.774	0.719
PR-AUC	0.158	0.216
Prevalencia del evento	0.050	0.091

Modelo atraso-H60-B_full-2026-08-31, entrenado con información hasta el 30/06/2026. Una PR-AUC mayor que la prevalencia indica que el modelo ordena las obras mejor que el azar.

CÓMO USAR ESTE INFORME

La probabilidad es una estimación para priorizar la supervisión, no una certeza ni una determinación de responsabilidades. Contraste siempre los factores y la evidencia con el expediente de la obra y con la información del supervisor o inspector antes de adoptar decisiones.
