


INFORME TÉCNICO DE ALERTA TEMPRANA

Riesgo de atraso formal en la ejecución de la obra

Ejecución de la obra: Mejoramiento del servicio de provisión de agua para riego en riego tecnificado de centro poblado huallhua distrito de pucacolpa de la provincia de huanta del departamento de ayacucho, con código único de inversiones N° 2605425.

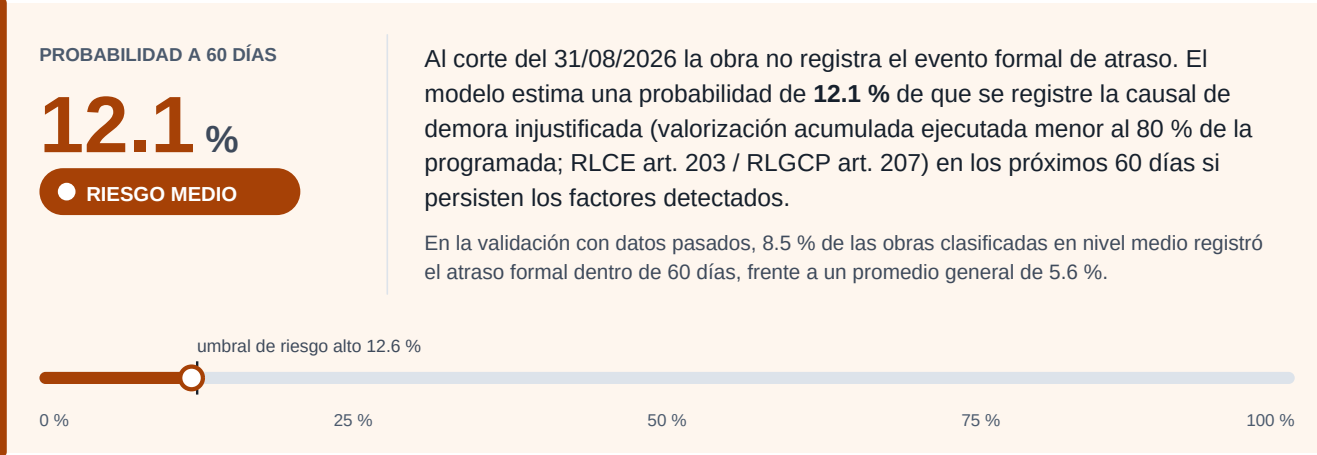


MONTO DEL CONTRATO	PLAZO ORIGINAL	ASIENTOS DEL CUADERNO	ÚLTIMO ASIENTO
No publicado	No publicado	137 desde 05/06/2026	28/08/2026

01 Identificación de la obra y del contrato

Denominación oficial	EJECUCIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO EN RIEGO TECNIFICADO DE CENTRO POBLADO HUALLHUA DISTRITO DE PUCACOLPA DE LA PROVINCIA DE HUANTA DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO, CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES N° 2605425.
Entidad contratante	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUCACOLPA
Contratista	CONSORCIO SACHABAMBA
Ubicación (distrito / provincia / departamento)	PUCACOLPA / HUANTA / AYACUCHO
Código Único de Inversión (CUI)	2605425
Inversión asociada	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO EN RIEGO TECNIFICADO DE CENTRO POBLADO HUALLHUA DISTRITO DE PUCACOLPA DE LA PROVINCIA DE HUANTA DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO
Función	AGROPECUARIA
Identificador del contrato (SEACE)	2369835
Monto del contrato	-
Monto aprobado de la inversión	S/ 3,618,084.67
Cuaderno de obra digital	137 asientos entre 05/06/2026 y 28/08/2026

02 Evolución del riesgo estimado a 60 días

Probabilidad estimada de atraso formal a 60 días

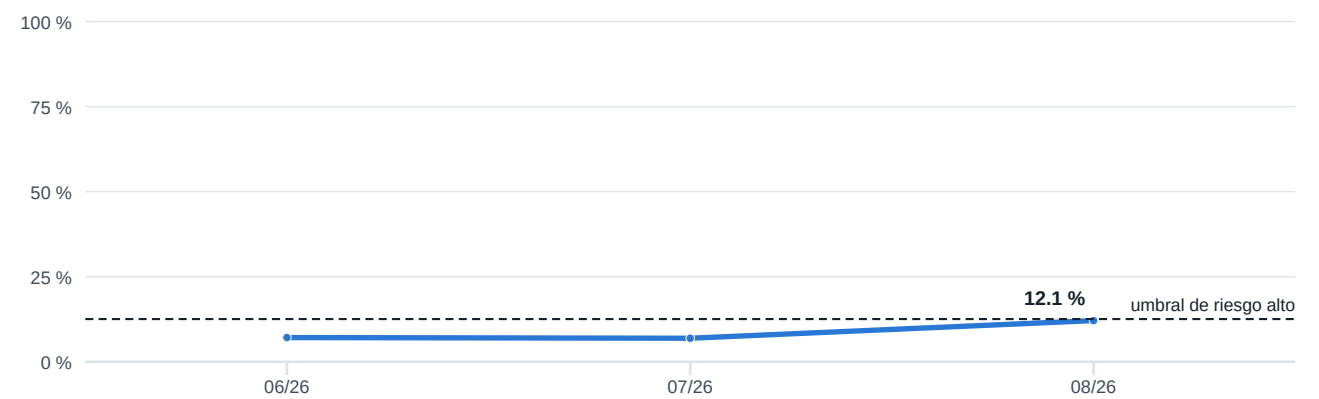

Estimaciones mensuales calculadas solo con la información disponible en cada fecha de corte (3 cortes, del 30/06/2026 al 31/08/2026), con reentrenamiento trimestral del modelo.

03 Factores que explican la estimación

Contribución de cada dato a la probabilidad (valores TreeSHAP en log-odds). Las barras hacia la derecha elevan el riesgo y las barras hacia la izquierda lo reducen, respecto del promedio de las obras.

Dato de la obra	Grupo	Reduce Eleva	Efecto
Índice de alerta por las palabras usadas en los asientos recientes: 0.53 (escala de 0 a 1)	Contenido de los asientos		+0.392
3 asientos de órdenes en los últimos 90 días	Actividad del cuaderno de obra		+0.128
El último asiento se registró hace 3 días	Actividad del cuaderno de obra		+0.102
Índice de alerta por el contenido de los asientos recientes: 0.57 (escala de 0 a 1)	Contenido de los asientos		+0.093
El 1 % de los asientos de los últimos 60 días menciona penalidades, incumplimientos o cartas notariales	Contenido de los asientos		+0.087
6 asientos de adicionales de obra en los últimos 90 días	Actividad del cuaderno de obra		+0.067
Extensión media de los asientos recientes: 1,315 caracteres	Contenido de los asientos		-0.064
El 9 % de los asientos de los últimos 60 días menciona observaciones de calidad	Contenido de los asientos		+0.047

04 Qué cambiaría la estimación (sensibilidad del modelo)

Recálculo de la probabilidad modificando una señal a la vez. Indica cuánto depende la estimación de cada señal; no es una estimación causal del efecto de una intervención real.

Escenario	Actual	Escenario	Cambio
Absolver todas las consultas pendientes	12.1 %	12.1 %	+0.0 pp
Registro activo del cuaderno (asiento reciente)	12.1 %	12.1 %	+0.0 pp

05 Evidencia documental

Asientos del cuaderno de obra digital y otros registros oficiales asociados a los factores que elevan el riesgo, del más reciente al más antiguo (hasta 12).

Asiento N.º 127 · Órdenes · SOEC_SPV · 20/08/2026

ORDENES PARA LA EJECUCION DE CAMARA DE ROMPEPRESION: RESPUESTA A LOS ASIENTOS N° 124 DEL RESIDENTE DE OBRA: La supervisión autoriza la ejecución de la CAMARA DE ROMPEPRESION TIPO I(3), II(12), III(4), IV(10), V(7), VI(9), VII(10) 02.10.03 y las siguientes partidas: 02.10.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 02.10.03.01 CONCRETO F'C=100 KG/CM2. PARA SOLADO Y/O SUB-BASES 02.10.03.02 CONCRETO F'C=140 KG/CM2 02.10.03.03 ENCOFRADO...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 129 · Órdenes · SOEC_SPV · 20/08/2026

ABSOLVER LAS OBSERVACIONES DE LA RED DE DISTRIBUCION: Hoy día la supervisión ha verificado trabajos de altimetría y planimetría de la red de distribución y ha encontrado observaciones, en el tramo de CRP 55 al CRP 56, donde se tiene los siguientes datos: Cota de Ingreso (CRP 55) 3,403.76 MSNM, Cota de salida (CRP 56) 3393.45 MSNM, longitud de la tubería 260ml, diámetro de la tubería 110mm y caudal 14.98lit/seg. Luego...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 104 · Órdenes · SOEC_SPV · 07/08/2026

SE COPNMINA VARIAS ACCIONES: Por medio del presente asiento, se conmina al Residente de Obra, para que pueda tomar acciones en toda el área de trabajo, según las siguientes órdenes y debe hacer el responsable de SSOMA.1.- En toda el área de trabajo, las zonas de barranco, deben tener caminos auxiliares o en caso contrario habilitar las barandas con su seguridad respectiva.2.- Las piedras, que son extraídos de la exca...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 104 · Órdenes · SOEC_SPV · 07/08/2026

...o del canal en construccion.3.- se debe colocar las senales preventivas, informativos e indicativos, epps, y otros, en toda el area de trabajo, segun la norma g.050. en caso contrario se aplicara las penalidades correspondientes.

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 58 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 09/07/2026

VERIFICACION DE ACTIVIDADES DE OBRA: SE INICIANDOSE LA JORNADA LABORAL CON LA CHARLA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. SE REALIZARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS DURANTE EL DÍA. SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE EXCAVACIÓN EN LA RED DE DISTRIBUCIÓN, DONDE SE ENCONTRARON ROCA FIJA Y ROCA SUELTASE REALIZÓ EL ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS PARA DETERMINAR LA CAPACIDAD PORTANTE DEL TERRENO DONDE SE UBICA EL RESERVORIO, SE REALIZ...

Fuente: cod-asientos202607.csv

Asiento N.º 54 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 07/07/2026

VERIFICACION DE ACTIVIDADES EN OBRA: SE PRESENTO VERIFICA LAS ACTIVIDADES DEL DIA, DANDO EL INICO CON LA CHARLA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y VERIFICADAS SON LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES QUE SE DETALLAN: EXCAVACION MANUAL EN LA LINEA DE DISTRIBUCION ENTRE LA PROGRESIVA 12+125 AL 15+555 DE ACUERDO AL ASIENTO N° 53 EL CONTRATISTA REALIZO LOS ENSAYOS DE DENSIDAD DE CAMPO UTILIZANDO EL METODO DE CONO DE ARENA, POR LO...

Fuente: cod-asientos202607.csv

06 Marco normativo, validez del modelo y lectura del informe

Evento que se anticipa: primer asiento del cuaderno de obra digital de tipo «Valorización acumulada ejecutada menor al 80 % del monto acumulado programado» o «Calendario acelerado de obra» (Reglamento de la Ley N.º 30225, D.S. N.º 344-2018-EF, art. 203; Reglamento de la Ley N.º 32069, D.S. N.º 009-2025-EF, art. 207).

Indicador (prueba temporal ciega)	Nacional	Arequipa
ROC-AUC	0.774	0.719
PR-AUC	0.158	0.216
Prevalencia del evento	0.050	0.091

Modelo atraso-H60-B_full-2026-08-31, entrenado con información hasta el 30/06/2026. Una PR-AUC mayor que la prevalencia indica que el modelo ordena las obras mejor que el azar.

CÓMO USAR ESTE INFORME

La probabilidad es una estimación para priorizar la supervisión, no una certeza ni una determinación de responsabilidades. Contraste siempre los factores y la evidencia con el expediente de la obra y con la información del supervisor o inspector antes de adoptar decisiones.
