


INFORME TÉCNICO DE ALERTA TEMPRANA

Riesgo de atraso formal en la ejecución de la obra

Contratación para la ejecución de la obra: Construcción de pozo de extracción, en el(la) sector 146 del distrito de Lurigancho, provincia Lima, departamento Lima, con CUI N° 2673754

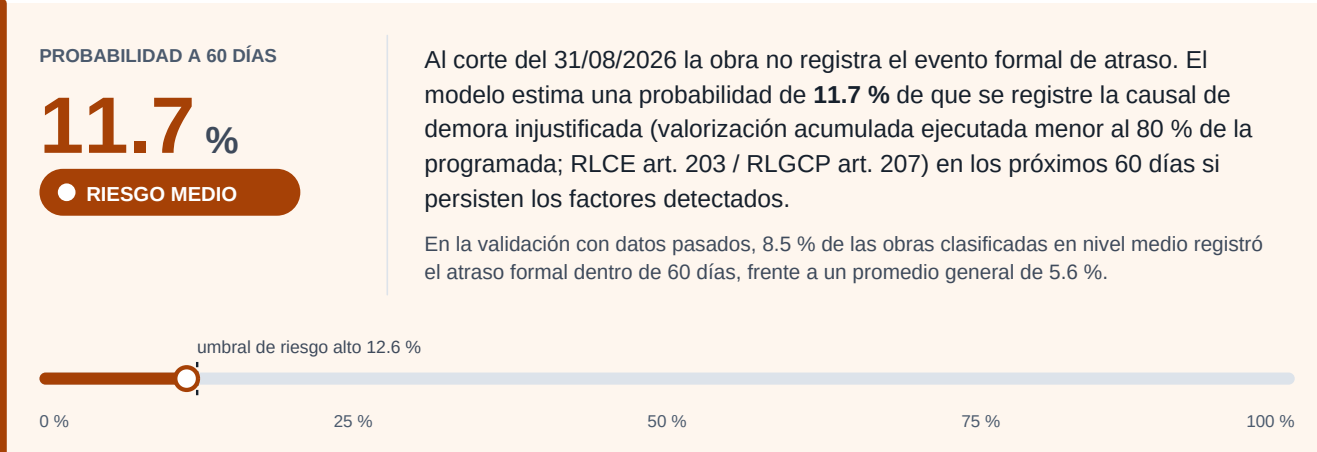


MONTO DEL CONTRATO	PLAZO ORIGINAL	ASIENTOS DEL CUADERNO	ÚLTIMO ASIENTO
No publicado	No publicado	39 desde 26/05/2026	31/08/2026

01 Identificación de la obra y del contrato

Denominación oficial	CONTRATACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE POZO DE EXTRACCION, EN EL(LA) SECTOR 146 DEL DISTRITO DE LURIGANCHO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA, CON CUI N° 2673754
Entidad contratante	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LURIGANCHO (CHOSICA)
Contratista	CONSORCIO NORTE
Ubicación (distrito / provincia / departamento)	LURIGANCHO / LIMA / LIMA
Código Único de Inversión (CUI)	2673754
Inversión asociada	CONSTRUCCION DE POZO DE EXTRACCION EN EL(LA) SECTOR 146 DEL DISTRITO DE LURIGANCHO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA
Función	SANEAMIENTO
Identificador del contrato (SEACE)	2391508
Monto del contrato	-
Monto aprobado de la inversión	S/ 2,986,481.89
Cuaderno de obra digital	39 asientos entre 26/05/2026 y 31/08/2026

02 Evolución del riesgo estimado a 60 días

Probabilidad estimada de atraso formal a 60 días

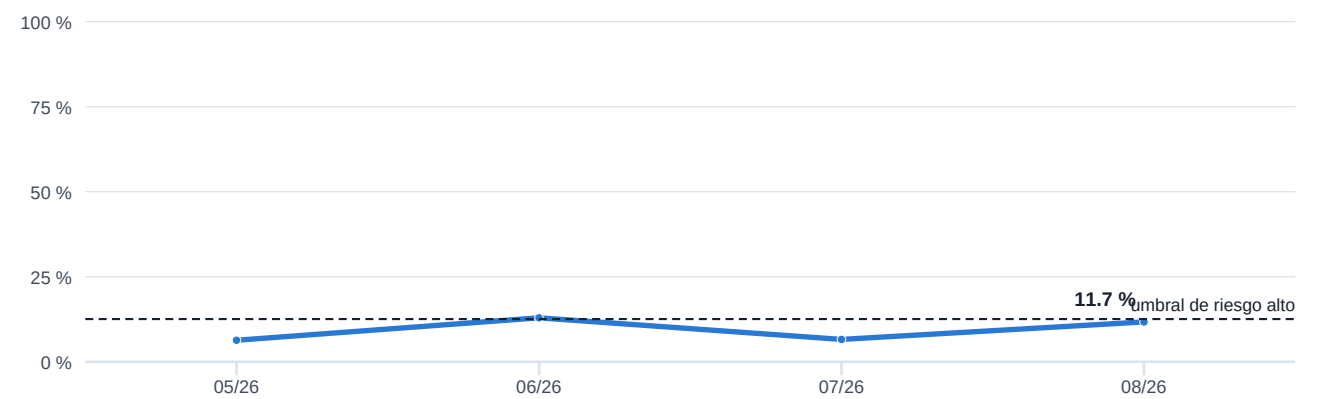

Estimaciones mensuales calculadas solo con la información disponible en cada fecha de corte (4 cortes, del 31/05/2026 al 31/08/2026), con reentrenamiento trimestral del modelo.

03 Factores que explican la estimación

Contribución de cada dato a la probabilidad (valores TreeSHAP en log-odds). Las barras hacia la derecha elevan el riesgo y las barras hacia la izquierda lo reducen, respecto del promedio de las obras.

Dato de la obra	Grupo	Reduce Eleva	Efecto
Índice de alerta por las palabras usadas en los asientos recientes: 0.66 (escala de 0 a 1)	Contenido de los asientos		+0.584
El 64 % de los asientos de los últimos 90 días fue registrado por la supervisión o inspección	Actividad del cuaderno de obra		+0.262
El 11 % de los asientos de los últimos 60 días menciona atraso, retraso o demora	Contenido de los asientos		+0.230
Hubo registros en el cuaderno 6 días del último mes	Actividad del cuaderno de obra		-0.157
Departamento: Lima	Características de la obra		+0.128
7 asientos registrados en los últimos 30 días	Actividad del cuaderno de obra		-0.109
Índice de alerta por el contenido de los asientos recientes: 0.65 (escala de 0 a 1)	Contenido de los asientos		+0.099
Hubo un asiento el mismo día del corte	Actividad del cuaderno de obra		+0.092

04 Qué cambiaría la estimación (sensibilidad del modelo)

Recálculo de la probabilidad modificando una señal a la vez. Indica cuánto depende la estimación de cada señal; no es una estimación causal del efecto de una intervención real.

Escenario	Actual	Escenario	Cambio
Absolver todas las consultas pendientes	11.7 %	11.7 %	+0.0 pp
Ejecución financiera al día (devengado en el último mes)	11.7 %	11.7 %	+0.0 pp

05

Evidencia documental

Asientos del cuaderno de obra digital y otros registros oficiales asociados a los factores que elevan el riesgo, del más reciente al más antiguo (hasta 12).

Asiento N.º 39 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 31/08/2026

VERIFICACIÓN DE SEGUROS Y DE PERSONAL CLAVE, Y FRENTE SIN ACTIVIDAD EN EL POZO PS-01: Siendo el día de hoy 31 de agosto de 2026, durante la visita de obra esta Supervisión deja constancia de lo siguiente:1) Se realizaron las verificaciones correspondientes respecto a los seguros(SCTR), presentados por la contratista encontrándose que el documento no tiene valides lo cual debe regularizar lo mas antes posible.(se ane...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 39 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 31/08/2026

... supervision efectuara el control del avance conforme al numeral 207.1 del articulo 207 del reglamento. de verificarse que la valorizacion acumulada ejecutada resulta menor al 80% de la programada, o atraso en la ruta critica, se ordenara la presentacion de un nuevo programa de ejecucion con aceleracion de trabajos.

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 34 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 24/08/2026

REQUERIMIENTO DE SOLICITUD DE INFORMACIÓN DE PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA Y VIGENCIA DE SEGUROS AL CONTRATISTA: En atención al reinicio de obra registrado en el Asiento N° 33, y conforme al artículo 202 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, esta Supervisión requiere al Contratista, a través de su Residente de Obra, la presentación de:1. PROGRAMACIÓN DE OBRA ACTUALIZADA, AJUSTADA A LAS...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 32 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 24/07/2026

PARA CONOCIMIENTO: El día de hoy la entidad vía correo electrónico notifico al contratista (CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA COARCA S.A.C.) y a la supervisión (CORDOVA FLOREZ GILMAR) la Carta 000431-2026-MDL/GDU-SGOPU, con asunto: NOTIFICACIÓN DE PRONUNCIAMIENTO A LA REVISION DEL EXPEDIENTE TECNICO, ASI COMO A LA CONSULTA DE OBRA N°01 Y N°02, REFERENTE A LA OBRA CON CUI 2673754, adjuntado los siguientes documentos:a. Info...

Fuente: cod-asientos202607.csv

06

Marco normativo, validez del modelo y lectura del informe

Evento que se anticipa: primer asiento del cuaderno de obra digital de tipo «Valorización acumulada ejecutada menor al 80 % del monto acumulado programado» o «Calendario acelerado de obra» (Reglamento de la Ley N.º 30225, D.S. N.º 344-2018-EF, art. 203; Reglamento de la Ley N.º 32069, D.S. N.º 009-2025-EF, art. 207).

Indicador (prueba temporal ciega)	Nacional	Arequipa
ROC-AUC	0.774	0.719
PR-AUC	0.158	0.216
Prevalencia del evento	0.050	0.091

Modelo atraso-H60-B_full-2026-08-31, entrenado con información hasta el 30/06/2026. Una PR-AUC mayor que la prevalencia indica que el modelo ordena las obras mejor que el azar.

CÓMO USAR ESTE INFORME

La probabilidad es una estimación para priorizar la supervisión, no una certeza ni una determinación de responsabilidades. Contraste siempre los factores y la evidencia con el expediente de la obra y con la información del supervisor o inspector antes de adoptar decisiones.
