


INFORME TÉCNICO DE ALERTA TEMPRANA

Riesgo de atraso formal en la ejecución de la obra

contratación para la ejecución de la obra: Remodelación de edificio público, en el (la) fondo nacional de desarrollo pesquero en la localidad lima, distrito de lima, provincia de lima, departamento lima con CUI N° 2427957

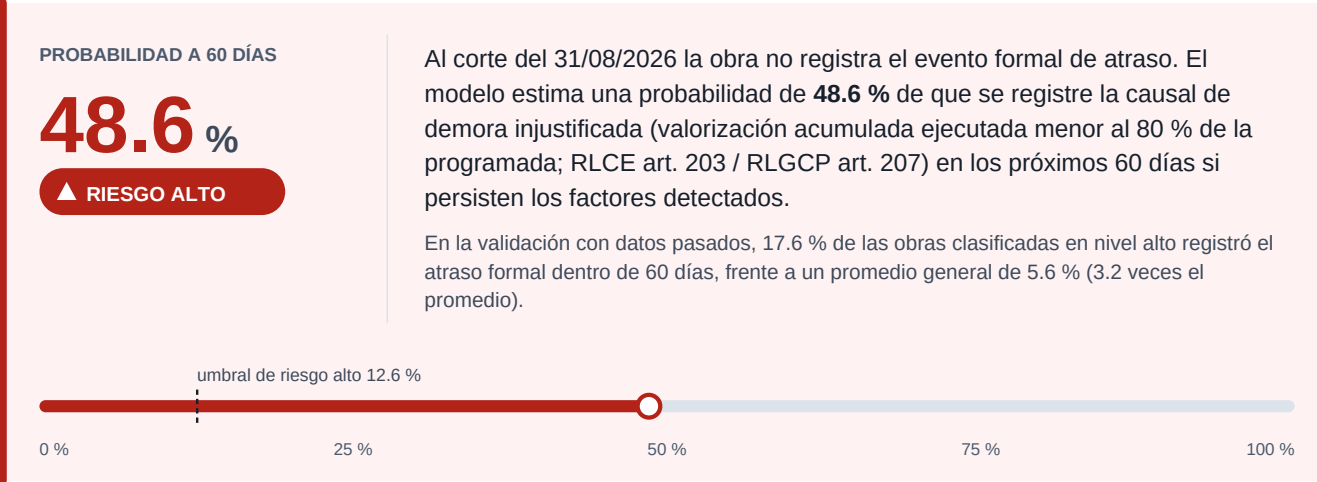


MONTO DEL CONTRATO	PLAZO ORIGINAL	ASIENTOS DEL CUADERNO	ÚLTIMO ASIENTO
No publicado	No publicado	44 desde 08/08/2026	31/08/2026

01 Identificación de la obra y del contrato

Denominación oficial	CONTRATACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: REMODELACIÓN DE EDIFICIO PÚBLICO, EN EL (LA) FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO EN LA LOCALIDAD LIMA, DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO LIMA con CUI N° 2427957
Entidad contratante	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
Contratista	CONSORCIO PUENTE LLANOS
Ubicación (distrito / provincia / departamento)	LIMA / LIMA / LIMA
Código Único de Inversión (CUI)	2427957
Inversión asociada	REMODELACIÓN DE EDIFICIO PÚBLICO EN EL(LA) FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO EN LA LOCALIDAD LIMA, DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA
Función	PESCA
Identificador del contrato (SEACE)	2410353
Monto del contrato	-
Monto aprobado de la inversión	S/ 950,000.00
Cuaderno de obra digital	44 asientos entre 08/08/2026 y 31/08/2026

02 Evolución del riesgo estimado a 60 días

Probabilidad estimada de atraso formal a 60 días

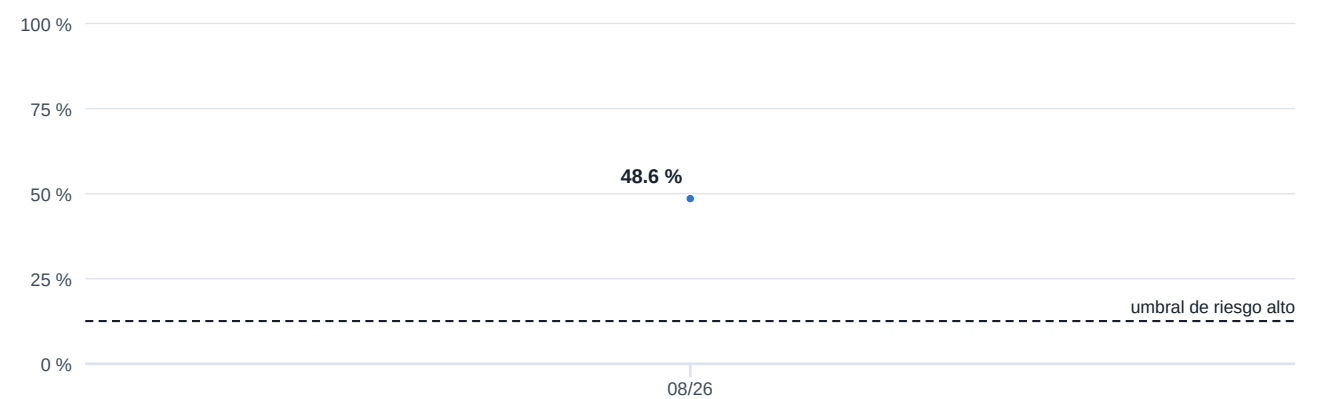

Estimaciones mensuales calculadas solo con la información disponible en cada fecha de corte (1 corte, del 31/08/2026 al 31/08/2026), con reentrenamiento trimestral del modelo.

03 Factores que explican la estimación

Contribución de cada dato a la probabilidad (valores TreeSHAP en log-odds). Las barras hacia la derecha elevan el riesgo y las barras hacia la izquierda lo reducen, respecto del promedio de las obras.

Dato de la obra	Grupo	Reduce Eleva	Efecto
Índice de alerta por las palabras usadas en los asientos recientes: 0.78 (escala de 0 a 1)	Contenido de los asientos		+0.771
El 9 % de los asientos de los últimos 60 días menciona atraso, retraso o demora	Contenido de los asientos		+0.233
El 9 % de los asientos de los últimos 60 días menciona penalidades, incumplimientos o cartas notariales	Contenido de los asientos		+0.232
Departamento: Lima	Características de la obra		+0.231
El 66 % de los asientos de los últimos 90 días fue registrado por la supervisión o inspección	Actividad del cuaderno de obra		+0.216
Entidad contratante: programa nacional	Características de la obra		+0.213
El 2 % de los asientos de los últimos 60 días menciona la regla del 80 % o un calendario acelerado	Contenido de los asientos		+0.128
El 7 % de los asientos de los últimos 60 días menciona falta o cambio de personal	Contenido de los asientos		+0.127

04 Evidencia documental

Asientos del cuaderno de obra digital y otros registros oficiales asociados a los factores que elevan el riesgo, del más reciente al más antiguo (hasta 12).

Asiento N.º 43 · Administración de riesgos · SOEC_SPV · 31/08/2026

observacion por atraso, insuficiencia de personal y deficiente organizacion de los trabajos . esta supervision deja constancia que el contratista consorcio ejecutor costa andina viene presentando atrasos injustificados re...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 37 · Órdenes · SOEC_SPV · 25/08/2026

...o y en el avance de los trabajos respecto de jornadas anteriores, sin embargo, los recursos actualmente dispuestos continúan siendo insuficientes para el ritmo de ejecución requerido, considerando el atraso advertido. asimismo, se verifica que los trabajos se desarrollan principalmente en horario regular.conforme al artículo 187, numerales 187.1 y 187.3 literal i), del reglamento de la ley n. 32069, co...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 34 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 25/08/2026

...spondientes serán proporcionados por el proveedor una vez realizada la compra. de verificarse que los materiales o equipos suministrados o instalados no correspondan a las fichas técnicas aprobadas o incumplan las especificaciones técnicas, esta supervisión procederá a su observación y/o rechazo, conforme a las atribuciones establecidas en el artículo 187.3 del reglamento de la ley n. 32069. finalmente, ...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 25 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 20/08/2026

INSUFICIENTE AVANCE Y REQUERIMIENTO DE INCREMENTO DE RECURSOS: La Supervisión deja constancia que el Contratista continúa ejecutando la partida de lijado y retiro de pintura existente en muros, actualmente en los dos (02) ambientes asignados para dicho frente de trabajo.Durante la inspección en campo, se evidencia una limitada cantidad de personal obrero asignado a la ejecución de esta partida, situación que viene ge...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 25 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 20/08/2026

...producción que resulten necesarias para incrementar los rendimientos y recuperar el avance.se exhorta al contratista a adoptar de manera inmediata las acciones correctivas necesarias para revertir el retraso evidenciado en campo, garantizando el cumplimiento de las metas programadas y del plazo contractual vigente.asimismo, se advierte que, de mantenerse el actual nivel de producción y verificarse retra...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 24 · Administración de riesgos · SOEC_SPV · 19/08/2026

CONSTANCIA SOBRE AUSENCIA DEL RESIDENTE DE OBRA Y PERSONAL CLAVE – REQUERIMIENTO DE PRONUNCIAMIENTO DEL CONTRATISTA-PARTE II: ---CONTINUA DEL ASIENTO ANTERIOR--Al respecto, el numeral 189.1 del artículo 189 del reglamento de la ley n.º 32069, ley general de contrataciones públicas, establece que es responsabilidad del contratista ejecutar su prestación con el personal considerado en su oferta durante el procedimiento...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 24 · Administración de riesgos · SOEC_SPV · 19/08/2026

...tablece que es responsabilidad del contratista ejecutar su prestación con el personal considerado en su oferta durante el procedimiento de selección. asimismo, las bases integradas, en el supuesto de penalidad n. 02, contemplan la ausencia injustificada del personal acreditado o sustituido cuando se produzca la ausencia injustificada de algún integrante del plantel técnico acreditado o debidamente sustitui...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 18 · Participación del personal clave · SOEC_SPV · 17/08/2026

ausencia e incumplimiento de participación del personal clave . la supervisión deja constancia que, desde el 14/08/2026 hasta la fecha, se ha verificado la ausencia en obra del residente, ing. miguel angel gutierrez sa...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 21 · Órdenes · SOEC_SPV · 17/08/2026

...mediante carta dirigida a la empresa supervisora torre verde proyectos e inversiones s.a.c., en un plazo máximo de un (01) día calendario, computado a partir del día siguiente del presente asiento.el incumplimiento del presente requerimiento será comunicado a la entidad para las acciones contractuales que correspondan.

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 20 · Constatación física de la obra · SOEC_SPV · 17/08/2026

...s.en consecuencia, la supervision deja constancia de la falta de continuidad de los trabajos en los ambientes ufe y digenipaa, pese a encontrarse puestos a disposicion del contratista, por lo que los atrasos derivados de la falta de personal, organizacion y continuidad de estos frentes seran de responsabilidad del contratista. se requiere adoptar de manera inmediata las medidas necesarias, incrementar ...

Fuente: cod-asientos202608.csv

05 Marco normativo, validez del modelo y lectura del informe

Evento que se anticipa: primer asiento del cuaderno de obra digital de tipo «Valorización acumulada ejecutada menor al 80 % del monto acumulado programado» o «Calendario acelerado de obra» (Reglamento de la Ley N.º 30225, D.S. N.º 344-2018-EF, art. 203; Reglamento de la Ley N.º 32069, D.S. N.º 009-2025-EF, art. 207).

Indicador (prueba temporal ciega)	Nacional	Arequipa
ROC-AUC	0.774	0.719
PR-AUC	0.158	0.216
Prevalencia del evento	0.050	0.091

Modelo atraso-H60-B_full-2026-08-31, entrenado con información hasta el 30/06/2026. Una PR-AUC mayor que la prevalencia indica que el modelo ordena las obras mejor que el azar.

CÓMO USAR ESTE INFORME

La probabilidad es una estimación para priorizar la supervisión, no una certeza ni una determinación de responsabilidades. Contraste siempre los factores y la evidencia con el expediente de la obra y con la información del supervisor o inspector antes de adoptar decisiones.
