


INFORME TÉCNICO DE ALERTA TEMPRANA

Riesgo de atraso formal en la ejecución de la obra

mejoramiento de los servicios deportivos y de recreacion law tenis, pedregal bajo, distrito de huaraz - provincia de huaraz - region ancash

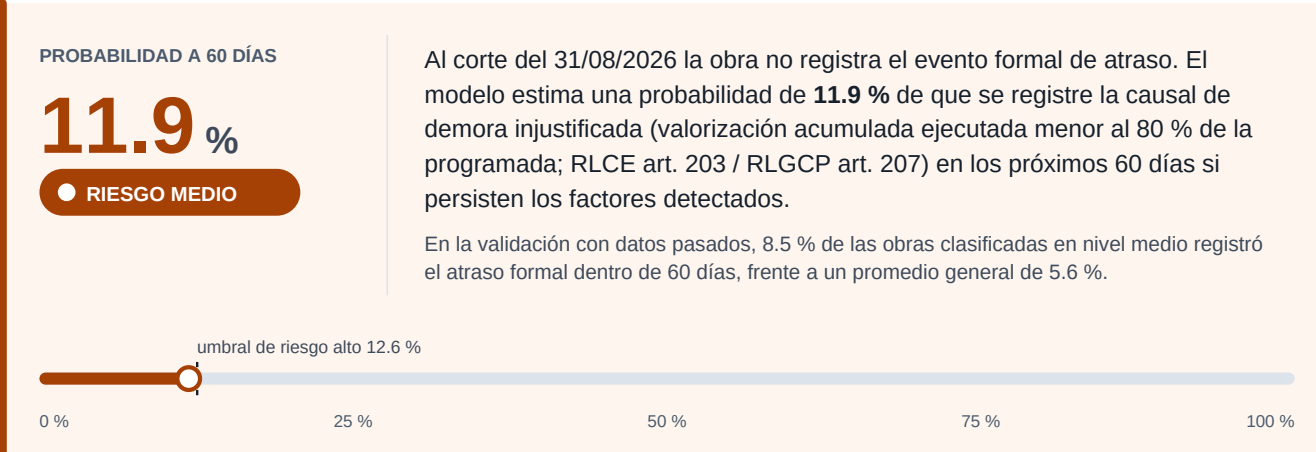


MONTO DEL CONTRATO	PLAZO ORIGINAL	ASIENTOS DEL CUADERNO	ÚLTIMO ASIENTO
No publicado	No publicado	110 desde 01/07/2026	31/08/2026

01 Identificación de la obra y del contrato

Denominación oficial	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS Y DE RECREACION LAW TENIS, PEDREGAL BAJO, DISTRITO DE HUARAZ - PROVINCIA DE HUARAZ - REGION ANCASH
Entidad contratante	GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - SEDE CENTRAL
Contratista	CONSORCIO UNIVERSITARIO
Ubicación (distrito / provincia / departamento)	HUARAZ / HUARAZ / ANCASH
Código Único de Inversión (CUI)	2400707
Inversión asociada	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS Y DE RECREACIÓN LAW TENIS, PEDREGAL BAJO, DISTRITO DE HUARAZ - PROVINCIA DE HUARAZ - REGIÓN ANCASH
Función	CULTURA Y DEPORTE
Identificador del contrato (SEACE)	2403127
Monto del contrato	-
Monto aprobado de la inversión	S/ 3,251,178.54
Cuaderno de obra digital	110 asientos entre 01/07/2026 y 31/08/2026

02 Evolución del riesgo estimado a 60 días

Probabilidad estimada de atraso formal a 60 días

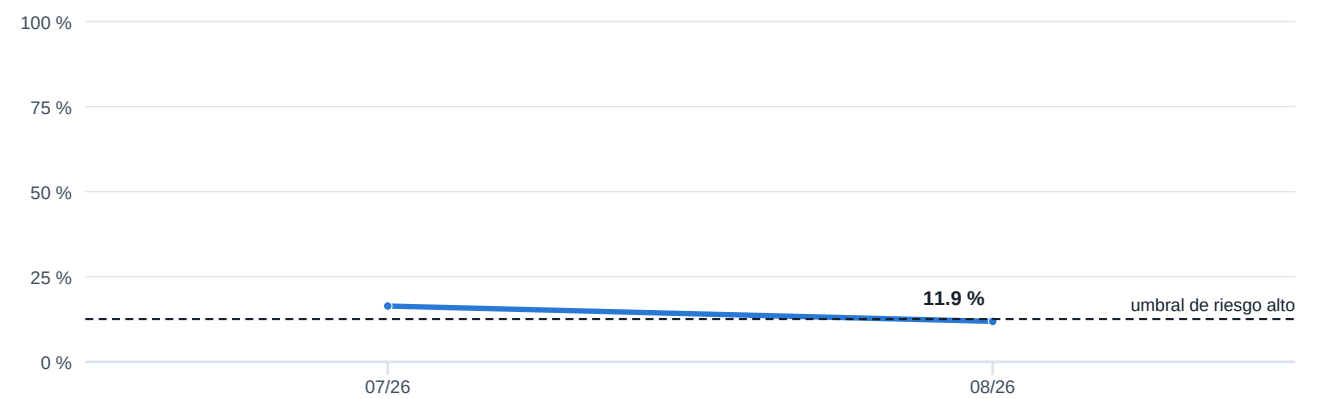

Estimaciones mensuales calculadas solo con la información disponible en cada fecha de corte (2 cortes, del 31/07/2026 al 31/08/2026), con reentrenamiento trimestral del modelo.

03 Factores que explican la estimación

Contribución de cada dato a la probabilidad (valores TreeSHAP en log-odds). Las barras hacia la derecha elevan el riesgo y las barras hacia la izquierda lo reducen, respecto del promedio de las obras.

Dato de la obra	Grupo	Reduce Eleva	Efecto
Índice de alerta por las palabras usadas en los asientos recientes: 0.63 (escala de 0 a 1)	Contenido de los asientos		+0.559
El 5 % de los asientos de los últimos 60 días menciona atraso, retraso o demora	Contenido de los asientos		+0.176
El 2 % de los asientos de los últimos 60 días menciona penalidades, incumplimientos o cartas notariales	Contenido de los asientos		+0.171
Hubo un asiento el mismo día del corte	Actividad del cuaderno de obra		+0.109
Hubo registros en el cuaderno 25 días del último mes	Actividad del cuaderno de obra		+0.105
Índice de alerta por el contenido de los asientos recientes: 0.58 (escala de 0 a 1)	Contenido de los asientos		+0.097
Departamento: Áncash	Características de la obra		-0.069
Extensión media de los asientos recientes: 948 caracteres	Contenido de los asientos		-0.069

04 Qué cambiaría la estimación (sensibilidad del modelo)

Recálculo de la probabilidad modificando una señal a la vez. Indica cuánto depende la estimación de cada señal; no es una estimación causal del efecto de una intervención real.

Escenario	Actual	Escenario	Cambio
Absolver todas las consultas pendientes	11.9 %	11.7 %	-0.2 pp
Sin nuevas ampliaciones de plazo en los últimos 90 días	11.9 %	11.9 %	+0.0 pp
Sin suspensiones del plazo en los últimos 90 días	11.9 %	12.2 %	+0.3 pp

05 Evidencia documental

Asientos del cuaderno de obra digital y otros registros oficiales asociados a los factores que elevan el riesgo, del más reciente al más antiguo (hasta 12).

Asiento N.º 45 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 30/07/2026

SUPERVISION DE TRABAJOS DIARIOS: SE INICIO LAS LABORES CON LAS CHARLAS DE SEGURIDAD POR PARTE DEL CONTRATISTA EN COORDINACION CON EL ESPECIALISTA DE SEGURIDAD DE LA SUPERVISION, ASI TAMBIEN SE REALIZO LOS TRABAJOS DE REPLANTEO DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, ASI TAMBIEN LOS TRABAJO DE DEMOLICIÓN DE CIMIENTO DE CONCRETO, SE INFORMA AL CONTRATISTA QUE SE REVISARA LA DOCUMENTACION PRESENTADA A FINES QUE SE PUEDA INGRE...

Fuente: cod-asientos202607.csv

Asiento N.º 36 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 22/07/2026

...estar la alcantarilla dentro de la cimentacion del muro de contencion, realizar la evaluacion con su especialista en estrucluras a fines que se puedan realizar la mejor solucion opcion a fines que no retrase los trabajo del muro de contencion proyectado

Fuente: cod-asientos202607.csv

Asiento N.º 36 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 22/07/2026

SUPERVISION DE TRABAJOS DIARIOS: EL DIA DE HOY SE SE INICIA LAS LABORES CON LAS CHARLAS DE SEGURIDAD POR PARTE DEL CONTRATISTA EN COORDINACION CON EL ESPECIALISTA DE SEGURIDAD DE LA SUPERVISION, ASI TAMBIEN SE REALIZARON LOS TRABAJOS DE DEMOLICIÓN DE VEREDAS DE CONCRETO EXISTENTES, ASI TAMBIEN SE REALIZO LA DEMOLICIÓN DE MURO DE CIMENTACIÓN DE CERCO PERIMÉTRICO EXISTENTE, ASI TAMBIEN LA DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO...

Fuente: cod-asientos202607.csv

Asiento N.º 16 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 11/07/2026

...os trabajos del item 01.03 demoliciones y desmontajes por la falta de permisos del plan de monitoreo arqueologico, se indica que el contratista mantiene un contrato con la entidad, sometido a diversas penalidades, es por ello que se recomienda al contratista tomar todas las acciones a fines que no se produzcan retrasos en el avance programado.

Fuente: cod-asientos202607.csv

Asiento N.º 16 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 11/07/2026

...co, se indica que el contratista mantiene un contrato con la entidad, sometido a diversas penalidades, es por ello que se recomienda al contratista tomar todas las acciones a fines que no se produzcan retrasos en el avance programado.

Fuente: cod-asientos202607.csv

Asiento N.º 14 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 11/07/2026

...contratista que se revisara la documentacion presentado a fines que se pueda dar tramite ante la entidadse recomienda al contratista hacer seguimiento a los permisos indicados a fines de no entrar en retrasos injustificados.

Fuente: cod-asientos202607.csv

Asiento N.º 16 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 11/07/2026

SUPERVISION DE TRABAJOS DIARIOS: RESPECTO AL ASIENTO DEL CONTRATISTA INDICA QUE HA LA FECHA NO PUEDE REALIZAR LOS TRABAJOS DEL ITEM 01.03 DEMOLICIONES Y DESMONTAJES POR LA FALTA DE PERMISOS DEL PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO, SE INDICA QUE EL CONTRATISTA MANTIENE UN CONTRATO CON LA ENTIDAD, SOMETIDO A DIVERSAS PENALIDADES, ES POR ELLO QUE SE RECOMIENDA AL CONTRATISTA TOMAR TODAS LAS ACCIONES A FINES QUE NO SE PRODUZC...

Fuente: cod-asientos202607.csv

06 Marco normativo, validez del modelo y lectura del informe

Evento que se anticipa: primer asiento del cuaderno de obra digital de tipo «Valorización acumulada ejecutada menor al 80 % del monto acumulado programado» o «Calendario acelerado de obra» (Reglamento de la Ley N.º 30225, D.S. N.º 344-2018-EF, art. 203; Reglamento de la Ley N.º 32069, D.S. N.º 009-2025-EF, art. 207).

Indicador (prueba temporal ciega)	Nacional	Arequipa
ROC-AUC	0.774	0.719
PR-AUC	0.158	0.216
Prevalencia del evento	0.050	0.091

Modelo atraso-H60-B_full-2026-08-31, entrenado con información hasta el 30/06/2026. Una PR-AUC mayor que la prevalencia indica que el modelo ordena las obras mejor que el azar.

CÓMO USAR ESTE INFORME

La probabilidad es una estimación para priorizar la supervisión, no una certeza ni una determinación de responsabilidades. Contraste siempre los factores y la evidencia con el expediente de la obra y con la información del supervisor o inspector antes de adoptar decisiones.
