


INFORME TÉCNICO DE ALERTA TEMPRANA

Riesgo de atraso formal en la ejecución de la obra

Mejoramiento del servicio educativo en la I.E. N 0764 de la localidad de huaja del distrito de san jose de sisa – provincia de el dorado – departamento de san martin", CUI 2475827.

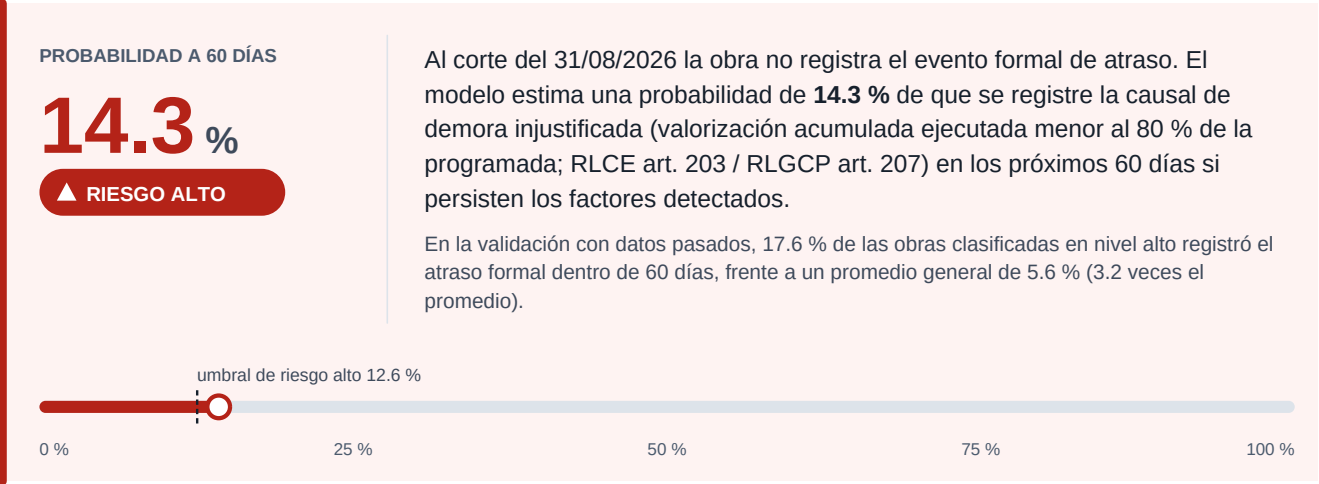


MONTO DEL CONTRATO	PLAZO ORIGINAL	ASIENTOS DEL CUADERNO	ÚLTIMO ASIENTO
No publicado	No publicado	94 desde 31/03/2026	31/08/2026

01 Identificación de la obra y del contrato

Denominación oficial	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. N 0764 DE LA LOCALIDAD DE HUAJA DEL DISTRITO DE SAN JOSE DE SISA – PROVINCIA DE EL DORADO – DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN", CUI 2475827.
Entidad contratante	GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN-SUB REGION BAJO MAYO-TARAPOTO
Contratista	CONSORCIO EJECUTOR MORROYACU
Ubicación (distrito / provincia / departamento)	SAN JOSE DE SISA / EL DORADO / SAN MARTIN
Código Único de Inversión (CUI)	2475827
Inversión asociada	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I. E. N° 0764 DE LA LOCALIDAD DE HUAJA DEL DISTRITO DE SAN JOSE DE SISA - PROVINCIA DE EL DORADO - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN
Función	EDUCACIÓN
Identificador del contrato (SEACE)	2367504
Monto del contrato	-
Monto aprobado de la inversión	S/ 7,431,317.17
Cuaderno de obra digital	94 asientos entre 31/03/2026 y 31/08/2026

02 Evolución del riesgo estimado a 60 días

Probabilidad estimada de atraso formal a 60 días

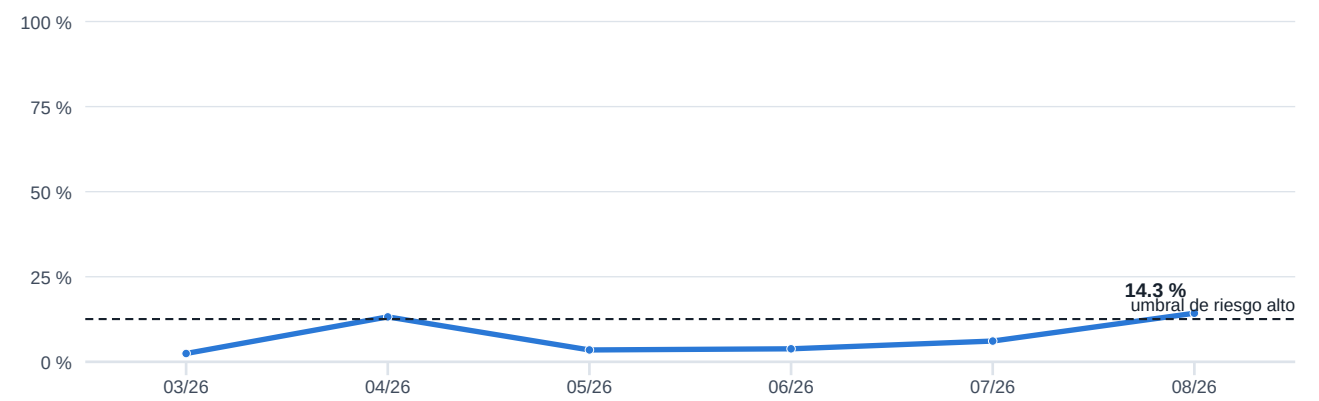

Estimaciones mensuales calculadas solo con la información disponible en cada fecha de corte (6 cortes, del 31/03/2026 al 31/08/2026), con reentrenamiento trimestral del modelo.

03 Factores que explican la estimación

Contribución de cada dato a la probabilidad (valores TreeSHAP en log-odds). Las barras hacia la derecha elevan el riesgo y las barras hacia la izquierda lo reducen, respecto del promedio de las obras.

Dato de la obra	Grupo	Reduce Eleva	Efecto
Índice de alerta por las palabras usadas en los asientos recientes: 0.56 (escala de 0 a 1)	Contenido de los asientos		+0.428
El 7 % de los asientos de los últimos 60 días menciona atraso, retraso o demora	Contenido de los asientos		+0.196
El 3 % de los asientos de los últimos 60 días menciona penalidades, incumplimientos o cartas notariales	Contenido de los asientos		+0.195
5 asientos de órdenes en los últimos 90 días	Actividad del cuaderno de obra		+0.144
Hubo un asiento el mismo día del corte	Actividad del cuaderno de obra		+0.122
Departamento: San Martín	Características de la obra		+0.085
Hubo registros en el cuaderno 19 días del último mes	Actividad del cuaderno de obra		+0.065
Extensión media de los asientos recientes: 1,103 caracteres	Contenido de los asientos		-0.063

04 Qué cambiaría la estimación (sensibilidad del modelo)

Recálculo de la probabilidad modificando una señal a la vez. Indica cuánto depende la estimación de cada señal; no es una estimación causal del efecto de una intervención real.

Escenario	Actual	Escenario	Cambio
Sin nuevas ampliaciones de plazo en los últimos 90 días	14.3 %	14.3 %	+0.0 pp
Absolver todas las consultas pendientes	14.3 %	14.4 %	+0.1 pp

05 Evidencia documental

Asientos del cuaderno de obra digital y otros registros oficiales asociados a los factores que elevan el riesgo, del más reciente al más antiguo (hasta 12).

Asiento N.º 80 · Otras ocurrencias · SOEC_RESI · 26/08/2026

...usal de ampliacion de plazo . el día de hoy se deja constancia que se reanudan las actividades en campo, culminando el evento de lo indicado y solicitado en el art. 198, inciso 198.1 literal a) por atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista, la causal de ampliacion de plazo.producto de las afectaciones de las precipitaciones pluviales se procedio a realizar la limpieza genera...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 78 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 25/08/2026

PRESENCIA DE PRECIPITACIONES PLUVIALES: En atención a lo señalado por el Residente de Obra en los asientos N° 76 y N° 77, respecto a la suspensión de actividades en campo como consecuencia de las precipitaciones pluviales registradas en la zona de trabajo, esta Supervisión deja constancia de haber verificado las condiciones existentes en obra y la afectación de los frentes correspondientes a las partidas 01.02.03.02....

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 77 · Ampliaciones de plazo · SOEC_RESI · 25/08/2026

...icita a la supervision la autorizacion para continuar dicho trabajos antes mencionados, partidas que se encuentra dentro de la ruta critica, incidiendo en el articulo 198, inciso 198.1 literal a) por atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista, por lo que es necesario una ampliacion de plazo para cumplir con la metas programadas en el cronograma de ejecucion de obra aprobado, co...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 76 · Ampliaciones de plazo · SOEC_RESI · 24/08/2026

...icita a la supervision la autorizacion para continuar dicho trabajos antes mencionados, partidas que se encuentra dentro de la ruta critica, incidiendo en el articulo 198, inciso 198.1 literal a) por atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista, por lo que es necesario una ampliacion de plazo para cumplir con la metas programadas en el cronograma de ejecucion de obra aprobado, in...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 69 · Órdenes · SOEC_SPV · 19/08/2026

REEMPLAZO DE DADOS DE CONCRETO Y LIMPIEZA DE REBABAS DE CONCRETO: Durante la inspección efectuada en obra, esta Supervisión ha verificado la colocación de dados de concreto utilizados como separadores para garantizar el recubrimiento del acero de refuerzo en las parrillas correspondientes a las Edificaciones N.º 03, 04, 05 y 06. Al respecto, SE ORDENA AL CONTRATISTA retirar y reemplazar aquellos dados de concreto que ...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 59 · Ampliaciones de plazo · SOEC_RESI · 11/08/2026

...cm2 para sobrecimientos armados, 01.02.03.06.01.03 acero f'y=4200 kg/cm2 para columnas, partidas que se encuentra dentro de la ruta critica, incidiendo en el articulo 198, inciso 198.1 literal a) por atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista, por lo que es necesario una ampliacion de plazo para cumplir con la metas programadas en el cronograma de ejecucion de obra aprobado, in...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 61 · Ampliaciones de plazo · SOEC_SPV · 11/08/2026

PRECIPITACIONES PLUVIALES: En atención a lo señalado por el Residente de Obra en el presente asiento, respecto a la suspensión de actividades en campo como consecuencia de las precipitaciones pluviales registradas en la zona de trabajo, esta Supervisión deja constancia de haber verificado las condiciones existentes en obra y la afectación de los frentes correspondientes a las partidas 01.02.03.02.03 Acero f'y=4200 kg...

Fuente: cod-asientos202608.csv

- Asiento N.º 57 · Órdenes · SOEC_SPV · 06/08/2026**

...eficada para el elemento estructural donde seran instalados, debiendo garantizar la conservacion del recubrimiento de diseno durante el proceso de colocacion, compactacion y vibrado del concreto.el incumplimiento de la presente disposicion sera materia de observacion por parte de la supervision y podra dar lugar a la paralizacion del vaciado del elemento estructural hasta la subsanacion correspondiente...

Fuente: cod-asientos202608.csv
- Asiento N.º 58 · Órdenes · SOEC_SPV · 06/08/2026**

...e manera que conserve sus propiedades fisicas y garantice una adecuada adherencia con el concreto.se otorga al contratista un plazo inmediato para la subsanacion de las observaciones formuladas, bajo apercibimiento de que la supervision no autorizara el izamiento de las armaduras de acero ni el vaciado del concreto en los elementos estructurales que no cumplan con las condiciones de calidad exigidas. se ...

Fuente: cod-asientos202608.csv
- Asiento N.º 58 · Órdenes · SOEC_SPV · 06/08/2026**

ARMADURAS DE ACERO DE REFUERZO EN AREA DE TRABAJO: Durante la inspección de obra, la Supervisión ha verificado que el apilamiento de las armaduras de acero de refuerzo encontradas en el área de trabajo no reúne las condiciones técnicas adecuadas para garantizar su conservación y posterior incorporación a la estructura, evidenciándose deficiencias en su acopio y protección.En consecuencia, SE REQUIERE AL CONTRATISTA a...

Fuente: cod-asientos202608.csv

06 Marco normativo, validez del modelo y lectura del informe

Evento que se anticipa: primer asiento del cuaderno de obra digital de tipo «Valorización acumulada ejecutada menor al 80 % del monto acumulado programado» o «Calendario acelerado de obra» (Reglamento de la Ley N.º 30225, D.S. N.º 344-2018-EF, art. 203; Reglamento de la Ley N.º 32069, D.S. N.º 009-2025-EF, art. 207).

Indicador (prueba temporal ciega)	Nacional	Arequipa
ROC-AUC	0.774	0.719
PR-AUC	0.158	0.216
Prevalencia del evento	0.050	0.091

Modelo atraso-H60-B_full-2026-08-31, entrenado con información hasta el 30/06/2026. Una PR-AUC mayor que la prevalencia indica que el modelo ordena las obras mejor que el azar.

CÓMO USAR ESTE INFORME

La probabilidad es una estimación para priorizar la supervisión, no una certeza ni una determinación de responsabilidades. Contraste siempre los factores y la evidencia con el expediente de la obra y con la información del supervisor o inspector antes de adoptar decisiones.
