


INFORME TÉCNICO DE ALERTA TEMPRANA

Riesgo de atraso formal en la ejecución de la obra

Mejoramiento y ampliacion del servicio de atención de salud básicos en hualatan de centro poblado hualatan distrito de chontali de la provincia de jaén del departamento de cajamarca

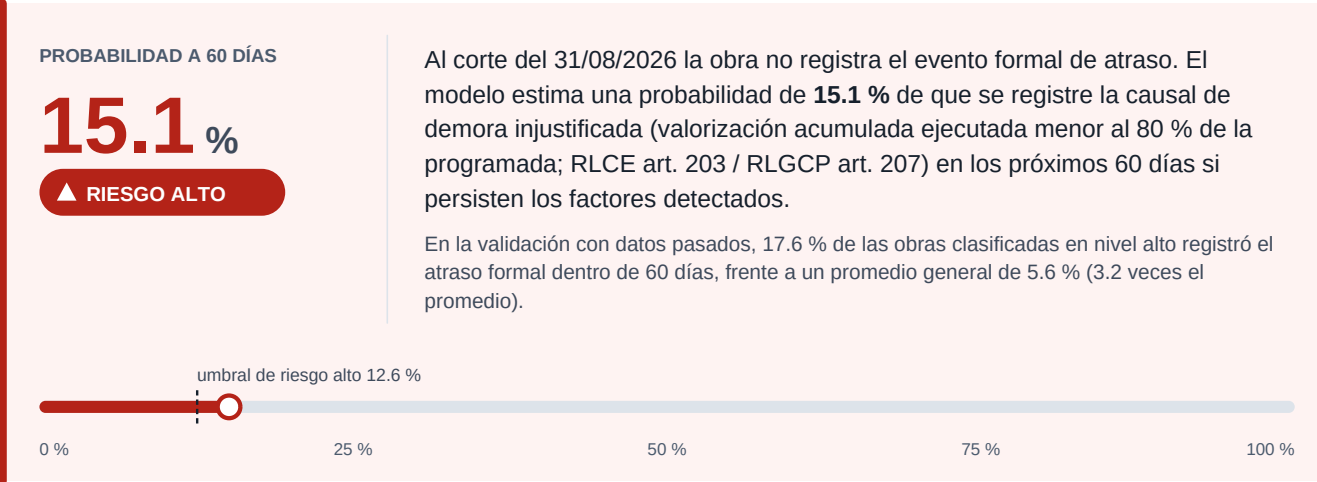


MONTO DEL CONTRATO	PLAZO ORIGINAL	ASIENTOS DEL CUADERNO	ÚLTIMO ASIENTO
S/ 9,741,277.11	240 días	195 desde 17/11/2025	31/08/2026

01 Identificación de la obra y del contrato

Denominación oficial	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ATENCIÓN DE SALUD BÁSICOS EN HUALATAN DE CENTRO POBLADO HUALATAN DISTRITO DE CHONTALI DE LA PROVINCIA DE JAÉN DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA
Entidad contratante	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHONTALI
Contratista	CONSORCIO EJECUTOR CUMBRE
Ubicación (distrito / provincia / departamento)	CHONTALI / JAEN / CAJAMARCA
Código Único de Inversión (CUI)	2692149
Inversión asociada	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ATENCIÓN DE SALUD BÁSICOS EN HUALATAN DE CENTRO POBLADO HUALATAN DISTRITO DE CHONTALI DE LA PROVINCIA DE JAEN DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA
Función	SALUD
Identificador del contrato (SEACE)	2359742
Monto del contrato	S/ 9,741,277.11
Monto aprobado de la inversión	S/ 10,270,369.19
Cuaderno de obra digital	195 asientos entre 17/11/2025 y 31/08/2026

02 Evolución del riesgo estimado a 60 días

Probabilidad estimada de atraso formal a 60 días

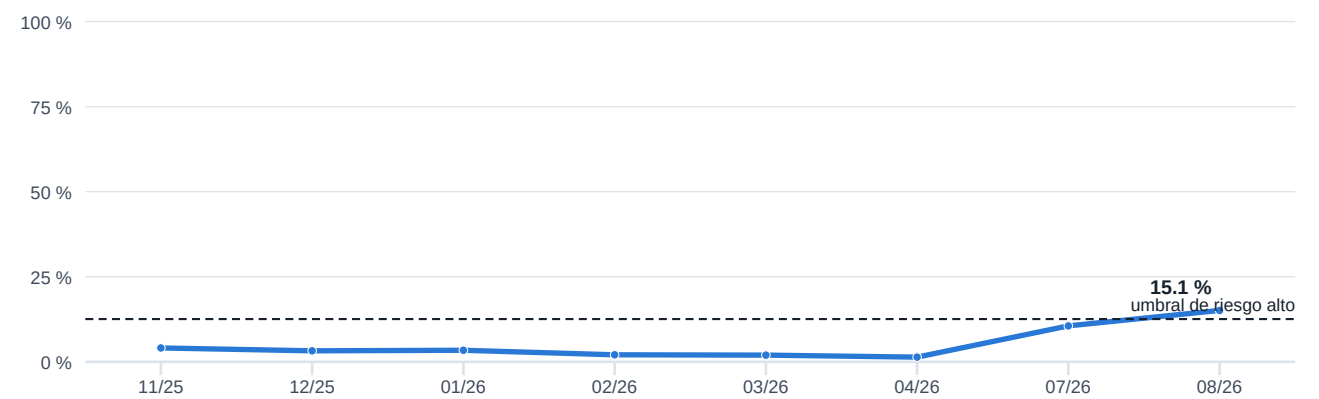

Estimaciones mensuales calculadas solo con la información disponible en cada fecha de corte (8 cortes, del 30/11/2025 al 31/08/2026), con reentrenamiento trimestral del modelo.

03 Factores que explican la estimación

Contribución de cada dato a la probabilidad (valores TreeSHAP en log-odds). Las barras hacia la derecha elevan el riesgo y las barras hacia la izquierda lo reducen, respecto del promedio de las obras.

Dato de la obra	Grupo	Reduce Eleva	Efecto
Índice de alerta por las palabras usadas en los asientos recientes: 0.64 (escala de 0 a 1)	Contenido de los asientos		+0.629
El 55 % de los asientos de los últimos 90 días fue registrado por la supervisión o inspección	Actividad del cuaderno de obra		+0.224
El 4 % de los asientos de los últimos 60 días menciona penalidades, incumplimientos o cartas notariales	Contenido de los asientos		+0.168
El 3 % de los asientos de los últimos 60 días menciona atraso, retraso o demora	Contenido de los asientos		+0.130
Hubo registros en el cuaderno 24 días del último mes	Actividad del cuaderno de obra		+0.119
Hubo un asiento el mismo día del corte	Actividad del cuaderno de obra		+0.112
El 15 % de los asientos de los últimos 60 días menciona observaciones de calidad	Contenido de los asientos		+0.066
56 asientos registrados en los últimos 30 días	Actividad del cuaderno de obra		+0.062

04 Qué cambiaría la estimación (sensibilidad del modelo)

Recálculo de la probabilidad modificando una señal a la vez. Indica cuánto depende la estimación de cada señal; no es una estimación causal del efecto de una intervención real.

Escenario	Actual	Escenario	Cambio
Absolver todas las consultas pendientes	15.1 %	15.1 %	+0.0 pp
Sin nuevas ampliaciones de plazo en los últimos 90 días	15.1 %	15.1 %	+0.0 pp
Ejecución financiera al día (devengado en el último mes)	15.1 %	15.1 %	+0.0 pp

05 Evidencia documental

Asientos del cuaderno de obra digital y otros registros oficiales asociados a los factores que elevan el riesgo, del más reciente al más antiguo (hasta 12).

Asiento N.º 165 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 15/08/2026

constancia de reiterado incumplimiento y falta de subsanación de observaciones al acero de cimentación . (...) continua del asiento anterior 164asimismo, conforme al artículo 177.2 del citado reglamento, el residente representa al ...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 166 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 15/08/2026

constancia de reiterado incumplimiento y falta de subsanación de observaciones al acero de cimentación . (...) continua del asiento anterior 165finalmente, se deja constancia que las condiciones observadas en campo y la continuidad...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 164 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 15/08/2026

constancia de reiterado incumplimiento y falta de subsanación de observaciones al acero de cimentación . (...) continua del asiento anterior 163asimismo, se deja constancia que la continuación de los trabajos observados, así como e...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 163 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 15/08/2026

constancia de reiterado incumplimiento y falta de subsanación de observaciones al acero de cimentación . se deja expresa constancia que, pese a las observaciones y requerimientos efectuados previamente por esta supervisión, tanto e...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 162 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 14/08/2026

SE REITERA AL CONTRATISTA CORREGIR OBSERVACIONES: (...) CONTINUA DEL ASIENTO ANTERIOR N°161Finalmente, respecto al argumento manifestado en campo por el equipo técnico del Contratista, referido a que la colocación del acero longitudinal inferior de la viga de cimentación por debajo de la malla inferior de la zapata, conforme se encuentra establecido en el detalle estructural aprobado, genera mayor tiempo de ejecución y...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 162 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 14/08/2026

...te tecnico. evidenciandose que la razon real que el contratista esta dando para cambiar el detalle no es un calculo estructural, una incompatibilidad de planos ni una deficiencia del diseno, sino que demora y reduce la productividad del personal.por tanto, se reitera al contratista que debera ejecutar la totalidad de las armaduras de la cimentacion conforme a los planos y detalles estructurales aprobado...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 129 · Ampliaciones de plazo · SOEC_RESI · 28/07/2026

...a puede solicitar la ampliación de plazo pactado por cualquiera de las siguientes causales, siempre que modifiquen la ruta crítica del programa de ejecución vigente al momento de la solicitud: a) por atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista. y el artículo 200. procedimiento de ampliación de plazo en obras bajo los sistemas de entrega de solo construcción y diseño y construcción...

Fuente: cod-asientos202607.csv

Asiento N.º 122 · Ampliaciones de plazo · SOEC_RESI · 24/07/2026

... puede solicitar la ampliación de plazo pactado por cualquiera de las siguientes causales, siempre que modifi queen la ruta crítica del programa de ejecución vigente al momento de la solicitud: a) por atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista. y el artículo 200. procedimiento de ampliación de plazo en obras bajo los sistemas de entrega de solo construcción y diseño y construcción...

Fuente: cod-asientos202607.csv

Asiento N.º 117 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 21/07/2026

CRONOGRAMAS Y CALENDARIOS A REINICIO DE OBRA Y PARTICIPACION DEL PERSONAL CLAVE Y NO CLAVE: SE VERIFICAN LOS TRABAJOS DE ACARREO DE MATERIAL DE HORMIGON PARA REALIZAR LA MEZCLA PARA LA EJECUCIÓN DE LA PARTIDA DE RELLENO MATERIAL DE PRESTAMO AFIRMADO, COMPACTADO AL 95% DEL P.M. SE VERIFICA LA EJECUCIÓN DE TRABAJOS DE MURO DE LADRILLO KK DE ARCILLA (A MAQUINA) DE SOGA, MEZCLA 1:4, EN CERCO PERIMETRICO, DEL LADO C-C. CO...

Fuente: cod-asientos202607.csv

06

Marco normativo, validez del modelo y lectura del informe

Evento que se anticipa: primer asiento del cuaderno de obra digital de tipo «Valorización acumulada ejecutada menor al 80 % del monto acumulado programado» o «Calendario acelerado de obra» (Reglamento de la Ley N.º 30225, D.S. N.º 344-2018-EF, art. 203; Reglamento de la Ley N.º 32069, D.S. N.º 009-2025-EF, art. 207).

Indicador (prueba temporal ciega)	Nacional	Arequipa
ROC-AUC	0.774	0.719
PR-AUC	0.158	0.216
Prevalencia del evento	0.050	0.091

Modelo atraso-H60-B_full-2026-08-31, entrenado con información hasta el 30/06/2026. Una PR-AUC mayor que la prevalencia indica que el modelo ordena las obras mejor que el azar.

CÓMO USAR ESTE INFORME

La probabilidad es una estimación para priorizar la supervisión, no una certeza ni una determinación de responsabilidades. Contraste siempre los factores y la evidencia con el expediente de la obra y con la información del supervisor o inspector antes de adoptar decisiones.
