


INFORME TÉCNICO DE ALERTA TEMPRANA

Riesgo de atraso formal en la ejecución de la obra

Ejecucion del proyecto mejoramiento de la capacidad resolutive del centro de salud fernando carbajal segura el bosque distrito de la victoria provincia de chiclayo departamento de lambayeque con CUI n 2562034

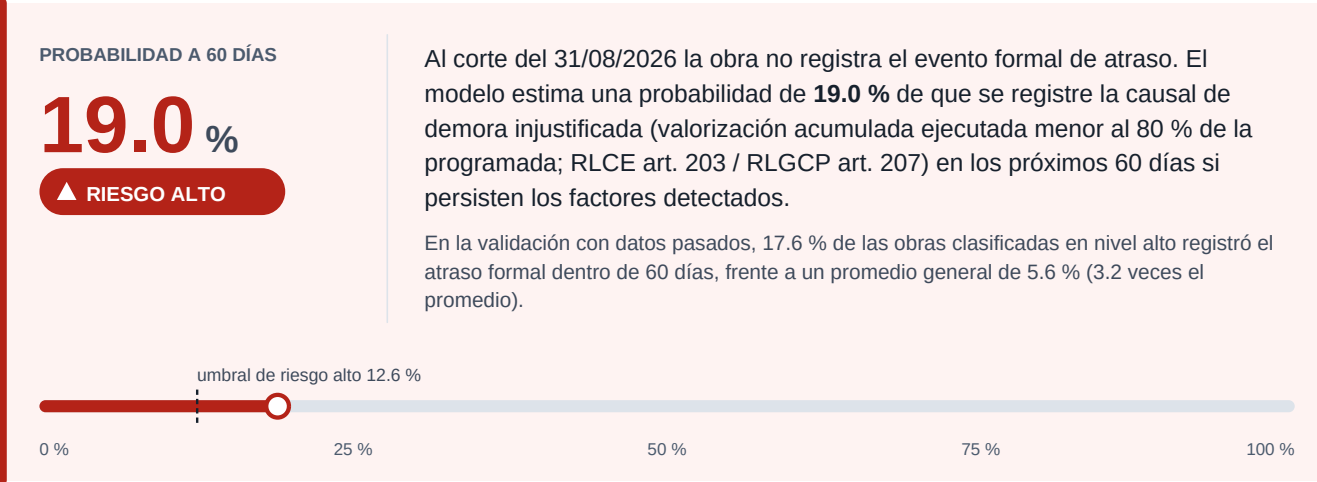


|                    |                |                         |                |
|--------------------|----------------|-------------------------|----------------|
| MONTO DEL CONTRATO | PLAZO ORIGINAL | ASIENTOS DEL CUADERNO   | ÚLTIMO ASIENTO |
| S/ 42,353,173.36   | 360 días       | 408<br>desde 11/03/2026 | 31/08/2026     |

01 Identificación de la obra y del contrato

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Denominación oficial                            | EJECUCION DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL CENTRO DE SALUD FERNANDO CARBAJAL SEGURA EL BOSQUE DISTRITO DE LA VICTORIA PROVINCIA DE CHICLAYO DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE CON CUI N 2562034 |
| Entidad contratante                             | UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD                                                                                                                                                   |
| Contratista                                     | CONSORCIO CONSTRUCTOR ACEISAC & IDASA                                                                                                                                                                            |
| Ubicación (distrito / provincia / departamento) | LA VICTORIA / CHICLAYO / LAMBAYEQUE                                                                                                                                                                              |
| Código Único de Inversión (CUI)                 | 2562034                                                                                                                                                                                                          |
| Inversión asociada                              | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD FERNANDO CARBAJAL SEGURA ¿ EL BOSQUE DISTRITO DE LA VICTORIA - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE          |
| Función                                         | SALUD                                                                                                                                                                                                            |
| Identificador del contrato (SEACE)              | 2358300                                                                                                                                                                                                          |
| Monto del contrato                              | S/ 42,353,173.36                                                                                                                                                                                                 |
| Monto aprobado de la inversión                  | S/ 68,225,928.77                                                                                                                                                                                                 |
| Cuaderno de obra digital                        | 408 asientos entre 11/03/2026 y 31/08/2026                                                                                                                                                                       |

## 02 Evolución del riesgo estimado a 60 días

Probabilidad estimada de atraso formal a 60 días

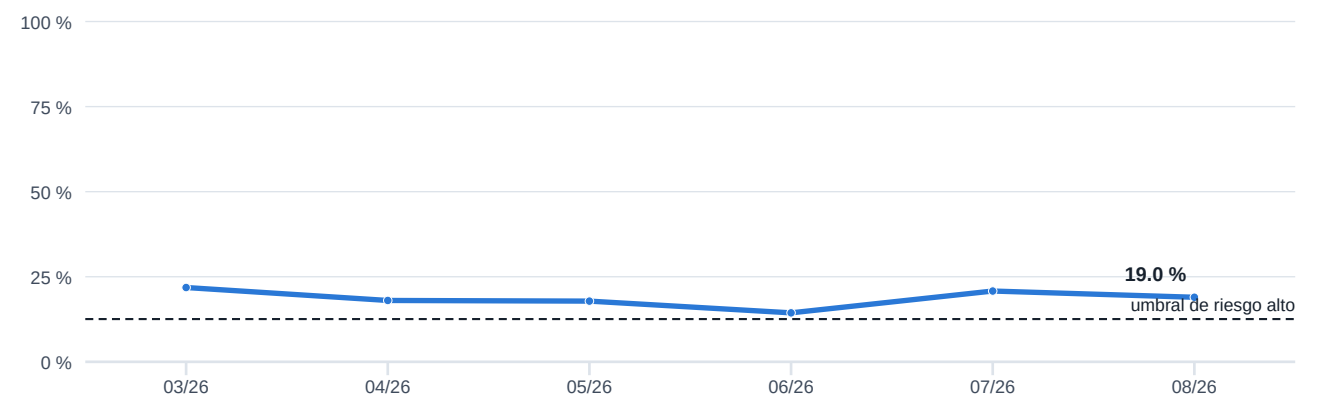

Estimaciones mensuales calculadas solo con la información disponible en cada fecha de corte (6 cortes, del 31/03/2026 al 31/08/2026), con reentrenamiento trimestral del modelo.

## 03 Factores que explican la estimación

Contribución de cada dato a la probabilidad (valores TreeSHAP en log-odds). Las barras hacia la derecha elevan el riesgo y las barras hacia la izquierda lo reducen, respecto del promedio de las obras.

| Dato de la obra                                                                                         | Grupo                          | Reduce   Eleva | Efecto |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|--------|
| Índice de alerta por las palabras usadas en los asientos recientes: 0.73 (escala de 0 a 1)              | Contenido de los asientos      | <div></div>    | +0.688 |
| El 38 % de los asientos de los últimos 60 días menciona atraso, retraso o demora                        | Contenido de los asientos      | <div></div>    | +0.226 |
| El 8 % de los asientos de los últimos 60 días menciona penalidades, incumplimientos o cartas notariales | Contenido de los asientos      | <div></div>    | +0.214 |
| Departamento: Lambayeque                                                                                | Características de la obra     | <div></div>    | +0.139 |
| Faltan 189 días para el fin del plazo original                                                          | Datos del contrato             | <div></div>    | -0.123 |
| 1 asiento de aplicación de penalidades desde el inicio del cuaderno                                     | Actividad del cuaderno de obra | <div></div>    | +0.110 |
| Hubo un asiento el mismo día del corte                                                                  | Actividad del cuaderno de obra | <div></div>    | +0.108 |
| Gasto devengado en los últimos 3 meses: S/ 10,439,121                                                   | Ejecución del gasto (SIAF)     | <div></div>    | -0.100 |

## 04 Qué cambiaría la estimación (sensibilidad del modelo)

Recálculo de la probabilidad modificando una señal a la vez. Indica cuánto depende la estimación de cada señal; no es una estimación causal del efecto de una intervención real.

| Escenario                                               | Actual | Escenario | Cambio  |
|---------------------------------------------------------|--------|-----------|---------|
| Sin aplicación de penalidades en los últimos 90 días    | 19.0 % | 16.2 %    | -2.8 pp |
| Sin nuevas ampliaciones de plazo en los últimos 90 días | 19.0 % | 18.7 %    | -0.2 pp |
| Absolver todas las consultas pendientes                 | 19.0 % | 19.3 %    | +0.3 pp |

## 05 Evidencia documental

Asientos del cuaderno de obra digital y otros registros oficiales asociados a los factores que elevan el riesgo, del más reciente al más antiguo (hasta 12).

### Asiento N.º 403 · Ampliaciones de plazo · SOEC\_RESI · 31/08/2026

...2. motivacion y sustento de la solicitud: causal: invocada al amparo del numeral 193.9 del articulo 193 y el literal a) del articulo 197 del reglamento de la ley de contrataciones del estado (rlce): "atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista", originada por la indefinicion tecnica en el expediente tecnico y la mora ininterrumpida de la entidad/proyectista en la absolucion de l...

Fuente: cod-asientos202608.csv

### Asiento N.º 407 · Respuestas a consultas · SOEC\_INSP · 31/08/2026

...rme a las capacidades y especificaciones establecidas en el expediente tecnico aprobado y a la vez vitar revisiones o calculos adicionales que no resulten tecnicamente necesarios, a fin de no generar retrasos ni afectar la ruta critica del proyecto.

Fuente: cod-asientos202608.csv

### Asiento N.º 397 · Ampliaciones de plazo · SOEC\_RESI · 27/08/2026

...definicion prolongada materializa el riesgo r-002: "errores, omisiones o deficiencias en el diseno que repercuten en el costo o la calidad de la infraestructura, nivel de servicio y/o puedan provocar retrasos en la ejecucion de la obra", estipulado y asignado en la matriz de asignacion de riesgos del contrato de obra n 42-2025-pronis. ...va...

Fuente: cod-asientos202608.csv

### Asiento N.º 396 · Ampliaciones de plazo · SOEC\_RESI · 27/08/2026

...sion del presente asiento, habiendo transcurrido el tiempo sin que la entidad o el proyectista hayan notificado la absolucion oficial de la consulta n 15, la circunstancia que origina la paralizacion/atraso no tiene fecha prevista de conclusion o termino. por tanto, al amparo del numeral 198.6 del articulo 198 del rlce, el contratista establece formalmente el dia de hoy, 27/08/2026, como un hito de cor...

Fuente: cod-asientos202608.csv

### Asiento N.º 393 · Adicionales · SOEC\_RESI · 26/08/2026

respuesta al asiento n 390 del inspector de obra observacion por incumplimiento normativo del procedimiento y plazos del art. 205 del rlce (n 205.2) respecto a la necesidad de la prestacion adicional de obra, advertencia de controversias y impacto en la ruta critica - par...

Fuente: cod-asientos202608.csv

### Asiento N.º 394 · Adicionales · SOEC\_RESI · 26/08/2026

respuesta al asiento n 390 del inspector de obra observacion por incumplimiento normativo del procedimiento y plazos del art. 205 del rlce (n 205.2) respecto a la necesidad de la prestacion adicional de obra, advertencia de controversias y impacto en la ruta critica - par...

Fuente: cod-asientos202608.csv

### Asiento N.º 382 · Otras ocurrencias · SOEC\_RESI · 22/08/2026

...inspeccion de obra con fecha 21/08/2026, el residente de obra que suscribe deja constancia formal y aclara lo siguiente respecto a la pretension de atribucion de responsabilidad por un supuestamente "incumplimiento a la asignacion de recursos previstos en el plan de trabajo del mes de agosto del 2026": 1. reorganizacion tecnica y operativa de recursos (secuenciacion de trabajos)se rechaza la pretension d...

Fuente: cod-asientos202608.csv

### Asiento N.º 383 · Otras ocurrencias · SOEC\_RESI · 22/08/2026

...odo mensual, la norma establece expresamente la presentacion de un plan de recuperacion / calendario acelerado de avance de obra (caao) a requerimiento de la entidad/supervision, mas no configura un incumplimiento o sancion extemporanea durante el transcurso del mes.4. plan de accion y recuperacion de avancepara tranquilidad de la entidad y la inspeccion:1. durante los dias que quedan del mes de agosto ...

Fuente: cod-asientos202608.csv

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Asiento N.º 372 · Respuestas a consultas · SOEC_INSP · 20/08/2026</b></p> <p>ATENCIÓN A SOLICITUD DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTA DE OBRA N.º 22. REQUERIMIENTO DE INFORME TÉCNICO DE SUSTENTO DE CONSULTA DE OBRA N.º 22.: EN ATENCIÓN A LA OCURRENCIA DE CUADERNO DE OBRA N.º 353 Y 354 DE SOLICITUD DE ABSOLUCIÓN DE LA CONSULTA DE OBRA N.º 22 REFERIDO A LA DETECCIÓN DE INCOMPATIBILIDADES E INSUFICIENCIA EN LOS DETALLES CONSTRUCTIVOS DE LOS DINTELES DE PUERTAS Y VENTANAS DEL BLOQUE I DE LA ESPECIALIDAD DE ES...</p> <p>Fuente: cod-asientos202608.csv</p> |
| <p><b>Asiento N.º 309 · Otras ocurrencias · SOEC_INSP · 24/07/2026</b></p> <p>ATENCIÓN A OCURRENCIAS DE ASIENTO DE CUADERNO DE OBRA N.º 034 Y N.º 305 REFERIDO A INICIO DE CAUSAL POR MORA DE LA ENTIDAD EN LA ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS N.º 04 Y N.º 16 Y AFECTACIÓN DE HITOS QUE PUEDEN TORNARSE CRÍTICOS: SE INDICA AL RESIDENTE TENER EN CUENTA QUE MEDIANTE ASIENTO DE CUADERNO DE OBRA N.º 267 SE DIO A CONOCER A EL CONTRATISTA MEDIANTE INFORME TÉCNICO N.º37-2026-MINSAPRONIS-UO-AVAD y CARTA N.º059-2026-JAOM/IO...</p> <p>Fuente: cod-asientos202607.csv</p>   |
| <p><b>Asiento N.º 263 · Consultas · SOEC_INSP · 08/07/2026</b></p> <p>ATENCIÓN A OCURRENCIAS DE ASIENTO DE CUADERNO DE OBRA N.º 253 REFERIDA A LA ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS DE CUADERNO DE OBRA N.º ,7,8 Y 9 E INICIO DE CAUSAL DE AMPLIACIÓN DE PLAZO(PARTE 1): ANTECEDENTES RESPECTO A LAS CONSULTAS DE OBRA N.º 7, 8 y 9 DADAS A CONOCER POR EL RESIDENTE MEDIANTE ASIENTO DE CUADERNO DE OBRA N.º 211 DEL 15/6/2026 DE LA ESPECIALIDAD DE ESTRUCTURAS, SE HACE DE CONOCIMIENTO QUE MEDIANTE ASIENTO DE CU...</p> <p>Fuente: cod-asientos202607.csv</p>                |
| <p><b>Asiento N.º 199 · Aplicación de penalidades · SOEC_INSP · 03/06/2026</b></p> <p>COMUNICA INCUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN DE PRESTACIÓN SIN EL PERSONAL CLAVE ACREDITADO: EL DÍA DE HOY MEDIANTE CARTA N.º043-2026-JAOM/IO/PRONIS E INFORME N.º 021-2026-JAOM/IO/PRONIS SE COMUNICA A EL CONTRATISTA EL INCUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN DE PRESTACIÓN SIN EL PERSONAL CLAVE ACREDITADO DONDE SE DETALLA EL CONTROL DE ASISTENCIA PRESENCIAL REALIZADO EN OBRA ENTRE EL 18 DE MAYO Y EL 03 DE JUNIO DE 2026.COMO RESULTADO DE ...</p> <p>Fuente: cod-asientos202606.csv</p> |

06 Marco normativo, validez del modelo y lectura del informe

Evento que se anticipa: primer asiento del cuaderno de obra digital de tipo «Valorización acumulada ejecutada menor al 80 % del monto acumulado programado» o «Calendario acelerado de obra» (Reglamento de la Ley N.º 30225, D.S. N.º 344-2018-EF, art. 203; Reglamento de la Ley N.º 32069, D.S. N.º 009-2025-EF, art. 207).

| Indicador (prueba temporal ciega) | Nacional | Arequipa |
|-----------------------------------|----------|----------|
| ROC-AUC                           | 0.774    | 0.719    |
| PR-AUC                            | 0.158    | 0.216    |
| Prevalencia del evento            | 0.050    | 0.091    |

Modelo atraso-H60-B\_full-2026-08-31, entrenado con información hasta el 30/06/2026. Una PR-AUC mayor que la prevalencia indica que el modelo ordena las obras mejor que el azar.

**CÓMO USAR ESTE INFORME**

La probabilidad es una estimación para priorizar la supervisión, no una certeza ni una determinación de responsabilidades. Contraste siempre los factores y la evidencia con el expediente de la obra y con la información del supervisor o inspector antes de adoptar decisiones.
