

INFORME TÉCNICO DE ALERTA TEMPRANA

Riesgo de atraso formal en la ejecución de la obra

Ejecución de la obra: Mejoramiento del camino vecinal EMP. PE-08A - san luis grande - KM. 15+200 (las paltas), distrito de san luis - provincia de san pablo - departamento de cajamarca


PROBABILIDAD A 60 DÍAS

15.3 %

▲ RIESGO ALTO

Al corte del 31/08/2026 la obra no registra el evento formal de atraso. El modelo estima una probabilidad de **15.3 %** de que se registre la causal de demora injustificada (valorización acumulada ejecutada menor al 80 % de la programada; RLCE art. 203 / RLGCP art. 207) en los próximos 60 días si persisten los factores detectados.

En la validación con datos pasados, 17.6 % de las obras clasificadas en nivel alto registró el atraso formal dentro de 60 días, frente a un promedio general de 5.6 % (3.2 veces el promedio).




MONTO DEL CONTRATO	PLAZO ORIGINAL	ASIENTOS DEL CUADERNO	ÚLTIMO ASIENTO
S/ 15,128,920.92	270 días	853 desde 18/08/2025	31/08/2026

01 Identificación de la obra y del contrato

Denominación oficial	EJECUCIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. PE-08A - SAN LUIS GRANDE - KM. 15+200 (LAS PALTAS), DISTRITO DE SAN LUIS - PROVINCIA DE SAN PABLO - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA
Entidad contratante	MTC-PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DESCENTRALIZADO - PROVIAS DESCENTRALIZADO
Contratista	CONSTRUCTORA ROKE E.I.R.L.
Ubicación (distrito / provincia / departamento)	SAN LUIS / SAN PABLO / CAJAMARCA
Código Único de Inversión (CUI)	2461684
Inversión asociada	MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. PE-08A - SAN LUIS GRANDE - KM. 15+200 (LAS PALTAS), DISTRITO DE SAN LUIS - PROVINCIA DE SAN PABLO - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA
Función	TRANSPORTE
Identificador del contrato (SEACE)	2339365
Monto del contrato	S/ 15,128,920.92
Monto aprobado de la inversión	S/ 10,744,034.99
Cuaderno de obra digital	853 asientos entre 18/08/2025 y 31/08/2026

02 Evolución del riesgo estimado a 60 días

Probabilidad estimada de atraso formal a 60 días

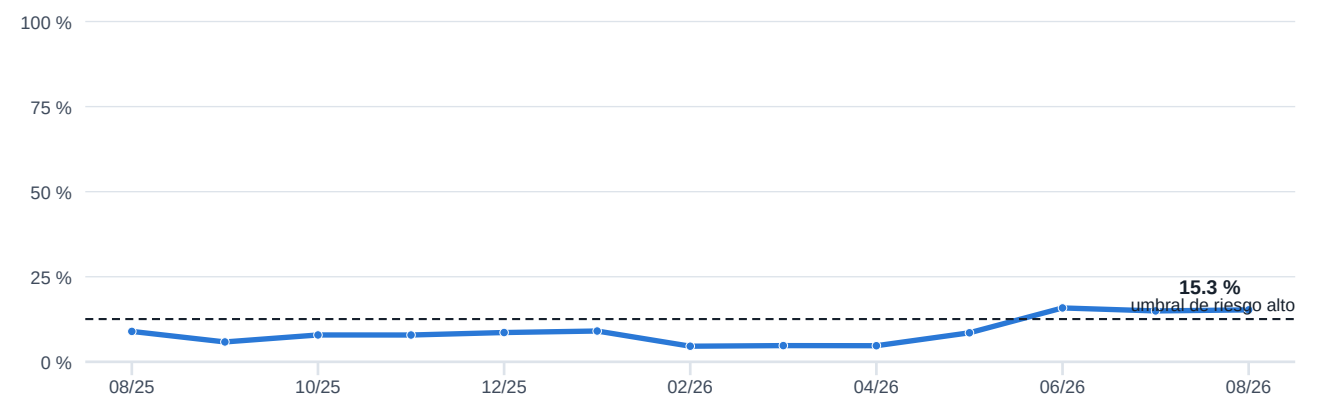

Estimaciones mensuales calculadas solo con la información disponible en cada fecha de corte (13 cortes, del 31/08/2025 al 31/08/2026), con reentrenamiento trimestral del modelo.

03 Factores que explican la estimación

Contribución de cada dato a la probabilidad (valores TreeSHAP en log-odds). Las barras hacia la derecha elevan el riesgo y las barras hacia la izquierda lo reducen, respecto del promedio de las obras.

Dato de la obra	Grupo	Reduce Eleva	Efecto
Índice de alerta por las palabras usadas en los asientos recientes: 0.56 (escala de 0 a 1)	Contenido de los asientos		+0.606
El 9 % de los asientos de los últimos 60 días menciona atraso, retraso o demora	Contenido de los asientos		+0.199
El 3 % de los asientos de los últimos 60 días menciona penalidades, incumplimientos o cartas notariales	Contenido de los asientos		+0.164
Hubo registros en el cuaderno 24 días del último mes	Actividad del cuaderno de obra		+0.125
Entidad contratante: otra entidad pública	Características de la obra		+0.123
Hubo un asiento el mismo día del corte	Actividad del cuaderno de obra		+0.119
17 asientos de suspensión del plazo desde el inicio del cuaderno	Actividad del cuaderno de obra		+0.109
Gasto devengado en los últimos 3 meses: S/ 2,167,080	Ejecución del gasto (SIAF)		-0.074

04 Qué cambiaría la estimación (sensibilidad del modelo)

Recálculo de la probabilidad modificando una señal a la vez. Indica cuánto depende la estimación de cada señal; no es una estimación causal del efecto de una intervención real.

Escenario	Actual	Escenario	Cambio
Sin nuevas ampliaciones de plazo en los últimos 90 días	15.3 %	15.3 %	+0.0 pp
Sin suspensiones del plazo en los últimos 90 días	15.3 %	15.7 %	+0.4 pp

05 Evidencia documental

Asientos del cuaderno de obra digital y otros registros oficiales asociados a los factores que elevan el riesgo, del más reciente al más antiguo (hasta 12).

Asiento N.º 832 · Otras ocurrencias · SOEC_RESI · 26/08/2026

...ruta critica. se advierte que este evento generara una afectacion directa a la fecha de termino de obra programada para el 09/09/2026, lo cual servira de sustento tecnico para el posterior tramite de atraso justificado y/o ampliacion de plazo una vez la entidad emita la absolucion correspondiente y se logre cuantificar el impacto real. se solicita a la supervision instar a la entidad a emitir respuesta...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 822 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 22/08/2026

...umidos, respetando las condiciones tecnicas y demas características previstas, verificandose su correcta ejecucion en campo. asimismo, la contratista debera adoptar las medidas necesarias para evitar retrasos y garantizar la continuidad de los trabajos, bajo responsabilidad. la supervision realizara el seguimiento y verificacion del cumplimiento de dichos acuerdos.

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 819 · Ampliaciones de plazo · SOEC_RESI · 21/08/2026

...nstructiva ineludible: la falta de definicion de la intervencion en los tramos en consulta por parte de la entidad restringe la culminacion de la partida "03.01 suelo estabilizado con cemento". dicho incumplimiento genero un efecto en cadena que impidio la ejecucion integral de las partidas "04 pavimento flexible" (04.01 imprimacion asfaltica y 04.02 mortero asfaltico), desplazando las actividades "08 se...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 810 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 18/08/2026

...pecificaciones tecnicas y cronograma de obra. en tal sentido, debera adoptar las medidas de abastecimiento y logistica correspondientes, evitando desabastecimientos que puedan generar paralizaciones, retrasos o afectaciones al normal desarrollo de los trabajos y al cumplimiento de los plazos contractuales.

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 807 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 17/08/2026

...on vigente y la programacion de los trabajos. asimismo, debera adoptar las medidas de gestion y logistica necesarias para evitar desabastecimientos que puedan generar paralizaciones, interferencias o retrasos en la ejecucion de las partidas, siendo responsabilidad de la contratista asegurar la continuidad de los trabajos conforme a los plazos contractuales establecidos.

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 800 · Ampliaciones de plazo · SOEC_SPV · 14/08/2026

RESPUESTA AL ASIENTO DE OBRA N°793, N°794, N°795 Y N°796 – INICIO DE CIRCUNSTANCIA QUE DETERMINA AMPLIACION DE PLAZO - IMPOSIBILIDAD DE EJECUTAR PARTIDA 05.01.03 "CUNETAS RECTANGULARES REVESTIDAS" Y AFECTACION DE LA RUTA CRITICA.: Esta Supervisión, luego de efectuar la evaluación técnica de la causal de ampliación de plazo anotada por el Residente de Obra, determina que la causal invocada no resulta procedente, al no evi...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 798 · Otras ocurrencias · SOEC_RESI · 13/08/2026

RESPUESTA AL ASIENTO N° 746 – PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN REQUERIDA Y REITERACIÓN DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTA N° 09: Mediante el presente asiento se deja constancia de la recepción de lo manifestado por la Supervisión en el Asiento N° 746. En estricta salvaguarda de los plazos de ejecución del proyecto y demostrando la debida diligencia proactiva, esta Residencia informa que ya ha cumplido con remitir la reformulación ...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 746 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 29/07/2026

RESPUESTA AL ASIENTO DE OBRA N°741 – INFORMACION COMPLEMENTARIA A CONSULTA N°9: Se deja constancia que, mediante Carta N.º 62-2026-CBVU/S, se remite el Informe del Especialista de Costos, Metrados y Valorizaciones de la Supervisión, quien emite pronunciamiento técnico respecto de los metrados presentados por la Contratista Constructora ROKE, en atención a la CARTA N.º 073-2026/C.R./T.G. De la revisión efectuada, se co...

Fuente: cod-asientos202607.csv

Asiento N.º 733 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 22/07/2026

...ecificaciones tecnicas del proyecto, a fin de garantizar la adecuada hidratacion del cemento, minimizar la aparicion de fisuras por contraccion y asegurar el desarrollo de la resistencia prevista. el incumplimiento de esta actividad puede comprometer el desempeno de la capa estabilizada y propiciar la aparicion de futuras fallas estructurales.

Fuente: cod-asientos202607.csv

06

Marco normativo, validez del modelo y lectura del informe

Evento que se anticipa: primer asiento del cuaderno de obra digital de tipo «Valorización acumulada ejecutada menor al 80 % del monto acumulado programado» o «Calendario acelerado de obra» (Reglamento de la Ley N.º 30225, D.S. N.º 344-2018-EF, art. 203; Reglamento de la Ley N.º 32069, D.S. N.º 009-2025-EF, art. 207).

Indicador (prueba temporal ciega)	Nacional	Arequipa
ROC-AUC	0.774	0.719
PR-AUC	0.158	0.216
Prevalencia del evento	0.050	0.091

Modelo atraso-H60-B_full-2026-08-31, entrenado con información hasta el 30/06/2026. Una PR-AUC mayor que la prevalencia indica que el modelo ordena las obras mejor que el azar.

CÓMO USAR ESTE INFORME

La probabilidad es una estimación para priorizar la supervisión, no una certeza ni una determinación de responsabilidades. Contraste siempre los factores y la evidencia con el expediente de la obra y con la información del supervisor o inspector antes de adoptar decisiones.
