


INFORME TÉCNICO DE ALERTA TEMPRANA

Riesgo de atraso formal en la ejecución de la obra

Contratacion de ejecucion de obra

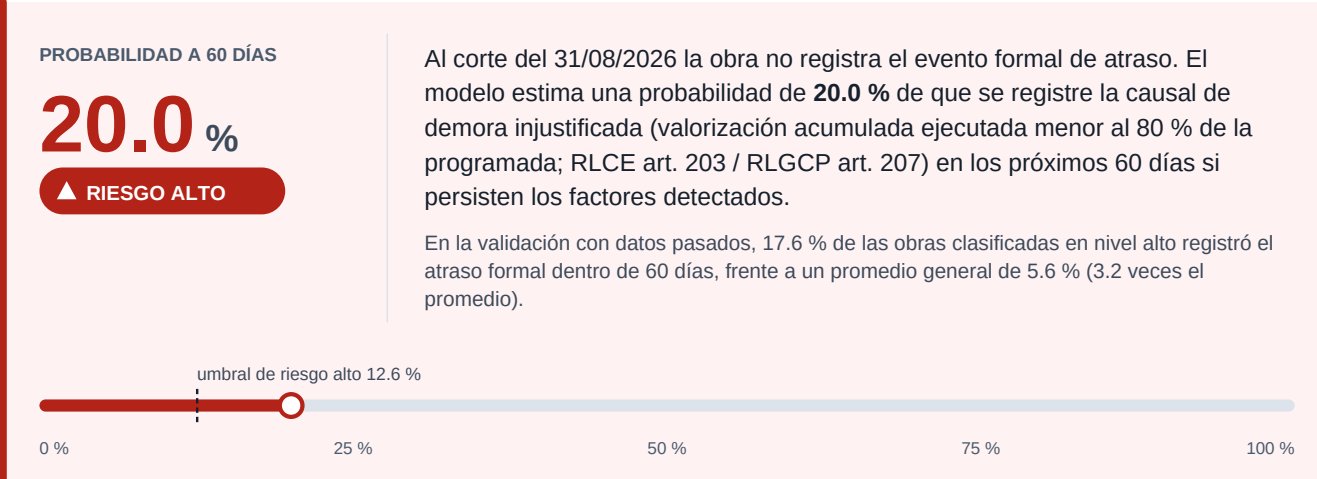


MONTO DEL CONTRATO	PLAZO ORIGINAL	ASIENTOS DEL CUADERNO	ÚLTIMO ASIENTO
No publicado	No publicado	464 desde 20/06/2025	27/08/2026

01 Identificación de la obra y del contrato

Denominación oficial	CONTRATACION DE EJECUCION DE OBRA
Entidad contratante	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARA
Contratista	CARWIL ALEJANDROS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - CARWIL ALEJANDROS S.R.L.
Ubicación (distrito / provincia / departamento)	MARA / COTABAMBAS / APURIMAC
Código Único de Inversión (CUI)	no enlazado
Inversión asociada	-
Función	-
Identificador del contrato (SEACE)	2327512
Monto del contrato	-
Monto aprobado de la inversión	-
Cuaderno de obra digital	464 asientos entre 20/06/2025 y 27/08/2026

02 Evolución del riesgo estimado a 60 días

Probabilidad estimada de atraso formal a 60 días

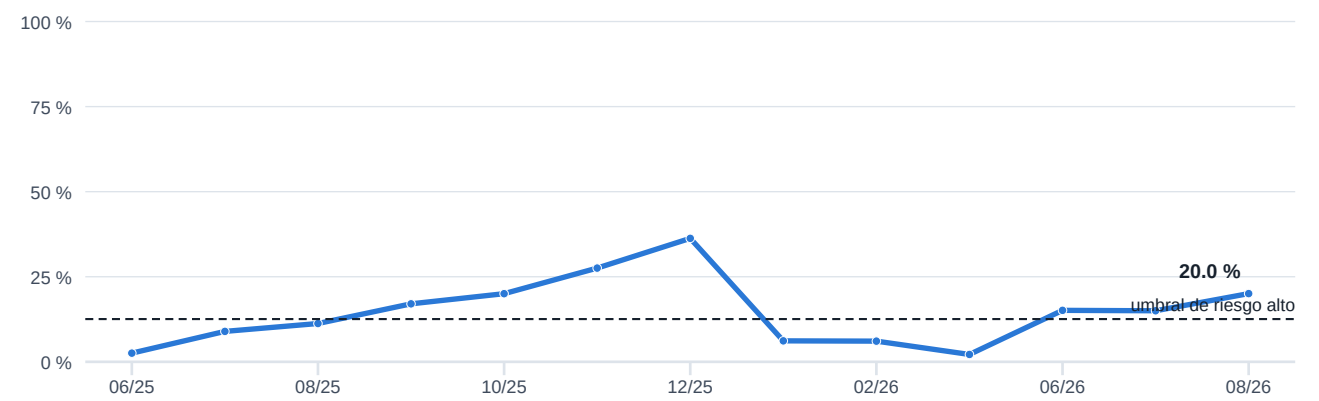

Estimaciones mensuales calculadas solo con la información disponible en cada fecha de corte (13 cortes, del 30/06/2025 al 31/08/2026), con reentrenamiento trimestral del modelo.

03 Factores que explican la estimación

Contribución de cada dato a la probabilidad (valores TreeSHAP en log-odds). Las barras hacia la derecha elevan el riesgo y las barras hacia la izquierda lo reducen, respecto del promedio de las obras.

Dato de la obra	Grupo	Reduce Eleva	Efecto
Índice de alerta por las palabras usadas en los asientos recientes: 0.55 (escala de 0 a 1)	Contenido de los asientos		+0.626
El 62 % de los asientos de los últimos 90 días fue registrado por la supervisión o inspección	Actividad del cuaderno de obra		+0.207
El 8 % de los asientos de los últimos 60 días menciona atraso, retraso o demora	Contenido de los asientos		+0.178
Departamento: Apurímac	Características de la obra		-0.178
El 4 % de los asientos de los últimos 60 días menciona penalidades, incumplimientos o cartas notariales	Contenido de los asientos		+0.176
El último asiento se registró hace 4 días	Actividad del cuaderno de obra		+0.122
18 asientos de órdenes en los últimos 90 días	Actividad del cuaderno de obra		+0.104
Índice de alerta por el contenido de los asientos recientes: 0.58 (escala de 0 a 1)	Contenido de los asientos		+0.082

04 Qué cambiaría la estimación (sensibilidad del modelo)

Recálculo de la probabilidad modificando una señal a la vez. Indica cuánto depende la estimación de cada señal; no es una estimación causal del efecto de una intervención real.

Escenario	Actual	Escenario	Cambio
Sin nuevas ampliaciones de plazo en los últimos 90 días	20.0 %	19.8 %	-0.2 pp
Absolver todas las consultas pendientes	20.0 %	20.0 %	+0.0 pp
Registro activo del cuaderno (asiento reciente)	20.0 %	20.0 %	+0.0 pp

05 Evidencia documental

Asientos del cuaderno de obra digital y otros registros oficiales asociados a los factores que elevan el riesgo, del más reciente al más antiguo (hasta 12).

Asiento N.º 464 · Otras ocurrencias · SOEC_RESI · 27/08/2026

...ales de funcionamientos y pruebas en los 04 sistemas, en las 169 ubs que contempla el proyecto, en ese entender esta residencia deja constancia que estos sucesos ocurridos, han perjudicado y generado retraso absolutamente agena a la voluntad del contratista, se menciona para cualquier efecto negativo posterior en el normal desarrollo de la obra y como antecedente no atribuible a la empresa ejecutora, se...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 459 · Ejecución de mayores metrados · SOEC_RESI · 18/08/2026

...s trabajos se tienen dificultad en poder cumplir el rendimiento considerado en la partida, esto debido a que estos trabajos están dispersados prácticamente en todo el centro poblado, en el que más se demora en trasladarse que en ejecutar al mayor metrado, por la falta de acceso y dificultad para poder llegar a cada ubs, además en el día se tiene presencia de lluvia con cierta intensidad de aproximadamen...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 456 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 14/08/2026

CONTESTACIÓN AL ASIENTO N.º 455 DEL RESIDENTE DE OBRA – CONSTANCIA SOBRE SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PLAZO, NOTIFICACIÓN DE OBSERVACIONES AL PROCESO CONSTRUCTIVO Y CULMINACIÓN DEL PLAZO CONTRACTUAL VIGENTE: En atención al Asiento N.º 455 del Residente de Obra, de fecha 14/08/2026, mediante el cual deja constancia del supuesto inicio de una causal de ampliación de plazo y señala que en la fecha habría presentado a esta...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 457 · Constatación física de la obra · SOEC_SPV · 14/08/2026

... instalaciones eléctricas, partidas de pintura y ventanas pendientes, elementos sanitarios y accesorios incompletos o ejecutados de manera diferente a los planos y especificaciones técnicas, así como incumplimientos relacionados con el componente social. En tal sentido, se requiere al contratista y a la residencia de obra la subsanación integral de las observaciones, debiendo los trabajos ejecutarse estri...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 448 · Respuestas a consultas · SOEC_SPV · 12/08/2026

PRONUNCIAMIENTO A LOS ASIENOS N.º 441, 442 Y 443 DEL RESIDENTE DE OBRA – CONSULTAS, VERIFICACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, MAYORES METRADOS Y EVENTUAL AFECTACIÓN DEL PLAZO CONTRACTUAL: En el caso específico de mayores metrados ejecutados bajo el sistema de precios unitarios, podrá evaluarse una ampliación de plazo únicamente cuando resulte necesario un plazo adicional para ejecutar mayores metrados que NO PROVENGAN DE...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 448 · Respuestas a consultas · SOEC_SPV · 12/08/2026

...ndo su ejecución modifique o afecte la ruta crítica vigente, debiendo el contratista observar estrictamente el procedimiento previsto en los artículos 197 y 198 del reglamento. Asimismo, tratándose de demora en la absolución de una consulta, la eventual afectación del plazo únicamente podrá computarse, conforme al artículo 193 del reglamento, desde el momento en que la imposibilidad de ejecutar los traba...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 403 · Respuestas a consultas · SOEC_RESI · 15/07/2026

ASIENTO DEL RESIDENTE LA NO ABSOLUCION DE CONSULTAS: VIENE.....debo precisar que dicha partida en consulta no se ejecutara tal como se había señalado en el asiento N.º 378 de fecha 07-07-2026, hasta que se resuelva la consulta, por consiguiente la no ejecución de esta partida se genera un causal de retraso en el cumplimiento de los plazos del contratista. En este asiento se adjunta la ficha técnica de pinturas ...

Fuente: cod-asientos202607.csv

06 Marco normativo, validez del modelo y lectura del informe

Evento que se anticipa: primer asiento del cuaderno de obra digital de tipo «Valorización acumulada ejecutada menor al 80 % del monto acumulado programado» o «Calendario acelerado de obra» (Reglamento de la Ley N.º 30225, D.S. N.º 344-2018-EF, art. 203; Reglamento de la Ley N.º 32069, D.S. N.º 009-2025-EF, art. 207).

Indicador (prueba temporal ciega)	Nacional	Arequipa
ROC-AUC	0.774	0.719
PR-AUC	0.158	0.216
Prevalencia del evento	0.050	0.091

Modelo atraso-H60-B_full-2026-08-31, entrenado con información hasta el 30/06/2026. Una PR-AUC mayor que la prevalencia indica que el modelo ordena las obras mejor que el azar.

CÓMO USAR ESTE INFORME

La probabilidad es una estimación para priorizar la supervisión, no una certeza ni una determinación de responsabilidades. Contraste siempre los factores y la evidencia con el expediente de la obra y con la información del supervisor o inspector antes de adoptar decisiones.
