


INFORME TÉCNICO DE ALERTA TEMPRANA

Riesgo de atraso formal en la ejecución de la obra

El presente contrato tiene por objeto la contratacion de la ejecucion del saldo de obra correspondiente a mejoramiento y ampliacion del sistema de abastecimiento de agua potable y alcantarillado de los distritos de sachaca, tiabaya y la localidad de congata distrito de uchumayo - arequipa CUI 2382190

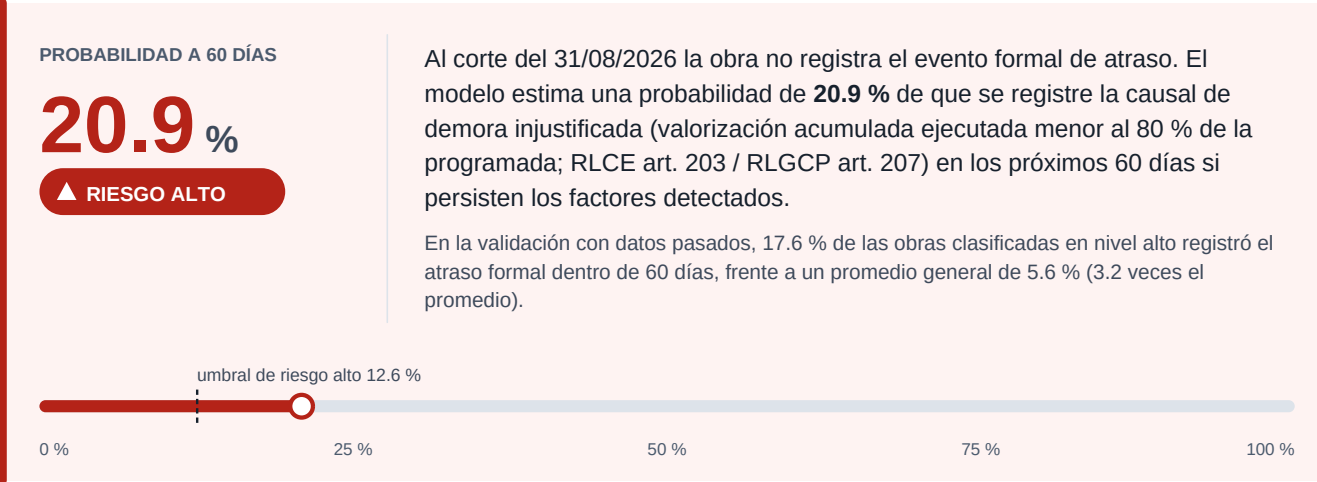


MONTO DEL CONTRATO	PLAZO ORIGINAL	ASIENTOS DEL CUADERNO	ÚLTIMO ASIENTO
No publicado	No publicado	433 desde 08/05/2026	31/08/2026

01 Identificación de la obra y del contrato

Denominación oficial	EL PRESENTE CONTRATO TIENE POR OBJETO LA CONTRATACION DE LA EJECUCION DEL SALDO DE OBRA CORRESPONDIENTE A MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS DISTRITOS DE SACHACA, TIABAYA Y LA LOCALIDAD DE CONGATA DISTRITO DE UCHUMAYO - AREQUIPA CUI 2382190
Entidad contratante	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AREQUIPA
Contratista	CONSORCIO SOL
Ubicación (distrito / provincia / departamento)	AREQUIPA / AREQUIPA / AREQUIPA
Código Único de Inversión (CUI)	2382190
Inversión asociada	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS DISTRITOS DE SACHACA, TIABAYA Y LA LOCALIDAD DE CONGATA, DISTRITO DE UCHUMAYO ¿ AREQUIPA
Función	SANEAMIENTO
Identificador del contrato (SEACE)	2387999
Monto del contrato	-
Monto aprobado de la inversión	S/ 56,726,017.96
Cuaderno de obra digital	433 asientos entre 08/05/2026 y 31/08/2026

02 Evolución del riesgo estimado a 60 días

Probabilidad estimada de atraso formal a 60 días

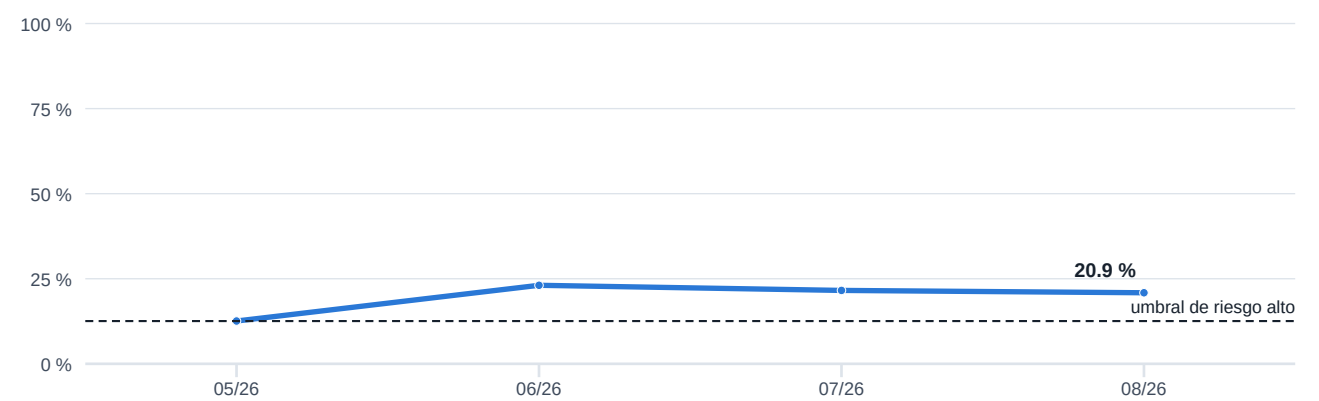

Estimaciones mensuales calculadas solo con la información disponible en cada fecha de corte (4 cortes, del 31/05/2026 al 31/08/2026), con reentrenamiento trimestral del modelo.

03 Factores que explican la estimación

Contribución de cada dato a la probabilidad (valores TreeSHAP en log-odds). Las barras hacia la derecha elevan el riesgo y las barras hacia la izquierda lo reducen, respecto del promedio de las obras.

Dato de la obra	Grupo	Reduce Eleva	Efecto
Índice de alerta por las palabras usadas en los asientos recientes: 0.64 (escala de 0 a 1)	Contenido de los asientos		+0.599
El 23 % de los asientos de los últimos 60 días menciona atraso, retraso o demora	Contenido de los asientos		+0.222
El 6 % de los asientos de los últimos 60 días menciona penalidades, incumplimientos o cartas notariales	Contenido de los asientos		+0.195
Departamento: Arequipa	Características de la obra		+0.160
Hubo registros en el cuaderno 24 días del último mes	Actividad del cuaderno de obra		+0.130
Índice de alerta por el contenido de los asientos recientes: 0.59 (escala de 0 a 1)	Contenido de los asientos		+0.117
Hubo un asiento el mismo día del corte	Actividad del cuaderno de obra		+0.114
Según el último avance declarado en el cuaderno, se ejecutó el 666 % de lo programado	Avance declarado en el cuaderno		-0.085

04 Qué cambiaría la estimación (sensibilidad del modelo)

Recálculo de la probabilidad modificando una señal a la vez. Indica cuánto depende la estimación de cada señal; no es una estimación causal del efecto de una intervención real.

Escenario	Actual	Escenario	Cambio
Absolver todas las consultas pendientes	20.9 %	20.6 %	-0.3 pp
Ejecución financiera al día (devengado en el último mes)	20.9 %	20.9 %	+0.0 pp

05 Evidencia documental

Asientos del cuaderno de obra digital y otros registros oficiales asociados a los factores que elevan el riesgo, del más reciente al más antiguo (hasta 12).

Asiento N.° 425 · Otras ocurrencias · SOEC_RESI · 31/08/2026

...o, quedando plenamente a salvo la salvaguarda prevista en el artículo 207.4 del reglamento. en consecuencia, no habilita la exigencia de un programa de ejecución acelerado a costo del contratista, ni penalidad, intervención económica o resolución.setimo. hecho con fecha cierta. la subsistencia de la paralización y la imposibilidad de iniciar la partida en su fecha programada inciden en la programación vige...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.° 425 · Otras ocurrencias · SOEC_RESI · 31/08/2026

...d de recursos, cuadrillas y frentes, así como la señalización y seguridad de las excavaciones existentes, sin que ello importe asunción de responsabilidad por la afectación.sexto. no configuración de retraso injustificado (art. 207). por obedecer a causa no imputable, esta situación no configura ni puede calificarse como retraso injustificado para ningún efecto, incluido el supuesto de valorización acum...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.° 421 · Otras ocurrencias · SOEC_RESI · 30/08/2026

...al pendiente de definición por parte de la entidad, no existiendo hecho, acto u omisión imputable al contratista que motive la no ejecución.quinto (afectación de la ruta crítica y no configuración de retraso injustificado). que, al integrar la partida la ruta crítica del cronograma vigente, la subsistencia de su imposibilidad de ejecución detiene el avance de dicha ruta e incide de manera directa en la ...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.° 419 · Otras ocurrencias · SOEC_RESI · 28/08/2026

...ente técnico y la normativa de contrataciones vigente, ley n. 32069 y su reglamento aprobado mediante decreto supremo n. 009-2025-ef.asimismo, se deja constancia de que, en caso de presentarse alguna demora en el pronunciamiento de la supervisión que pudiera afectar la continuidad de los trabajos, dicha situación será considerada en función de las circunstancias que correspondan y de la responsabilidad ...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.° 389 · Otras ocurrencias · SOEC_RESI · 24/08/2026

...le franquea, con carácter enunciativo, no taxativo y acumulativo. la actividad, una vez autorizada, se ejecuta sin que ello suponga convalidación de eventuales deficiencias del expediente técnico, el atraso originado por causa no imputable al contratista no configura ni puede calificarse como retraso injustificado en los términos del artículo 207 del reglamento.

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.° 368 · Otras ocurrencias · SOEC_RESI · 19/08/2026

...traso injustificado en los términos del artículo 207 del reglamento, calificación que cubre tanto el supuesto del 80% del avance programado como cualquier otro efecto derivado, quedando excluida toda intervención económica, penalidad por mora, exigencia de aceleración a costo del contratista o consecuencia resolutoria sustentada en dichos desfases.noveno.- los hechos no imputables descritos inciden en la programación v...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.° 362 · Otras ocurrencias · SOEC_RESI · 18/08/2026

RESPUESTA AL ASIENTO N° 331 — IMPROCEDENCIA DE LA EXIGENCIA DE PROGRAMA/CALENDARIO DE EJECUCIÓN ACELERADO POR INEXISTENCIA DE RETRASO INJUSTIFICADO (VALORIZACIÓN N° 03 – JULIO 2026),(1 DE 7):. I. OBJETOPRIMERO.- El Contratista responde el Asiento N° 331 de la Supervisión (11.08.2026), que en el marco del monitoreo de la Valorización Mensual N° 03 (julio 2026) requiere la presentación de un Programa de Ejecución de O...

Fuente: cod-asientos202608.csv

- Asiento N.º 330 · Adicionales · SOEC_RESI · 10/08/2026**

...injustificado para efecto alguno, en particular respecto del artículo 207 del reglamento, no pudiendo activarse validamente, por hechos cuya causa le es ajena, el programa acelerado de ejecución, las penalidades por mora, la intervención económica ni causal alguna de resolución contractual.septimo.- constancia de afectacion con fecha cierta. se deja constancia, con la fecha cierta del presente asiento, de ...

Fuente: cod-asientos202608.csv
- Asiento N.º 325 · Otras ocurrencias · SOEC_RESI · 08/08/2026**

... taxativo, son acumulativas y no se entenderan renunciadas por acto alguno de valorizacion, aprobacion parcial ni ejecucion contractual, ni la presente comunicacion supone aceptacion de observacion o incumplimiento alguno de esta parte.decimo. se solicita a la supervision pronunciarse de manera expresa e inmediata sobre los puntos (a), (b) y (c) del numeral cuarto, elevar con urgencia a la entidad la def...

Fuente: cod-asientos202608.csv
- Asiento N.º 245 · Consultas · SOEC_SPV · 20/07/2026**

DERIVACIÓN DE LA CONSULTA SOBRE INCIDENCIA EN OBRA N.º 13 A LA ENTIDAD: En atención a los Asientos N.º 233 y 234 y a la Carta N.º 126-2026/ING.EMC-R.O-CAU, esta Supervisión deja constancia que, mediante Carta N.º 019-2026-CSA, ha remitido a la Entidad la Consulta sobre Incidencia en Obra N.º 13, adjuntando la Carta N.º 037-2026-CSA-JSO/JVV que contiene la opinión técnica emitida por esta Supervisión. La remisión se e...

Fuente: cod-asientos202607.csv

06 Marco normativo, validez del modelo y lectura del informe

Evento que se anticipa: primer asiento del cuaderno de obra digital de tipo «Valorización acumulada ejecutada menor al 80 % del monto acumulado programado» o «Calendario acelerado de obra» (Reglamento de la Ley N.º 30225, D.S. N.º 344-2018-EF, art. 203; Reglamento de la Ley N.º 32069, D.S. N.º 009-2025-EF, art. 207).

Indicador (prueba temporal ciega)	Nacional	Arequipa
ROC-AUC	0.774	0.719
PR-AUC	0.158	0.216
Prevalencia del evento	0.050	0.091

Modelo atraso-H60-B_full-2026-08-31, entrenado con información hasta el 30/06/2026. Una PR-AUC mayor que la prevalencia indica que el modelo ordena las obras mejor que el azar.

CÓMO USAR ESTE INFORME

La probabilidad es una estimación para priorizar la supervisión, no una certeza ni una determinación de responsabilidades. Contraste siempre los factores y la evidencia con el expediente de la obra y con la información del supervisor o inspector antes de adoptar decisiones.
