


INFORME TÉCNICO DE ALERTA TEMPRANA

Riesgo de atraso formal en la ejecución de la obra

Ejecución de obra: Mejoramiento del servicio de educación secundaria en la I.E. Ayapata distrito de ayapata de la provincia de carabaya del departamento de puno

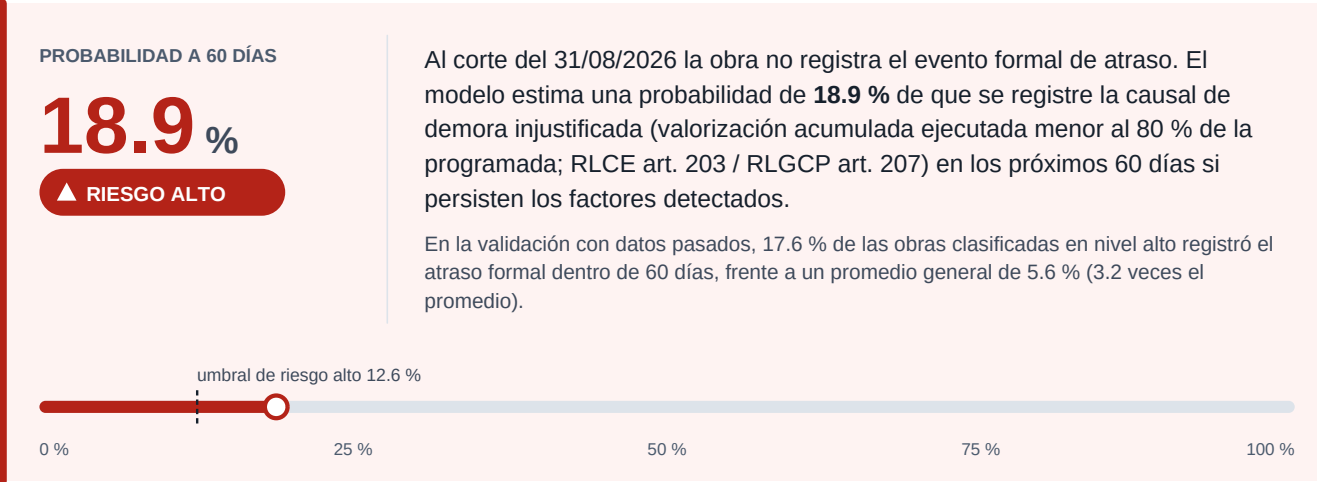


MONTO DEL CONTRATO	PLAZO ORIGINAL	ASIENTOS DEL CUADERNO	ÚLTIMO ASIENTO
No publicado	No publicado	23 desde 18/08/2026	31/08/2026

01 Identificación de la obra y del contrato

Denominación oficial	EJECUCIÓN DE OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN LA I.E. AYAPATA DISTRITO DE AYAPATA DE LA PROVINCIA DE CARABAYA DEL DEPARTAMENTO DE PUNO
Entidad contratante	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CARABAYA - MACUSANI
Contratista	GRUPO CH & M SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
Ubicación (distrito / provincia / departamento)	AYAPATA / CARABAYA / PUNO
Código Único de Inversión (CUI)	2710058
Inversión asociada	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN I.E. AYAPATA DISTRITO DE AYAPATA DE LA PROVINCIA DE CARABAYA DEL DEPARTAMENTO DE PUNO
Función	EDUCACIÓN
Identificador del contrato (SEACE)	2414594
Monto del contrato	-
Monto aprobado de la inversión	S/ 2,302,559.40
Cuaderno de obra digital	23 asientos entre 18/08/2026 y 31/08/2026

02 Evolución del riesgo estimado a 60 días

Probabilidad estimada de atraso formal a 60 días

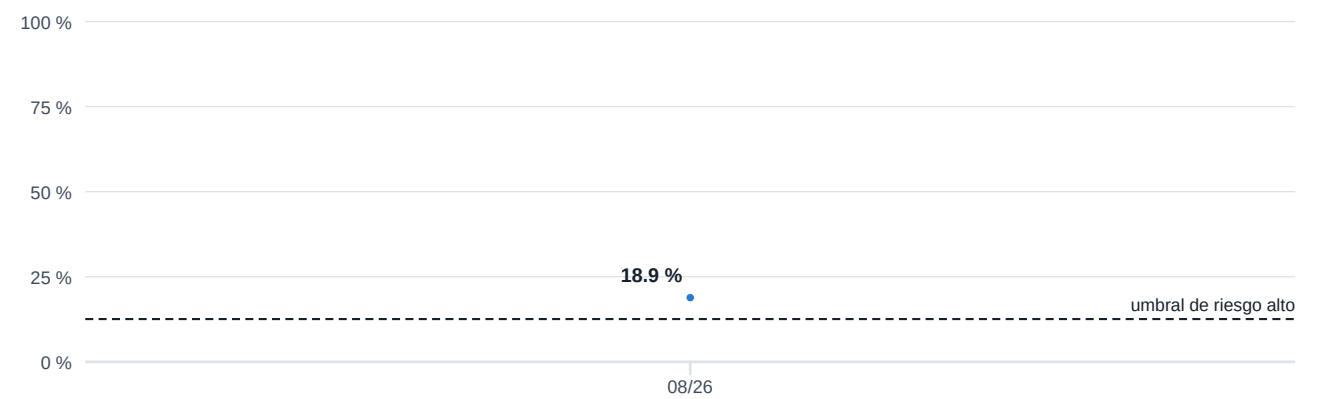

Estimaciones mensuales calculadas solo con la información disponible en cada fecha de corte (1 corte, del 31/08/2026 al 31/08/2026), con reentrenamiento trimestral del modelo.

03 Factores que explican la estimación

Contribución de cada dato a la probabilidad (valores TreeSHAP en log-odds). Las barras hacia la derecha elevan el riesgo y las barras hacia la izquierda lo reducen, respecto del promedio de las obras.

Dato de la obra	Grupo	Reduce Eleva	Efecto
Índice de alerta por las palabras usadas en los asientos recientes: 0.68 (escala de 0 a 1)	Contenido de los asientos		+0.701
El 61 % de los asientos de los últimos 90 días fue registrado por la supervisión o inspección	Actividad del cuaderno de obra		+0.297
El 9 % de los asientos de los últimos 60 días menciona atraso, retraso o demora	Contenido de los asientos		+0.260
Índice de alerta por el contenido de los asientos recientes: 0.67 (escala de 0 a 1)	Contenido de los asientos		+0.131
5 asientos de órdenes en los últimos 90 días	Actividad del cuaderno de obra		+0.112
Hubo un asiento el mismo día del corte	Actividad del cuaderno de obra		+0.109
Gasto devengado en los últimos 3 meses: S/ 40,000	Ejecución del gasto (SIAF)		+0.067
Ningún asiento de los últimos 60 días menciona penalidades, incumplimientos o cartas notariales	Contenido de los asientos		-0.062

04 Qué cambiaría la estimación (sensibilidad del modelo)

Recálculo de la probabilidad modificando una señal a la vez. Indica cuánto depende la estimación de cada señal; no es una estimación causal del efecto de una intervención real.

Escenario	Actual	Escenario	Cambio
Absolver todas las consultas pendientes	18.9 %	18.9 %	+0.0 pp
Sin suspensiones del plazo en los últimos 90 días	18.9 %	18.9 %	+0.0 pp

05 Evidencia documental

Asientos del cuaderno de obra digital y otros registros oficiales asociados a los factores que elevan el riesgo, del más reciente al más antiguo (hasta 12).

Asiento N.º 22 · Valorizaciones y metrados · SOEC_SPV · 31/08/2026

VALORIZACIONES Y METRADOS: Se deja constancia que, para efectos de la elaboración y presentación de la correspondiente valorización de obra, se solicita al Contratista realizar previamente la conciliación de los metrados realmente ejecutados en obra, conjuntamente con la Supervisión, a fin de verificar y establecer la correspondencia entre los trabajos ejecutados, los metrados acumulados y la documentación técnica qu...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 17 · Consultas · SOEC_RESI · 27/08/2026

...o que la imposibilidad de continuar con dichas actividades genera afectacion al plazo contractual, situacion no atribuible al contratista.en ese sentido, se deja constancia del inicio de la causal de atraso/paralizacion para efectos de la eventual solicitud de ampliacion de plazo, conforme al articulo 198.1 literal a) del reglamento de la ley n. 32069, debiendo acreditarse la afectacion de la ruta crit...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 11 · Otras ocurrencias · SOEC_RESI · 20/08/2026

...rabajos correspondientes a la brevedad posible, conforme a la programacion y disponibilidad de los recursos requeridos.asimismo, considerando la continuidad del proceso constructivo y a fin de evitar retrasos en el avance programado de la obra, se solicita a la supervision la autorizacion para dar inicio a las partidas correspondientes a excavaciones masivas, especificamente a la partida 2.01.01.01.01 e...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 7 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 20/08/2026

AUTORIZACIÓN PARA INICIO DE PARTIDA DEMOLICIONES: En atención al Asiento N.º 06 de fecha 19/08/2026, esta Supervisión deja constancia de haber verificado en campo la ejecución de los trabajos de desmontaje de puertas y ventanas, desmontaje de cobertura de calamina y desmontaje de tijerales de madera, encontrándolos conformes con lo señalado en el expediente técnico y ejecutados con las medidas de seguridad correspond...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 9 · Órdenes · SOEC_SPV · 20/08/2026

SOLICITUD DE DOCUMENTACIÓN REFERIDA A CALIDAD Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO: Esta Supervisión solicita a la Residencia de Obra la presentación de la siguiente documentación a fin de garantizar el cumplimiento de los estándares de calidad, seguridad y control establecidos en el expediente técnico y la normativa vigente:1.-Diseño de mezclas de concreto, elaborado por laboratorio acreditado, para las resistencias (f...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 8 · Órdenes · SOEC_SPV · 20/08/2026

REQUERIMIENTO DE PRESENTACIÓN DEL INFORME TÉCNICO DE REVISIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA: En la fecha, la Supervisión deja constancia que el Contrato de Ejecución de Obra fue suscrito el 16 de julio de 2026, posteriormente, el Contrato de Supervisión de Obra fue suscrito el 10 de agosto de 2026 y, con fecha 18 de agosto de 2026, se suscribió el Acta de Inicio de Ejecución de Obra, dando inicio al plazo de ejecuci...

Fuente: cod-asientos202608.csv

06 Marco normativo, validez del modelo y lectura del informe

Evento que se anticipa: primer asiento del cuaderno de obra digital de tipo «Valorización acumulada ejecutada menor al 80 % del monto acumulado programado» o «Calendario acelerado de obra» (Reglamento de la Ley N.º 30225, D.S. N.º 344-2018-EF, art. 203; Reglamento de la Ley N.º 32069, D.S. N.º 009-2025-EF, art. 207).

Indicador (prueba temporal ciega)	Nacional	Arequipa
ROC-AUC	0.774	0.719
PR-AUC	0.158	0.216
Prevalencia del evento	0.050	0.091

Modelo atraso-H60-B_full-2026-08-31, entrenado con información hasta el 30/06/2026. Una PR-AUC mayor que la prevalencia indica que el modelo ordena las obras mejor que el azar.

CÓMO USAR ESTE INFORME

La probabilidad es una estimación para priorizar la supervisión, no una certeza ni una determinación de responsabilidades. Contraste siempre los factores y la evidencia con el expediente de la obra y con la información del supervisor o inspector antes de adoptar decisiones.
