


INFORME TÉCNICO DE ALERTA TEMPRANA

Riesgo de atraso formal en la ejecución de la obra

Contratacion ejecucion de la obra

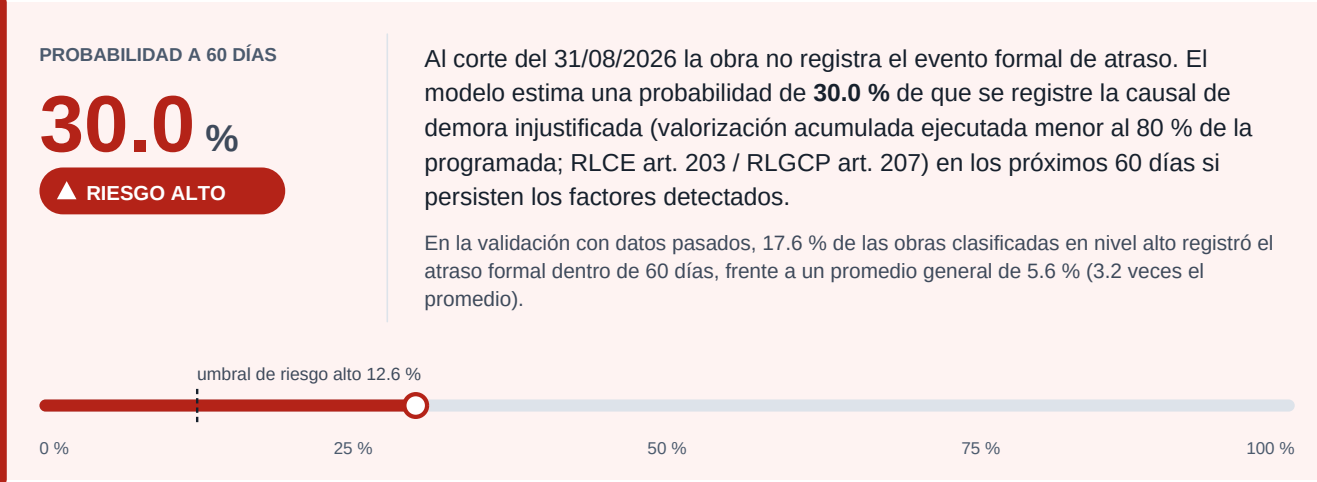


|                    |                |                         |                |
|--------------------|----------------|-------------------------|----------------|
| MONTO DEL CONTRATO | PLAZO ORIGINAL | ASIENTOS DEL CUADERNO   | ÚLTIMO ASIENTO |
| No publicado       | No publicado   | 779<br>desde 13/10/2025 | 31/08/2026     |

01 Identificación de la obra y del contrato

|                                                 |                                            |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Denominación oficial                            | CONTRATACION EJECUCION DE LA OBRA          |
| Entidad contratante                             | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CUSIPATA        |
| Contratista                                     | CONSORCIO ANDINO DEL SUR                   |
| Ubicación (distrito / provincia / departamento) | CUSIPATA / QUISPICANCHI / CUSCO            |
| Código Único de Inversión (CUI)                 | no enlazado                                |
| Inversión asociada                              | -                                          |
| Función                                         | -                                          |
| Identificador del contrato (SEACE)              | 2347250                                    |
| Monto del contrato                              | -                                          |
| Monto aprobado de la inversión                  | -                                          |
| Cuaderno de obra digital                        | 779 asientos entre 13/10/2025 y 31/08/2026 |

## 02 Evolución del riesgo estimado a 60 días

Probabilidad estimada de atraso formal a 60 días

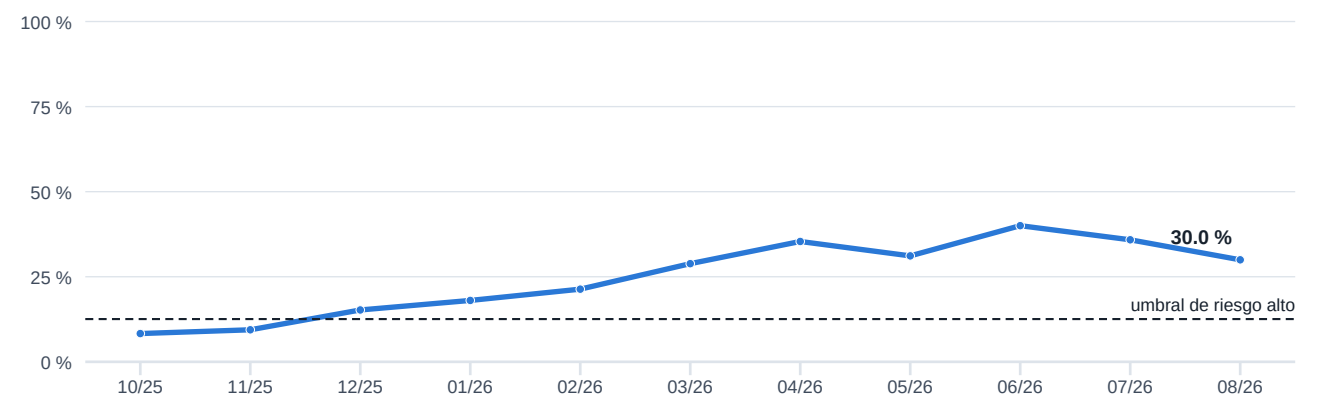

Estimaciones mensuales calculadas solo con la información disponible en cada fecha de corte (11 cortes, del 31/10/2025 al 31/08/2026), con reentrenamiento trimestral del modelo.

## 03 Factores que explican la estimación

Contribución de cada dato a la probabilidad (valores TreeSHAP en log-odds). Las barras hacia la derecha elevan el riesgo y las barras hacia la izquierda lo reducen, respecto del promedio de las obras.

| Dato de la obra                                                                                         | Grupo                          | Reduce   Eleva | Efecto |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|--------|
| Índice de alerta por las palabras usadas en los asientos recientes: 0.74 (escala de 0 a 1)              | Contenido de los asientos      | <div></div>    | +0.765 |
| El 5 % de los asientos de los últimos 60 días menciona atraso, retraso o demora                         | Contenido de los asientos      | <div></div>    | +0.237 |
| El 6 % de los asientos de los últimos 60 días menciona penalidades, incumplimientos o cartas notariales | Contenido de los asientos      | <div></div>    | +0.183 |
| El 58 % de los asientos de los últimos 90 días fue registrado por la supervisión o inspección           | Actividad del cuaderno de obra | <div></div>    | +0.154 |
| Departamento: Cusco                                                                                     | Características de la obra     | <div></div>    | -0.146 |
| Hubo un asiento el mismo día del corte                                                                  | Actividad del cuaderno de obra | <div></div>    | +0.124 |
| Hubo registros en el cuaderno 24 días del último mes                                                    | Actividad del cuaderno de obra | <div></div>    | +0.116 |
| 2 asientos de aplicación de penalidades en los últimos 90 días                                          | Actividad del cuaderno de obra | <div></div>    | +0.100 |

## 04 Qué cambiaría la estimación (sensibilidad del modelo)

Recálculo de la probabilidad modificando una señal a la vez. Indica cuánto depende la estimación de cada señal; no es una estimación causal del efecto de una intervención real.

| Escenario                                            | Actual | Escenario | Cambio  |
|------------------------------------------------------|--------|-----------|---------|
| Sin aplicación de penalidades en los últimos 90 días | 30.0 % | 26.5 %    | -3.5 pp |
| Absolver todas las consultas pendientes              | 30.0 % | 29.9 %    | -0.0 pp |
| Sin suspensiones del plazo en los últimos 90 días    | 30.0 % | 30.1 %    | +0.1 pp |

## 05 Evidencia documental

Asientos del cuaderno de obra digital y otros registros oficiales asociados a los factores que elevan el riesgo, del más reciente al más antiguo (hasta 12).

### Asiento N.º 773 · Otras ocurrencias · SOEC\_SPV · 31/08/2026

*...sta de estructuras para coordinar al respecto de la zona de carguio y dosificado, para asegurar que el vaciado de concreto masivo tenga las condiciones de trabajar de forma dinamica y que no se tenga retrasos en la preparacion del concreto y su respectivo traslado a la obra.continua asiento...*

Fuente: cod-asientos202608.csv

### Asiento N.º 768 · Otras ocurrencias · SOEC\_SPV · 31/08/2026

*...ciones con los respectivos documentos de calidad para el archivo de supervision. se solicita asegurar la trazabilidad e integridad de todos los sustentos tecnicos en la fecha comprometida para evitar retrasos en el proceso de revision y observacion de los avances.*

Fuente: cod-asientos202608.csv

### Asiento N.º 746 · Órdenes · SOEC\_SPV · 27/08/2026

*...ca con el objeto de garantizar la calidad estructural, la seguridad y la correcta ejecucion del adicional de obra y la partida contractual, la misma involucra otras especialidades, advirtiendo que el incumplimiento de la permanencia del personal clave o la falta de validacion especializada acarreará la aplicacion de las penalidades contractuales correspondientes, sobre los profesionales requeridos.base l...*

Fuente: cod-asientos202608.csv

### Asiento N.º 760 · Órdenes · SOEC\_SPV · 27/08/2026

*... sin contar con el sustento integral correspondiente.asimismo, se evidencia la necesidad de que el contratista impulse con la debida diligencia el tramite tecnico correspondiente, considerando que la demora en la presentacion de consultas debidamente sustentadas podría afectar la oportuna definicion de la ingenieria, la programacion de actividades y la continuidad de la ejecucion contractual.continua as...*

Fuente: cod-asientos202608.csv

### Asiento N.º 753 · Otras ocurrencias · SOEC\_RESI · 27/08/2026

*... fin de formular una solucion tecnica compatible con la topografia real. se reitera que la consulta n 12 se mantiene pendiente de pronunciamiento, por consiguiente, cualquier impacto derivado de esta demora sera evaluado de acuerdo con el programa de ejecucion de obra (peo) vigente y la oportunidad de su formulacion.*

Fuente: cod-asientos202608.csv

### Asiento N.º 735 · Otras ocurrencias · SOEC\_SPV · 26/08/2026

*RESPUESTA AL ASIENTO N° 715,716 Y 717 DEL RESIDENTE: Se recomienda a la residencia que respetando los procesos constructivos y en aras de lograr el avance de la ejecución de la obra, analizar y tomar acciones con respecto a las anotaciones de la supervisión.Sobre el bloque B:La absolución de la consulta 10 fue comunicada mediante el asiento N° 718La altura del cisterna está absuelta mediante comunicación escrita por ...*

Fuente: cod-asientos202608.csv

### Asiento N.º 721 · Administración de riesgos · SOEC\_SPV · 25/08/2026

*..., durante las ultimas semanas, se han recibido manifestaciones por parte del personal obrero que viene participando en la ejecucion de la obra, quienes senalan la existencia de presuntos retrasos y/o incumplimientos en el pago de sus remuneraciones correspondientes, situacion verificada en campo el 25/08/2026.lo senalado afecta los avances de obra, el cual puede comprometer el cumplimiento del alcance de...*

Fuente: cod-asientos202608.csv

### Asiento N.º 667 · Otras ocurrencias · SOEC\_RESI · 18/08/2026

*...tales, transversales y diagonales. inspeccion integral del sistema antes de solicitar su liberacion.por tanto, las observaciones formuladas se encuentran en proceso de atencion y no existe desacato o incumplimiento de una orden de la supervision. por el contrario, el contratista viene ejecutando las acciones previamente coordinadas y adoptando las medidas necesarias para garantizar la estabilidad y segur...*

Fuente: cod-asientos202608.csv

**Asiento N.º 666 · Otras ocurrencias · SOEC\_RESI · 18/08/2026**

*...o requerian.la incorporacion de dichos puntales adicionales habia sido previamente coordinada entre esta residencia y la supervision. en consecuencia, no existio negativa, resistencia ni intencion de incumplir las recomendaciones tecnicas formuladas.por ello, resulta necesario precisar que la redaccion de los asientos n656 y 657 omite mencionar las coordinaciones efectuadas y la descarga de puntales real...*

Fuente: cod-asientos202608.csv

**Asiento N.º 623 · Otras ocurrencias · SOEC\_SPV · 12/08/2026**

*SOBRE EL ASIENTO N° 596: Visto el asiento 596, que contempla lo señalado en el asiento 597, vinculado a su informe técnico, Esta supervisión deja constancia en este asiento lo siguiente:-La consulta no se ajusta al artículo 190.2 del RLGCP, por tanto no será atendida. -Así mismo téngase presente el artículo 190.5 del RLGCP. El contratista debe formular la consulta con la anticipación su?ciente para que el programa d...*

Fuente: cod-asientos202608.csv

06

Marco normativo, validez del modelo y lectura del informe

Evento que se anticipa: primer asiento del cuaderno de obra digital de tipo «Valorización acumulada ejecutada menor al 80 % del monto acumulado programado» o «Calendario acelerado de obra» (Reglamento de la Ley N.º 30225, D.S. N.º 344-2018-EF, art. 203; Reglamento de la Ley N.º 32069, D.S. N.º 009-2025-EF, art. 207).

| Indicador (prueba temporal ciega) | Nacional | Arequipa |
|-----------------------------------|----------|----------|
| ROC-AUC                           | 0.774    | 0.719    |
| PR-AUC                            | 0.158    | 0.216    |
| Prevalencia del evento            | 0.050    | 0.091    |

Modelo atraso-H60-B\_full-2026-08-31, entrenado con información hasta el 30/06/2026. Una PR-AUC mayor que la prevalencia indica que el modelo ordena las obras mejor que el azar.

**CÓMO USAR ESTE INFORME**

La probabilidad es una estimación para priorizar la supervisión, no una certeza ni una determinación de responsabilidades. Contraste siempre los factores y la evidencia con el expediente de la obra y con la información del supervisor o inspector antes de adoptar decisiones.
