


INFORME TÉCNICO DE ALERTA TEMPRANA

Riesgo de atraso formal en la ejecución de la obra

Construccion de ambiente complementario, en el(la) hospital regional docente cajamarca distrito de cajamarca, provincia cajamarca, departamento cajamarca, CUI NRO. 2694870

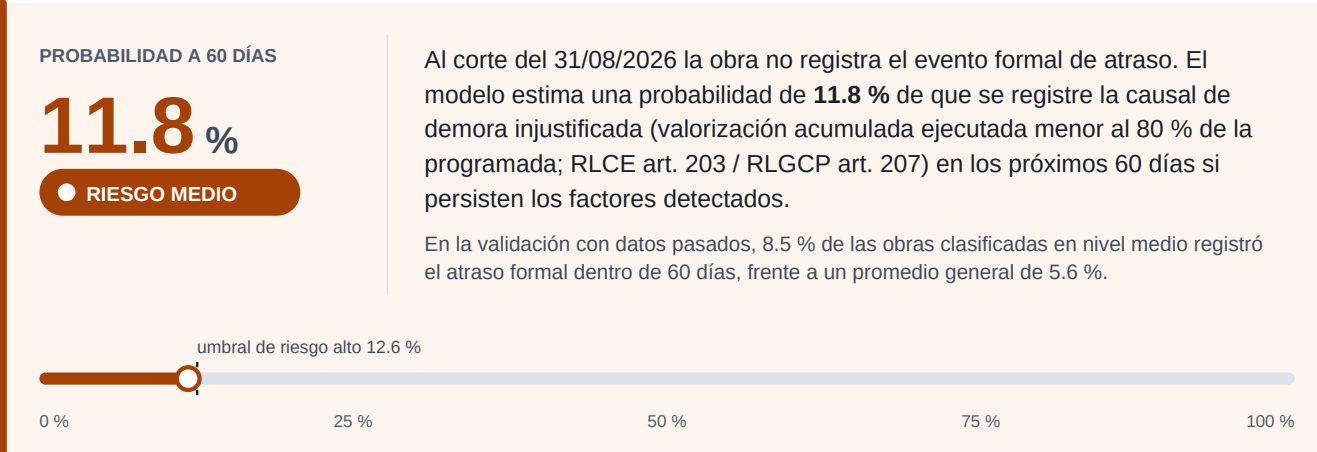


MONTO DEL CONTRATO	PLAZO ORIGINAL	ASIENTOS DEL CUADERNO	ÚLTIMO ASIENTO
No publicado	No publicado	62 desde 21/07/2026	25/08/2026

01 Identificación de la obra y del contrato

Denominación oficial	CONSTRUCCION DE AMBIENTE COMPLEMENTARIO, EN EL(LA) HOSPITAL REGIONAL DOCENTE CAJAMARCA DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA CAJAMARCA, DEPARTAMENTO CAJAMARCA, CUI NRO. 2694870
Entidad contratante	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA-HOSPITAL CAJAMARCA
Contratista	CONSORCIO EJECUTOR SALUD
Ubicación (distrito / provincia / departamento)	CAJAMARCA / CAJAMARCA / CAJAMARCA
Código Único de Inversión (CUI)	2694870
Inversión asociada	CONSTRUCCION DE AMBIENTE COMPLEMENTARIO EN EL(LA) HOSPITAL REGIONAL DOCENTE CAJAMARCA DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA CAJAMARCA, DEPARTAMENTO CAJAMARCA
Función	SALUD
Identificador del contrato (SEACE)	2408172
Monto del contrato	-
Monto aprobado de la inversión	S/ 1,434,638.25
Cuaderno de obra digital	62 asientos entre 21/07/2026 y 25/08/2026

02 Evolución del riesgo estimado a 60 días

Probabilidad estimada de atraso formal a 60 días

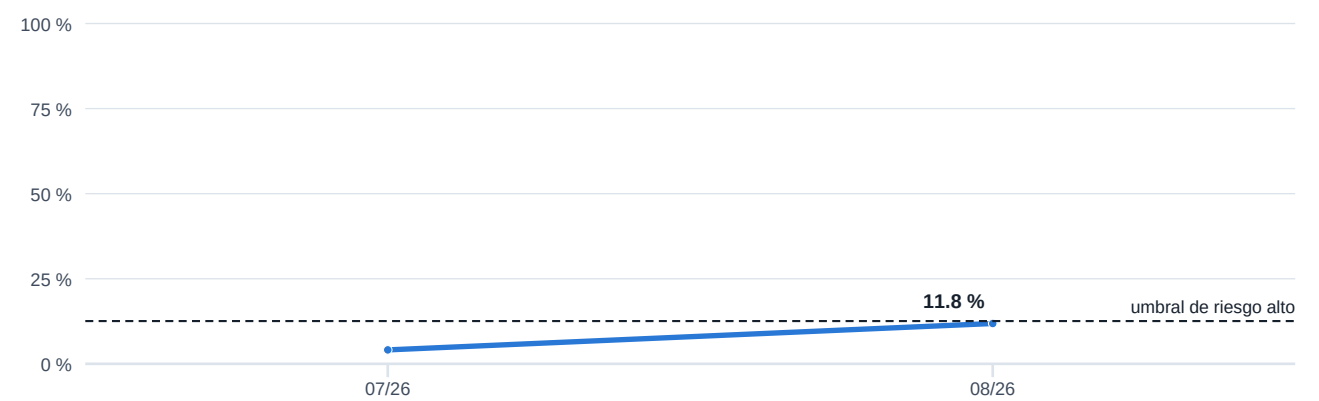

Estimaciones mensuales calculadas solo con la información disponible en cada fecha de corte (2 cortes, del 31/07/2026 al 31/08/2026), con reentrenamiento trimestral del modelo.

03 Factores que explican la estimación

Contribución de cada dato a la probabilidad (valores TreeSHAP en log-odds). Las barras hacia la derecha elevan el riesgo y las barras hacia la izquierda lo reducen, respecto del promedio de las obras.

Dato de la obra	Grupo	Reduce Eleva	Efecto
Índice de alerta por las palabras usadas en los asientos recientes: 0.50 (escala de 0 a 1)	Contenido de los asientos		+0.543
El 56 % de los asientos de los últimos 90 días fue registrado por la supervisión o inspección	Actividad del cuaderno de obra		+0.335
El último asiento se registró hace 6 días	Actividad del cuaderno de obra		-0.161
El 5 % de los asientos de los últimos 60 días menciona atraso, retraso o demora	Contenido de los asientos		+0.143
Hubo registros en el cuaderno 19 días del último mes	Actividad del cuaderno de obra		+0.074
El 5 % de los asientos de los últimos 60 días menciona observaciones de calidad	Contenido de los asientos		+0.066
Ningún asiento de los últimos 60 días menciona penalidades, incumplimientos o cartas notariales	Contenido de los asientos		-0.054
Gasto devengado en los últimos 3 meses: S/ 0	Ejecución del gasto (SIAF)		+0.053

04 Qué cambiaría la estimación (sensibilidad del modelo)

Recálculo de la probabilidad modificando una señal a la vez. Indica cuánto depende la estimación de cada señal; no es una estimación causal del efecto de una intervención real.

Escenario	Actual	Escenario	Cambio
Absolver todas las consultas pendientes	11.8 %	11.8 %	+0.0 pp
Sin suspensiones del plazo en los últimos 90 días	11.8 %	11.9 %	+0.1 pp
Registro activo del cuaderno (asiento reciente)	11.8 %	15.3 %	+3.4 pp

05 Evidencia documental

Asientos del cuaderno de obra digital y otros registros oficiales asociados a los factores que elevan el riesgo, del más reciente al más antiguo (hasta 12).

Asiento N.º 51 · Respuestas a consultas · SOEC_INSP · 19/08/2026

pronunciamento de la inspeccion de obra respecto a las solicitudes del residente en el asiento n 48 . iii. observacion a la fundamentacion juridica del asiento n 48: revisitada la reiteracion planteada en el asiento n 48, se observa que la fundamentacion legal invocada por el contratista (numeral 40.2 del articulo 40...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 52 · Otras ocurrencias · SOEC_RESI · 19/08/2026

ASIEN TO N°52 DEL RESIDENTE: SE INICIAN LAS ACTIVIDADES DEL DIA CON LA CHARLA DE SEGURIDAD "LA BUENA ALIMENTACION", A CARGO DEL ESPECILISTA EN SEGURIDAD, CON LA PARTICIPACION DEL PERSONAL DE OBRA.EL PRESENTE DIA SE EJECUTARON LAS SIGUIENTES PARTIDAS:-ARMADO DE VIGA DE CIMENTACION.-HABILITACION DE ACERO PARA VIGAS DE CIMENTACION.- EN LO REFERENTE AL ASIEN TO DE OBRA N°48 DE FECHA 18/08/2026 SE CITO ERRRONEAMENTE LA LEY ...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 48 · Suspensión del plazo de ejecución · SOEC_RESI · 18/08/2026

...olicitud se sustenta en el numeral 40.2 del articulo 40 de la ley n 32065 ley general de contrataciones publicas y el articulo 178 del d.s. 009-2024-ef reglamento de la ley n 32065, al tratarse de un atraso no imputable al contratista que afecta la ejecucion de la obra.

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 47 · Respuestas a consultas · SOEC_INSP · 17/08/2026

...inuar con la ejecucion de las actividades ejecutables que no dependen tecnicamente de la definicion de la partida 02.03.04 sobrecimientos, a fin de optimizar el programa de ejecucion de obra y evitar atrasos no justificables. se deja constancia del presente asiento para los fines tecnicos, contractuales y administrativos a que haya lugar.

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 36 · Otras ocurrencias · SOEC_INSP · 13/08/2026

...de programacion de ejecucion de obrase deja constancia de que en la fecha se ha recibido por parte de la jefatura el documento referente a la programacion de ejecucion de obra con el levantamiento de observaciones presentado por el contratista. en tal sentido, esta inspeccion se encuentra realizando la revision tecnica correspondiente para, de ser el caso, emitir el pronunciamiento o conformidad dentro del p...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 31 · Respuestas a consultas · SOEC_INSP · 11/08/2026

CONTROL DE OBRA Y RESPUESTA A CONSULTAS TÉCNICAS: 3. SOBRE LA CONSULTA FORMULADA DE LA PARTIDA 02.03.04 sobrecimientosRespecto a la consulta formulada sobre la partida 02.03.04 Sobrecimientos y su interfaz técnica con las vigas de cimentación, se informa y se deja constancia de lo siguiente: Esta Inspección se encuentra elaborando el Informe Técnico correspondiente a fin de remitirlo formalmente a la Entidad dentro d...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 25 · Consultas · SOEC_RESI · 10/08/2026

ASIEN TO N°25 DEL RESIDENTE: POR LO EXPUESTO, SE SOLICITA A LA ENTIDAD QUE SE SIRVA PROPORCIONAR Y/O PRECISAR LOS DETALLES CONSTRUCTIVOS Y CRITERIOS TÉCNICOS CORRESPONDIENTES A LA PARTIDA 02.03.04 – SOBRECIMENTOS, INCLUYENDO, SEGÚN CORRESPONDA, DIMENSIONES, NIVELES, UBICACIÓN, MATERIALES, CARACTERÍSTICAS DEL CONCRETO, ACERO DE REFUERZO, PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO Y DEMÁS INFORMACIÓN NECESARIA PARA GARANTIZAR SU CORRE...

Fuente: cod-asientos202608.csv

06 Marco normativo, validez del modelo y lectura del informe

Evento que se anticipa: primer asiento del cuaderno de obra digital de tipo «Valorización acumulada ejecutada menor al 80 % del monto acumulado programado» o «Calendario acelerado de obra» (Reglamento de la Ley N.º 30225, D.S. N.º 344-2018-EF, art. 203; Reglamento de la Ley N.º 32069, D.S. N.º 009-2025-EF, art. 207).

Indicador (prueba temporal ciega)	Nacional	Arequipa
ROC-AUC	0.774	0.719
PR-AUC	0.158	0.216
Prevalencia del evento	0.050	0.091

Modelo atraso-H60-B_full-2026-08-31, entrenado con información hasta el 30/06/2026. Una PR-AUC mayor que la prevalencia indica que el modelo ordena las obras mejor que el azar.

CÓMO USAR ESTE INFORME

La probabilidad es una estimación para priorizar la supervisión, no una certeza ni una determinación de responsabilidades. Contraste siempre los factores y la evidencia con el expediente de la obra y con la información del supervisor o inspector antes de adoptar decisiones.
