


INFORME TÉCNICO DE ALERTA TEMPRANA

Riesgo de atraso formal en la ejecución de la obra

Creacion del servicio de movilidad urbana en el jiron gustavson (cuadra: 01, 02 y 03) la ciudad de oxapampa distrito de oxapampa de la provincia de oxapampa del departamento de pasco, con CUI N° 2599574

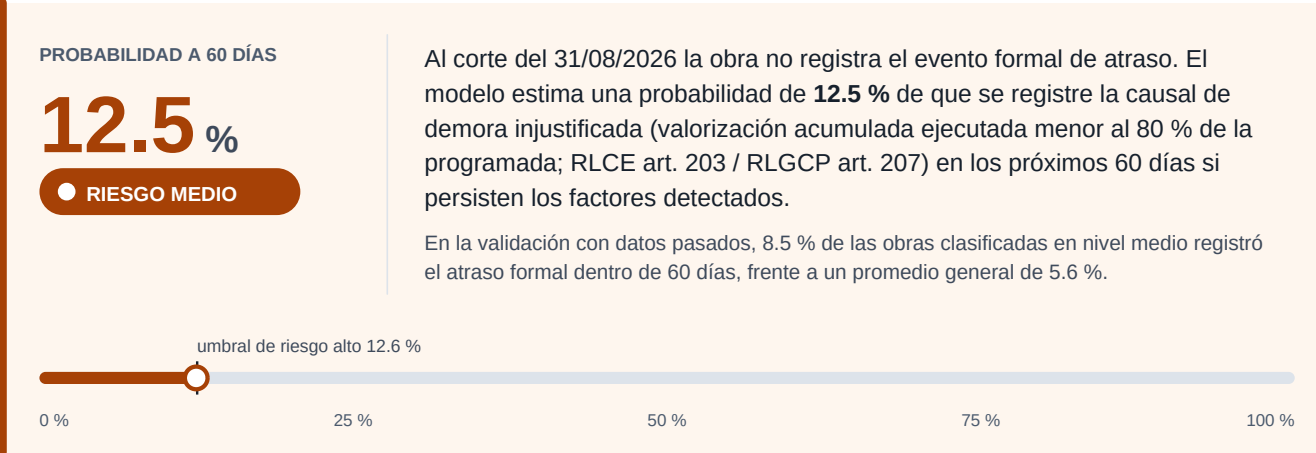


MONTO DEL CONTRATO	PLAZO ORIGINAL	ASIENTOS DEL CUADERNO	ÚLTIMO ASIENTO
No publicado	No publicado	85 desde 15/07/2026	31/08/2026

01 Identificación de la obra y del contrato

Denominación oficial	CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN EL JIRON GUSTAVSON (CUADRA: 01, 02 Y 03) LA CIUDAD DE OXAPAMPA DISTRITO DE OXAPAMPA DE LA PROVINCIA DE OXAPAMPA DEL DEPARTAMENTO DE PASCO, con CUI N° 2599574
Entidad contratante	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA
Contratista	CONSORCIO BM25
Ubicación (distrito / provincia / departamento)	OXAPAMPA / OXAPAMPA / PASCO
Código Único de Inversión (CUI)	2599574
Inversión asociada	CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN EL JIRON GUSTAVSON (CUADRA: 01, 02 Y 03) LA CIUDAD DE OXAPAMPA DISTRITO DE OXAPAMPA DE LA PROVINCIA DE OXAPAMPA DEL DEPARTAMENTO DE PASCO
Función	TRANSPORTE
Identificador del contrato (SEACE)	2407270
Monto del contrato	-
Monto aprobado de la inversión	S/ 1,823,713.56
Cuaderno de obra digital	85 asientos entre 15/07/2026 y 31/08/2026

02 Evolución del riesgo estimado a 60 días

Probabilidad estimada de atraso formal a 60 días

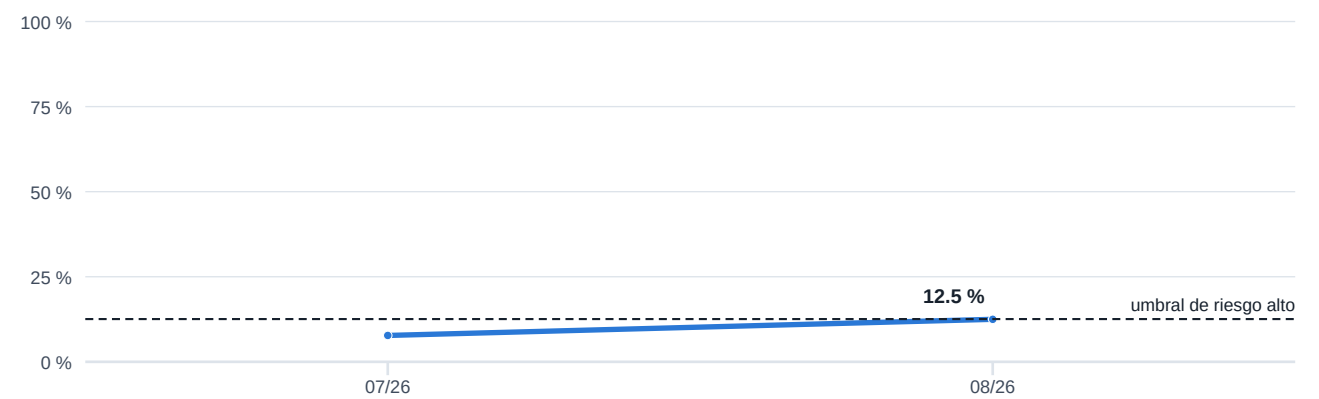

Estimaciones mensuales calculadas solo con la información disponible en cada fecha de corte (2 cortes, del 31/07/2026 al 31/08/2026), con reentrenamiento trimestral del modelo.

03 Factores que explican la estimación

Contribución de cada dato a la probabilidad (valores TreeSHAP en log-odds). Las barras hacia la derecha elevan el riesgo y las barras hacia la izquierda lo reducen, respecto del promedio de las obras.

Dato de la obra	Grupo	Reduce Eleva	Efecto
Índice de alerta por las palabras usadas en los asientos recientes: 0.51 (escala de 0 a 1)	Contenido de los asientos		+0.460
El 4 % de los asientos de los últimos 60 días menciona penalidades, incumplimientos o cartas notariales	Contenido de los asientos		+0.226
El 6 % de los asientos de los últimos 60 días menciona atraso, retraso o demora	Contenido de los asientos		+0.151
Extensión media de los asientos recientes: 1,464 caracteres	Contenido de los asientos		-0.100
Hubo un asiento el mismo día del corte	Actividad del cuaderno de obra		+0.099
Índice de alerta por el contenido de los asientos recientes: 0.57 (escala de 0 a 1)	Contenido de los asientos		+0.099
Hubo registros en el cuaderno 21 días del último mes	Actividad del cuaderno de obra		+0.070
2 asientos de constatación física en los últimos 90 días	Actividad del cuaderno de obra		+0.056

04 Qué cambiaría la estimación (sensibilidad del modelo)

Recálculo de la probabilidad modificando una señal a la vez. Indica cuánto depende la estimación de cada señal; no es una estimación causal del efecto de una intervención real.

Escenario	Actual	Escenario	Cambio
Absolver todas las consultas pendientes	12.5 %	12.5 %	+0.0 pp
Ejecución financiera al día (devengado en el último mes)	12.5 %	12.5 %	+0.0 pp

05 Evidencia documental

Asientos del cuaderno de obra digital y otros registros oficiales asociados a los factores que elevan el riesgo, del más reciente al más antiguo (hasta 12).

Asiento N.º 74 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 25/08/2026

...cto.2.- se verifico que la partida de eliminacion de material excedente en la cuadra 03 esta siendo ejecutada. se recomienda incrementar la flota de unidades de transporte (volquetes) a fin de evitar atrasos y que esto tenga incidencia en la ruta critica del proyecto.3.- se reitera a la residencia de obra la obligacion de solicitar, mediante cuaderno de obra, la liberacion previa de los tramos a encofr...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 74 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 25/08/2026

...obra la obligacion de solicitar, mediante cuaderno de obra, la liberacion previa de los tramos a encofrar y posteriormente vaciar con concreto (pavimento, veredas, rampas, martillos y sardineles). el incumplimiento de este procedimiento conllevara a que los metrados ejecutados sin dicha liberacion no sean reconocidos como validos para efectos de valorizacion.4.- se solicita a la residencia mayor control ...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 70 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 21/08/2026

... de los equipos de proteccion personal correspondientes, dejandose constancia de que, en caso de reincidencia en actos subestandar de esta naturaleza, esta supervision procedera a la aplicacion de la penalidad contractual correspondiente, conforme a lo estipulado en el contrato de ejecucion de obra.sirvase el residente de obra dar cumplimiento a lo dispuesto en el presente asiento.

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 56 · Consultas · SOEC_RESI · 19/08/2026

...ia de cargas.la consulta es: se va aprobar el replanteo de juntas en pavimentos en el jiron gustavson para su ejecucion? si en caso no se aprueba dicho replanteo, perjudicaria en los avances y habria atrasos en obra.

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 48 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 12/08/2026

OBSERVACIONES AL PROCEDIMIENTO DE AMPLIACIÓN DE PLAZO, CHARLA DE SEGURIDAD, PROGRAMACIÓN DE FRENTES DE TRABAJO Y VERIFICACIÓN DE ENSAYOS IN SITU: En atención a lo informado por la Residencia de Obra en los asientos precedentes, esta Supervisión deja constancia de lo siguiente:1.- Respecto a la incidencia climatológica invocada como antecedente para una eventual ampliación de plazo contractual, se indica al Residente ...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 48 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 12/08/2026

...s que va causar el evento climatico del fenomeno del nino en la zona, esta supervision solicita al residente de obra desarrollar las actividades programadas en dos frentes de trabajo, a fin de evitar retrasos respecto a la ruta critica y garantizar el cumplimiento de las metas fisicas establecidas en el cronograma vigente.4.- se deja constancia de que, en caso las condiciones tecnicas de campo resulten ...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 43 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 11/08/2026

REQUERIMIENTO DE ENTREGA DE PROTOCOLO DE DENSIDAD DE CAMPO Y NOTIFICACIÓN PREVIA DE ENSAYOS Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS: En atención a lo informado por la Residencia de Obra mediante el Asiento N.º 42, esta Supervisión deja constancia de lo siguiente:1.- A la fecha, esta Supervisión no ha recibido de manera formal el protocolo de resultados del ensayo de densidad de campo realizado en la subrasante para veredas, requere...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 35 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 04/08/2026

SOLICITUD DE NOTIFICACIÓN DE PERSONAL, SCTR Y ENTREGA DE EPP: En atención a lo informado por la Residencia de Obra mediante el Asiento N.º 33, esta Supervisión solicita al Residente de Obra notificar oportunamente cualquier cambio o incremento de personal obrero o técnico que se incorpore a la ejecución de la obra, debiendo remitir a esta Supervisión la documentación correspondiente al seguro SCTR de dicho personal, ...

Fuente: cod-asientos202608.csv

06 Marco normativo, validez del modelo y lectura del informe

Evento que se anticipa: primer asiento del cuaderno de obra digital de tipo «Valorización acumulada ejecutada menor al 80 % del monto acumulado programado» o «Calendario acelerado de obra» (Reglamento de la Ley N.º 30225, D.S. N.º 344-2018-EF, art. 203; Reglamento de la Ley N.º 32069, D.S. N.º 009-2025-EF, art. 207).

Indicador (prueba temporal ciega)	Nacional	Arequipa
ROC-AUC	0.774	0.719
PR-AUC	0.158	0.216
Prevalencia del evento	0.050	0.091

Modelo atraso-H60-B_full-2026-08-31, entrenado con información hasta el 30/06/2026. Una PR-AUC mayor que la prevalencia indica que el modelo ordena las obras mejor que el azar.

CÓMO USAR ESTE INFORME

La probabilidad es una estimación para priorizar la supervisión, no una certeza ni una determinación de responsabilidades. Contraste siempre los factores y la evidencia con el expediente de la obra y con la información del supervisor o inspector antes de adoptar decisiones.
