


INFORME TÉCNICO DE ALERTA TEMPRANA

Riesgo de atraso formal en la ejecución de la obra

Ejecución de Obra: Instalación del Servicio de Agua para el Sistema de Riego del Anexo Piñotea, Comunidad Campesina de Tolapalca, Distrito de Ichuña, Provincia General Sánchez Cerro, Región Moquegua. Código Único de Inversión (CUI) N°2385032

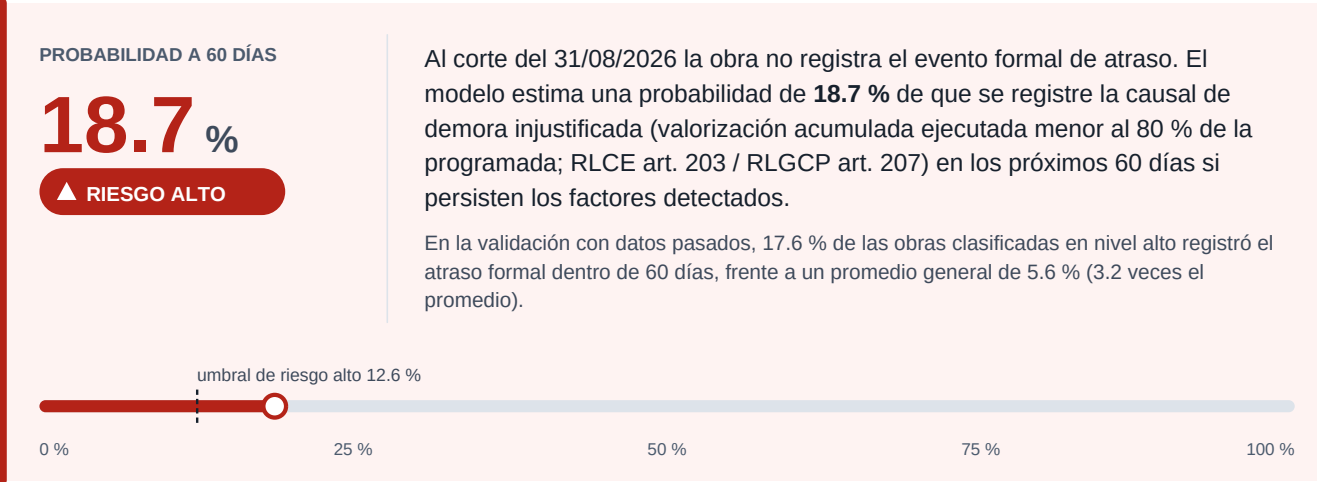


MONTO DEL CONTRATO	PLAZO ORIGINAL	ASIENTOS DEL CUADERNO	ÚLTIMO ASIENTO
No publicado	No publicado	148 desde 30/03/2026	31/08/2026

01 Identificación de la obra y del contrato

Denominación oficial	Ejecución de Obra: Instalación del Servicio de Agua para el Sistema de Riego del Anexo Piñotea, Comunidad Campesina de Tolapalca, Distrito de Ichuña, Provincia General Sánchez Cerro, Región Moquegua. Código Único de Inversión (CUI) N°2385032
Entidad contratante	PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES - PSI
Contratista	CONSORCIO SEÑOR DE QUINUAPATA
Ubicación (distrito / provincia / departamento)	ICHUÑA / GENERAL SANCHEZ CERRO / MOQUEGUA
Código Único de Inversión (CUI)	no enlazado
Inversión asociada	-
Función	-
Identificador del contrato (SEACE)	2379113
Monto del contrato	-
Monto aprobado de la inversión	-
Cuaderno de obra digital	148 asientos entre 30/03/2026 y 31/08/2026

02 Evolución del riesgo estimado a 60 días

Probabilidad estimada de atraso formal a 60 días

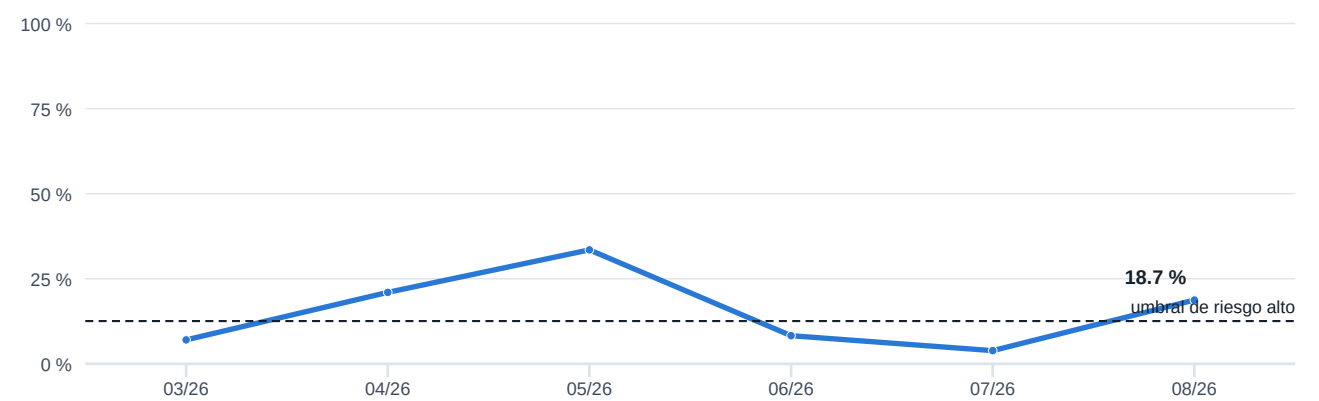

Estimaciones mensuales calculadas solo con la información disponible en cada fecha de corte (6 cortes, del 31/03/2026 al 31/08/2026), con reentrenamiento trimestral del modelo.

03 Factores que explican la estimación

Contribución de cada dato a la probabilidad (valores TreeSHAP en log-odds). Las barras hacia la derecha elevan el riesgo y las barras hacia la izquierda lo reducen, respecto del promedio de las obras.

Dato de la obra	Grupo	Reduce Eleva	Efecto
El 4 % de los asientos de los últimos 60 días menciona penalidades, incumplimientos o cartas notariales	Contenido de los asientos		+0.271
Índice de alerta por las palabras usadas en los asientos recientes: 0.48 (escala de 0 a 1)	Contenido de los asientos		+0.223
El 13 % de los asientos de los últimos 60 días menciona atraso, retraso o demora	Contenido de los asientos		+0.190
El 55 % de los asientos de los últimos 90 días fue registrado por la supervisión o inspección	Actividad del cuaderno de obra		+0.162
Hubo un asiento el mismo día del corte	Actividad del cuaderno de obra		+0.130
Entidad contratante: programa nacional	Características de la obra		+0.130
Departamento: Moquegua	Características de la obra		+0.126
Índice de alerta por el contenido de los asientos recientes: 0.62 (escala de 0 a 1)	Contenido de los asientos		+0.092

04 Qué cambiaría la estimación (sensibilidad del modelo)

Recálculo de la probabilidad modificando una señal a la vez. Indica cuánto depende la estimación de cada señal; no es una estimación causal del efecto de una intervención real.

Escenario	Actual	Escenario	Cambio
Sin suspensiones del plazo en los últimos 90 días	18.7 %	18.1 %	-0.7 pp
Absolver todas las consultas pendientes	18.7 %	18.7 %	+0.0 pp

05 Evidencia documental

Asientos del cuaderno de obra digital y otros registros oficiales asociados a los factores que elevan el riesgo, del más reciente al más antiguo (hasta 12).

Asiento N.º 140 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 25/08/2026

...antene la responsabilidad por la ejecución de las prestaciones a su cargo y por el cumplimiento del plazo contractual, correspondiendo adoptar oportunamente las acciones necesarias para evitar mayores retrasos.

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 138 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 22/08/2026

...tiene la responsabilidad por la ejecución de las prestaciones a su cargo y por el cumplimiento del plazo contractual, correspondiendo adoptar oportunamente las acciones necesarias para evitar mayores retrasos.

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 136 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 21/08/2026

ACTIVIDADES REALIZADAS: La Supervisión, en atención al Asiento de Residente N.º 134 de fecha 19/08/2026, toma conocimiento de los trabajos que vienen ejecutándose en la bocatoma, desarenador y muros, así como detalla de la información topográfica descrita en cuaderno de obra por el Contratista para el segundo tramo. Respecto a la discrepancia topográfica comprendida entre las progresivas 1+540 a 3+350, se deja consta...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 136 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 21/08/2026

...tado con levantamiento de campo, cotas de proyecto y terreno, planos comparativos, metrados y demás información técnica pertinente. la supervisión precisa que dicha situación no limita ni justifica el retraso de las metas contractuales liberadas (descrita en asiento n. 19 y 20 supervisor de obra), por lo que se exhorta al contratista a mantener e incrementar los frentes de trabajo, disponiendo personal, ...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 135 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 21/08/2026

...limiento de las metas y del plazo contractual. la supervisión deja constancia de su preocupación por el ritmo actual de ejecución y requiere al contratista actuar con carácter inmediato para evitar el incumplimiento de las metas y del plazo contractual..... se regulariza por falta de señal de internet

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 133 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 19/08/2026

...inación contractual es el 31/08/2026, por lo que corresponde al contratista adoptar las acciones necesarias para cumplir con las obligaciones contractuales dentro del plazo establecido. de producirse incumplimiento al vencimiento del plazo, se proceda conforme al contrato y la normativa vigente respecto de las consecuencias y, de corresponder, la aplicación de penalidades. asimismo, se requiere al contr...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 133 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 19/08/2026

...personal, equipos, materiales y frentes de trabajo corresponden al contratista. la supervisión continuara realizando el control, seguimiento y comunicación a la entidad, dejando registro de cualquier retraso o incumplimiento que pueda afectar la culminación de la obra. base normativa: ley n. 32069, ley general de contrataciones públicas, y su reglamento, particularmente las disposiciones relativas a la e...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 133 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 19/08/2026

ACTIVIDADES REALIZADAS: La Supervisión deja constancia que, luego del reinicio de obra del 10/08/2026, se ha verificado que el avance de las partidas y metas técnicamente liberadas es mínimo y no resulta acorde con el plazo contractual pendiente, encontrándose aún metas liberadas sin concluir. En tal sentido, se requiere y recomienda al Contratista y al Residente de Obra adoptar medidas correctivas inmediatas, princip...

Fuente: cod-asientos202608.csv

06 Marco normativo, validez del modelo y lectura del informe

Evento que se anticipa: primer asiento del cuaderno de obra digital de tipo «Valorización acumulada ejecutada menor al 80 % del monto acumulado programado» o «Calendario acelerado de obra» (Reglamento de la Ley N.º 30225, D.S. N.º 344-2018-EF, art. 203; Reglamento de la Ley N.º 32069, D.S. N.º 009-2025-EF, art. 207).

Indicador (prueba temporal ciega)	Nacional	Arequipa
ROC-AUC	0.774	0.719
PR-AUC	0.158	0.216
Prevalencia del evento	0.050	0.091

Modelo atraso-H60-B_full-2026-08-31, entrenado con información hasta el 30/06/2026. Una PR-AUC mayor que la prevalencia indica que el modelo ordena las obras mejor que el azar.

CÓMO USAR ESTE INFORME

La probabilidad es una estimación para priorizar la supervisión, no una certeza ni una determinación de responsabilidades. Contraste siempre los factores y la evidencia con el expediente de la obra y con la información del supervisor o inspector antes de adoptar decisiones.
